




















[illegible]

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

Id	Projekttitel: Projektnummer + navn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	o	t	f	l	s	09. maj 22 m	t	o	t	f
42	Trafik godkender udførelsesdokumenter	15 dage	fr 26-06-26	to 16-07-26	41										
43	Lokaltog fremsender godkendelse	15 dage	fr 17-07-26	to 06-08-26	42										
44	Projektleder, entreprenør og SR-arbejdsleder forestår udførelse og ibrugtagning	1 dag	fr 07-08-26	fr 07-08-26	43										
45	Tillæg 1 (Til Sikkerhed senest 6 uger efter ibrugtagning)	52 dage	ma 10-08-26	ti 20-10-26											
46	Projektleder, entreprenør, CSM ansvarlig og projektkoordinator udarbejder dokumenter til Tillæg 1	1 dag	ma 10-08-26	ma 10-08-26	44										
47	Review hos Lokaltog	10 dage	ti 11-08-26	ma 24-08-26	46										
48	Opdatering iht. kommentarer	1 dag	ti 25-08-26	ti 25-08-26	47										
49	Tillæg 1 sendes til Sikkerhed	10 dage	on 26-08-26	ti 08-09-26	48										
50	Behandling hos Sikkerhed	0 dage	ti 08-09-26	ti 08-09-26	49										
51	Opdatering iht. kommentarer	0 dage	ti 08-09-26	ti 08-09-26	50										
52	Review hos Lokaltog	0 dage	ti 08-09-26	ti 08-09-26	51										
53	Sikkerhed godkender Tillæg 1	15 dage	on 09-09-26	ti 29-09-26	52										
54	Lokaltog fremsender godkendelse	15 dage	on 30-09-26	ti 20-10-26	53										

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

f

l

s

16. maj 22

m

t

o

t

f

l

s

23. maj 22

m

t

o

t

f

l

s

30. maj 22

m

t

o

t

f

l

s

06. jun 22

m

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 3



o

t

f

l

s

13. jun 22

m

t

o

t

f

l

s

20. jun 22

m

t

o

t

f

l

s

27. jun 22

m

t

o

t

f

l

s

04

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl


Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 5




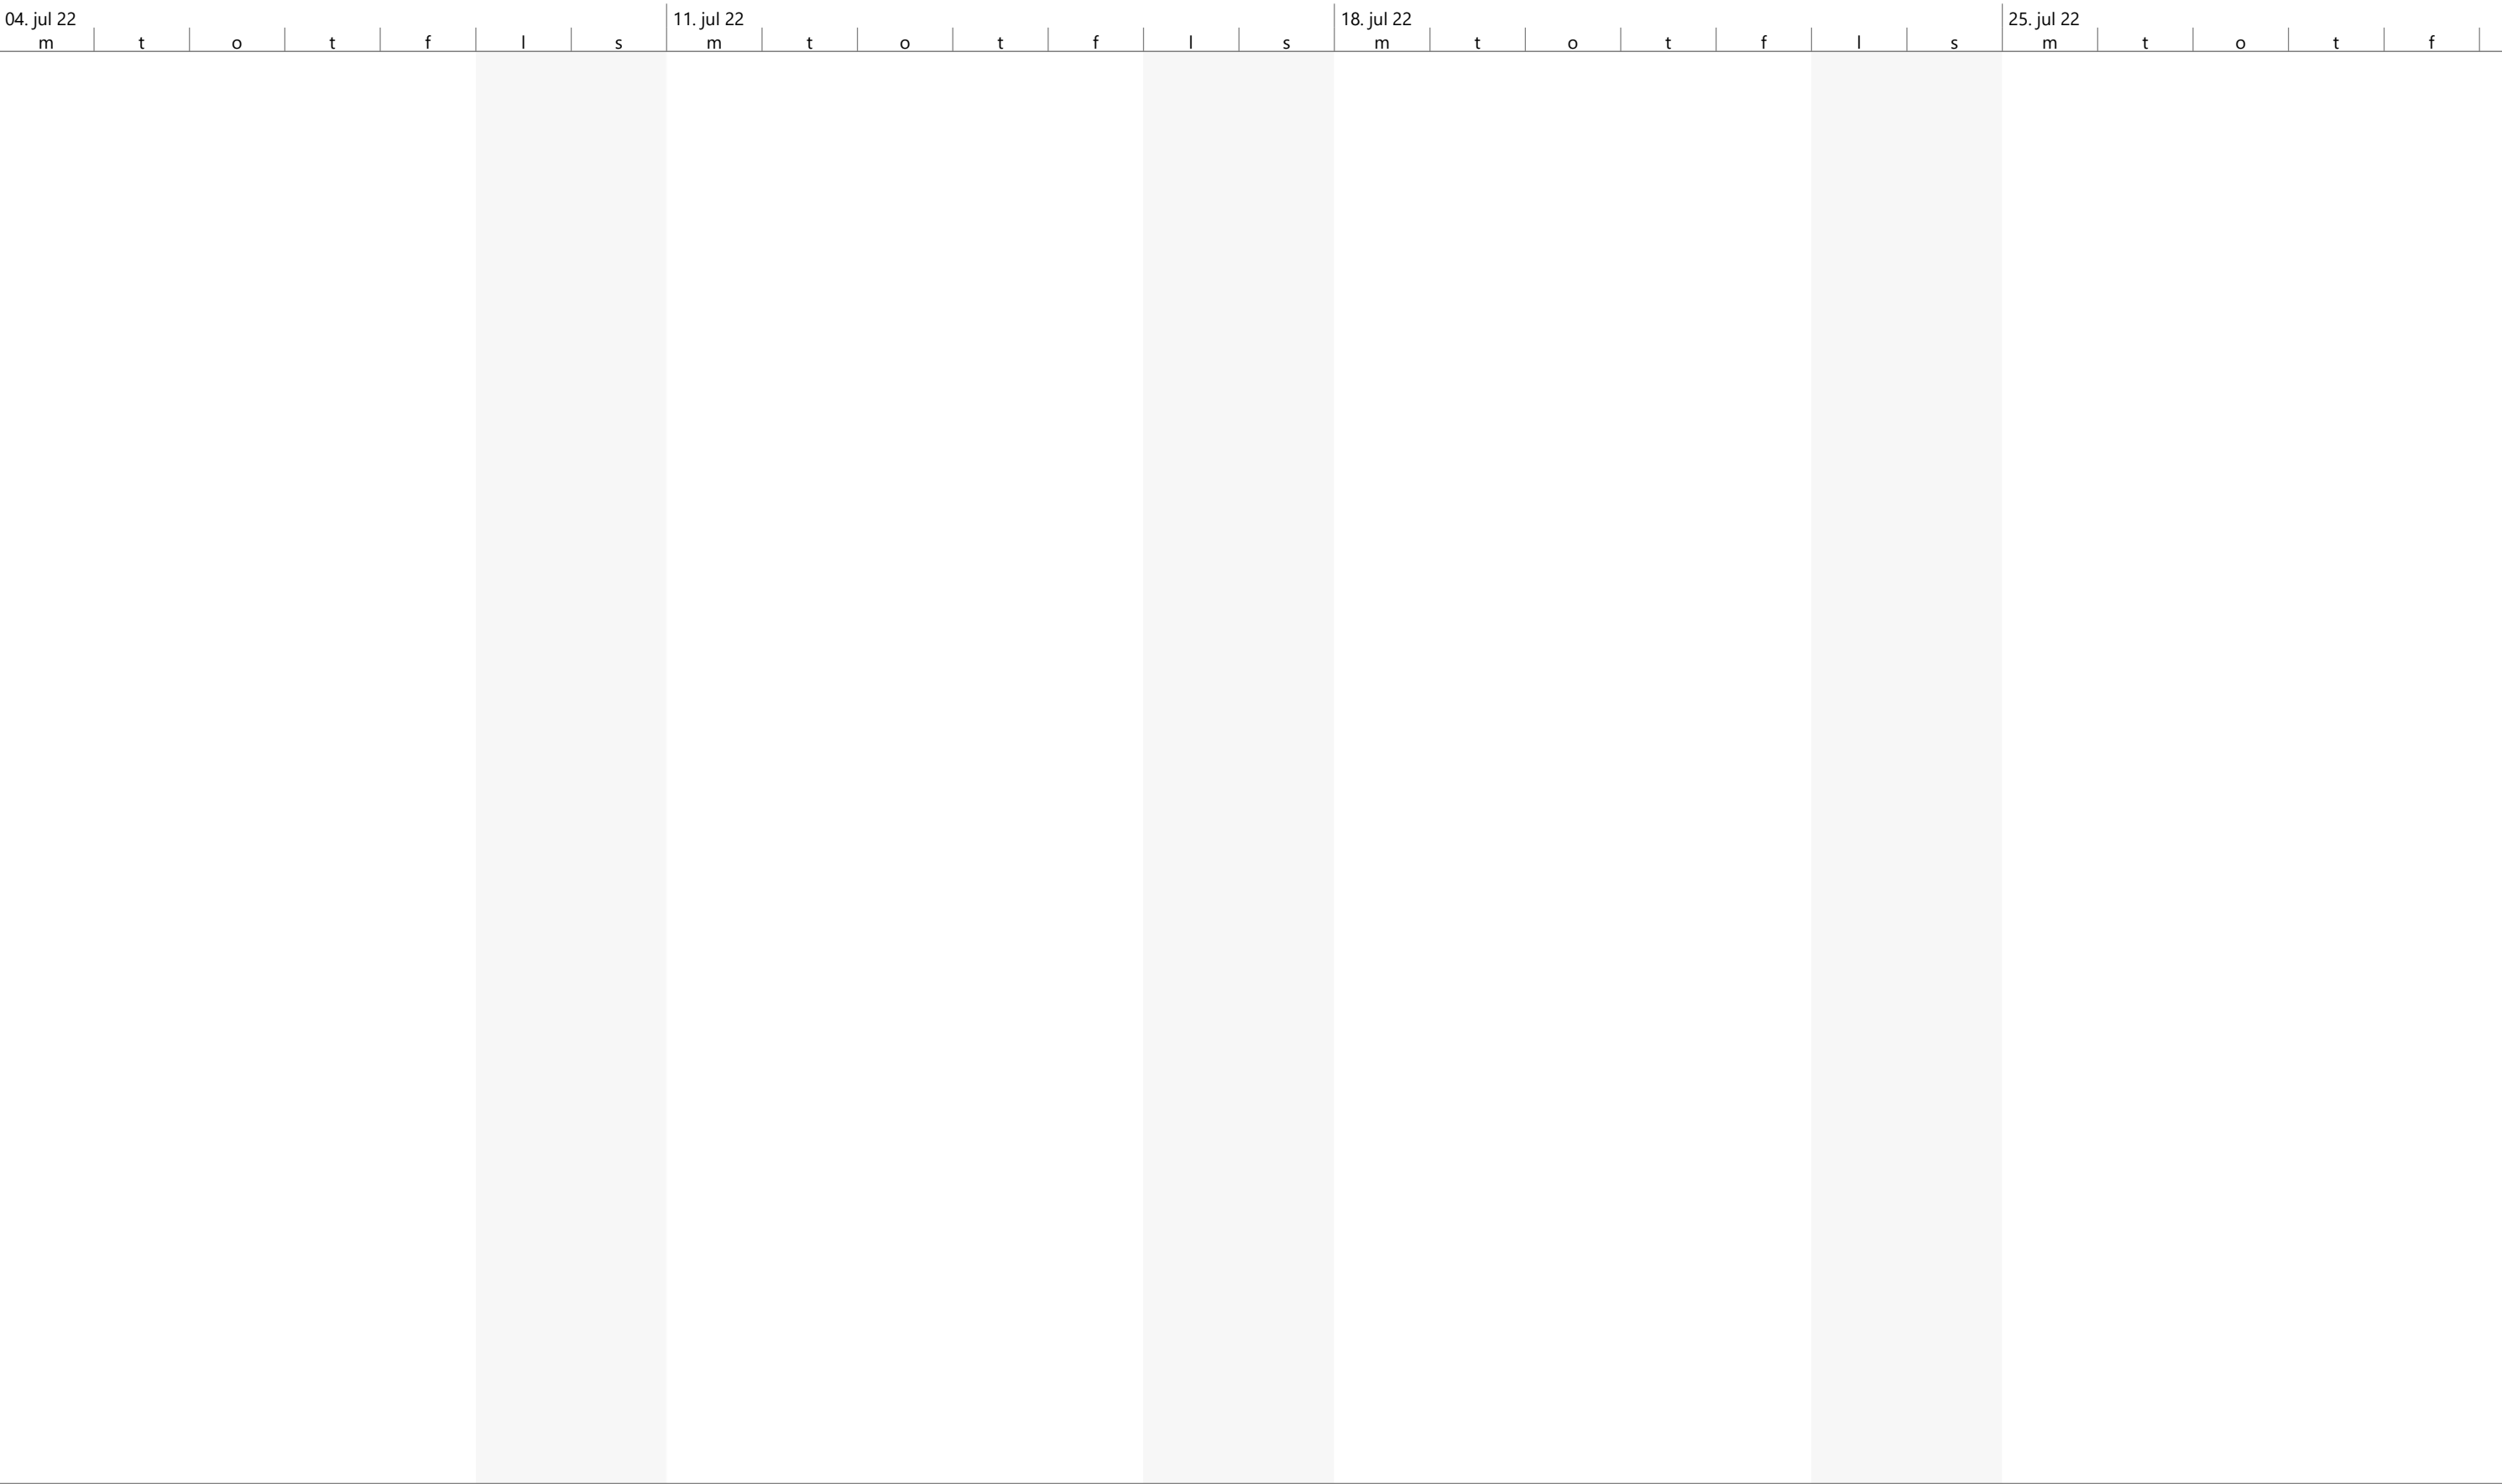








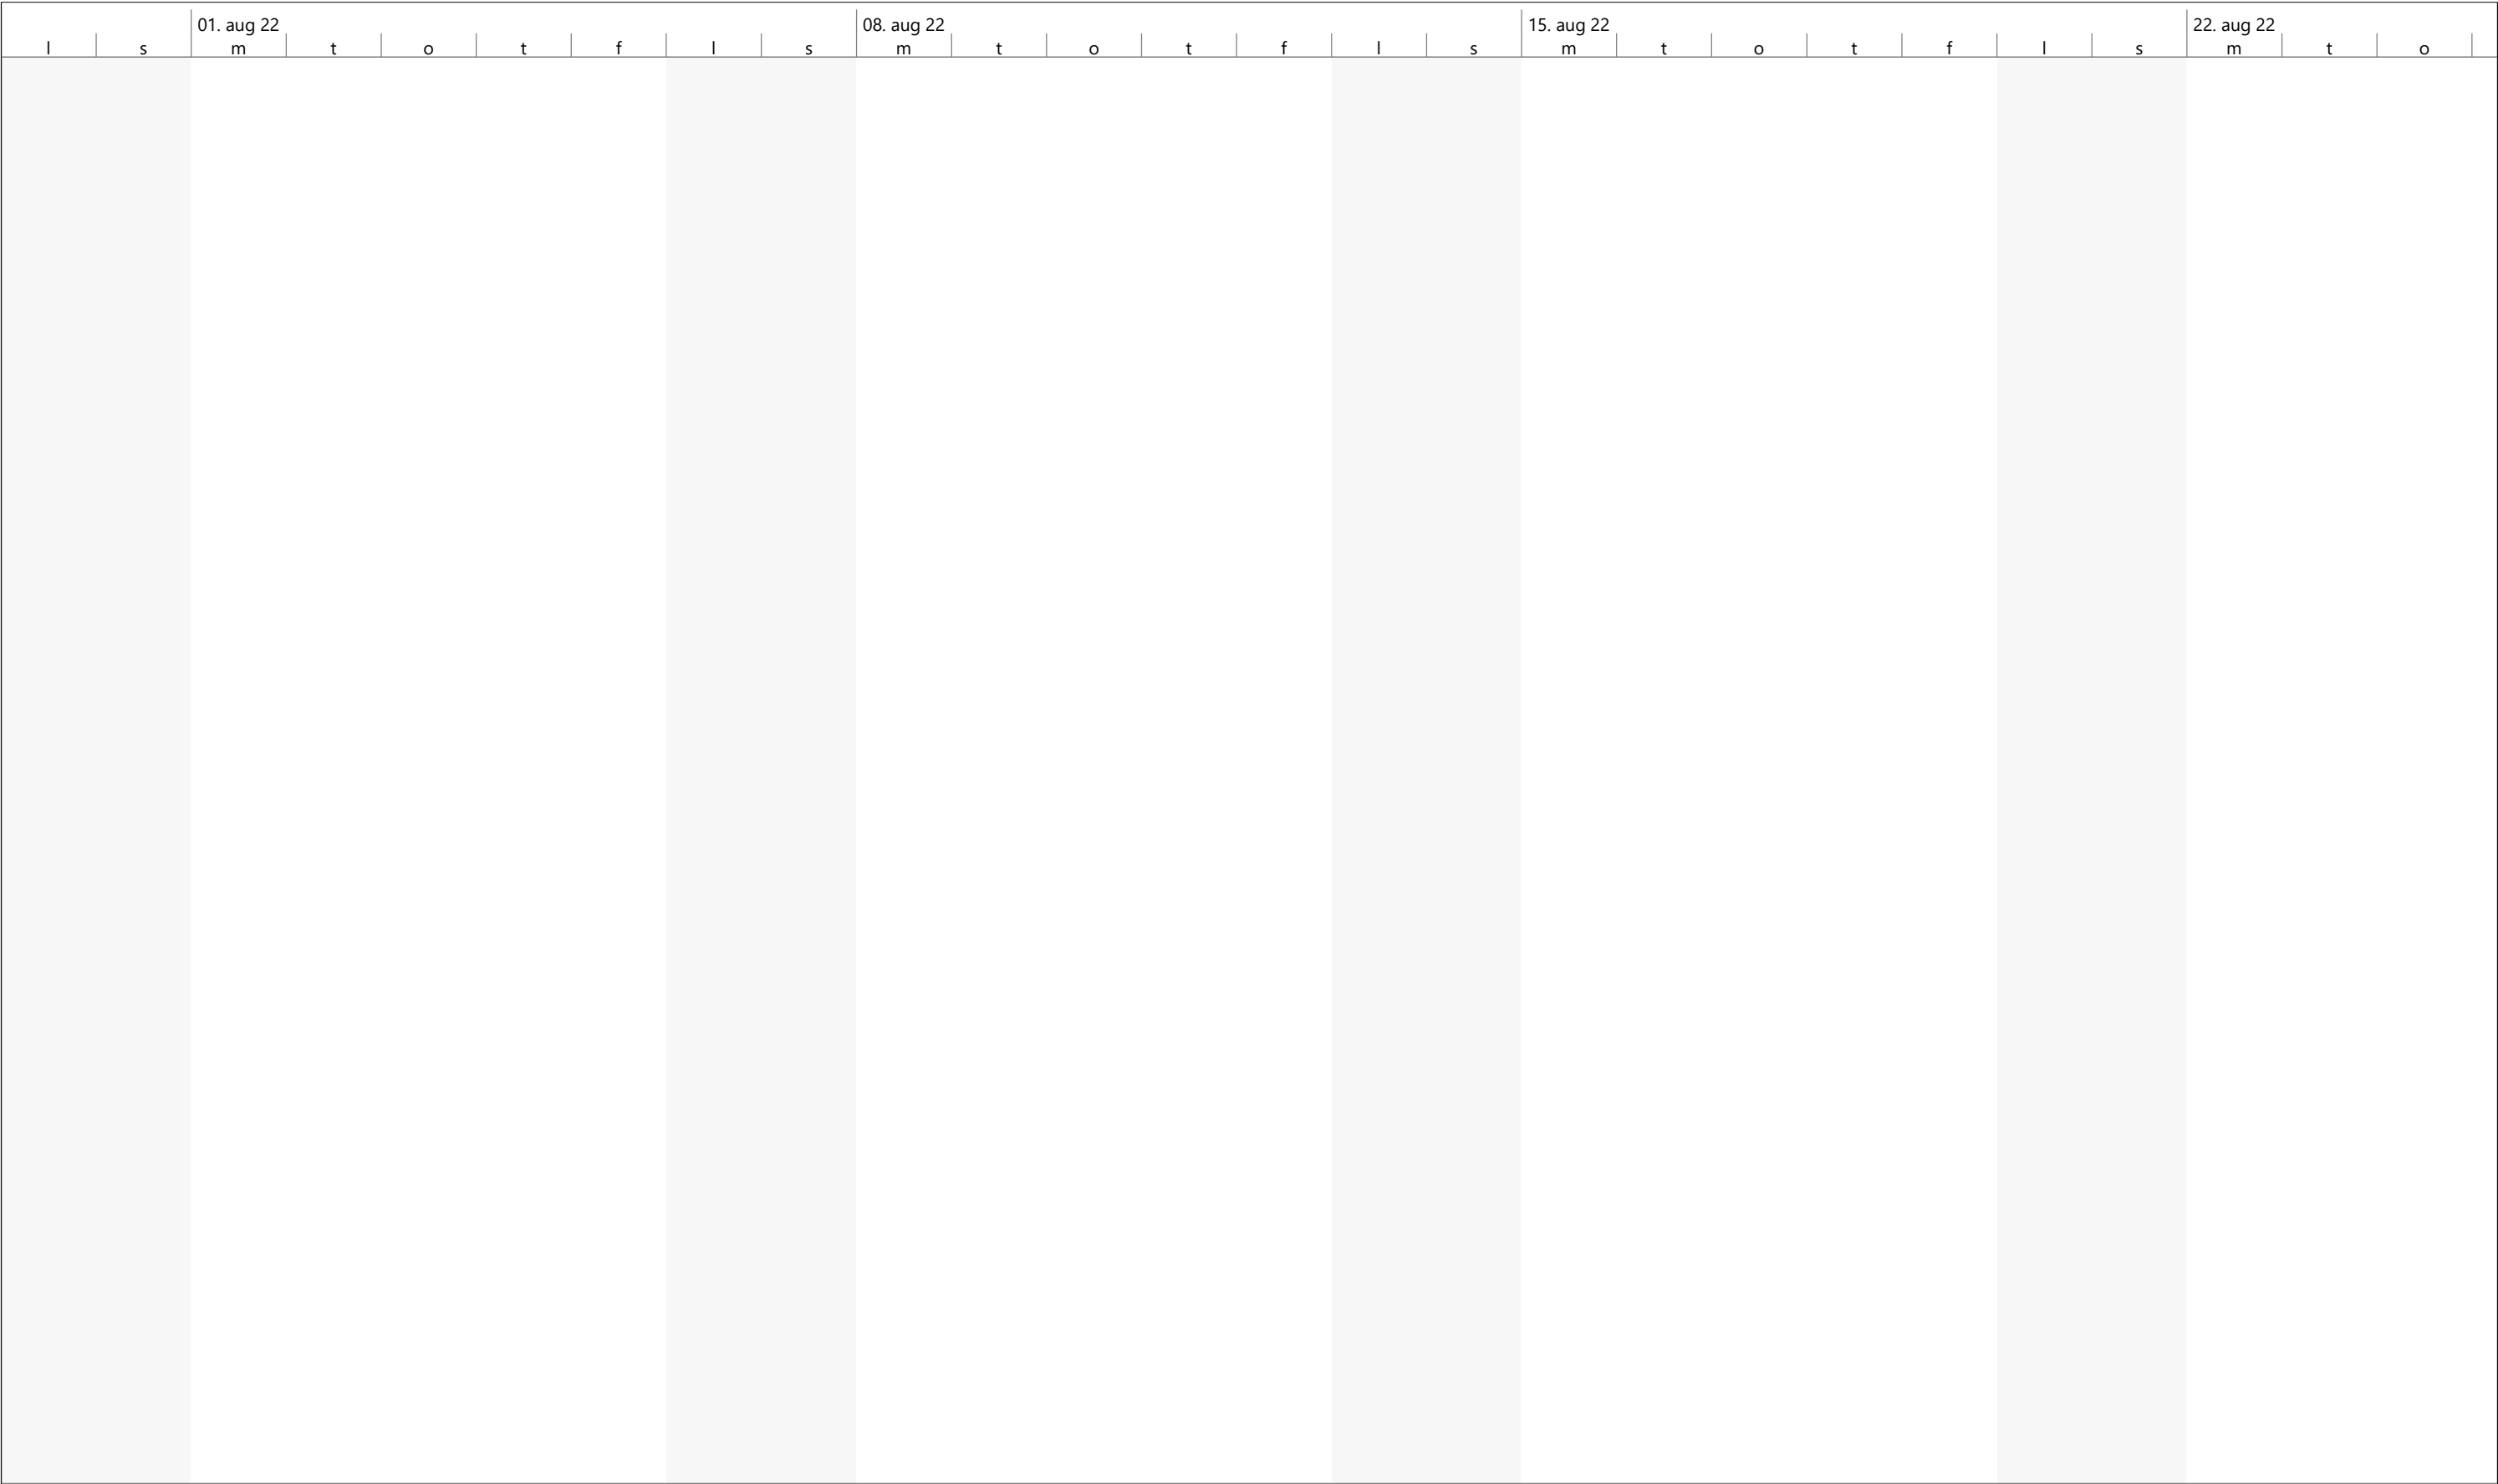











Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			













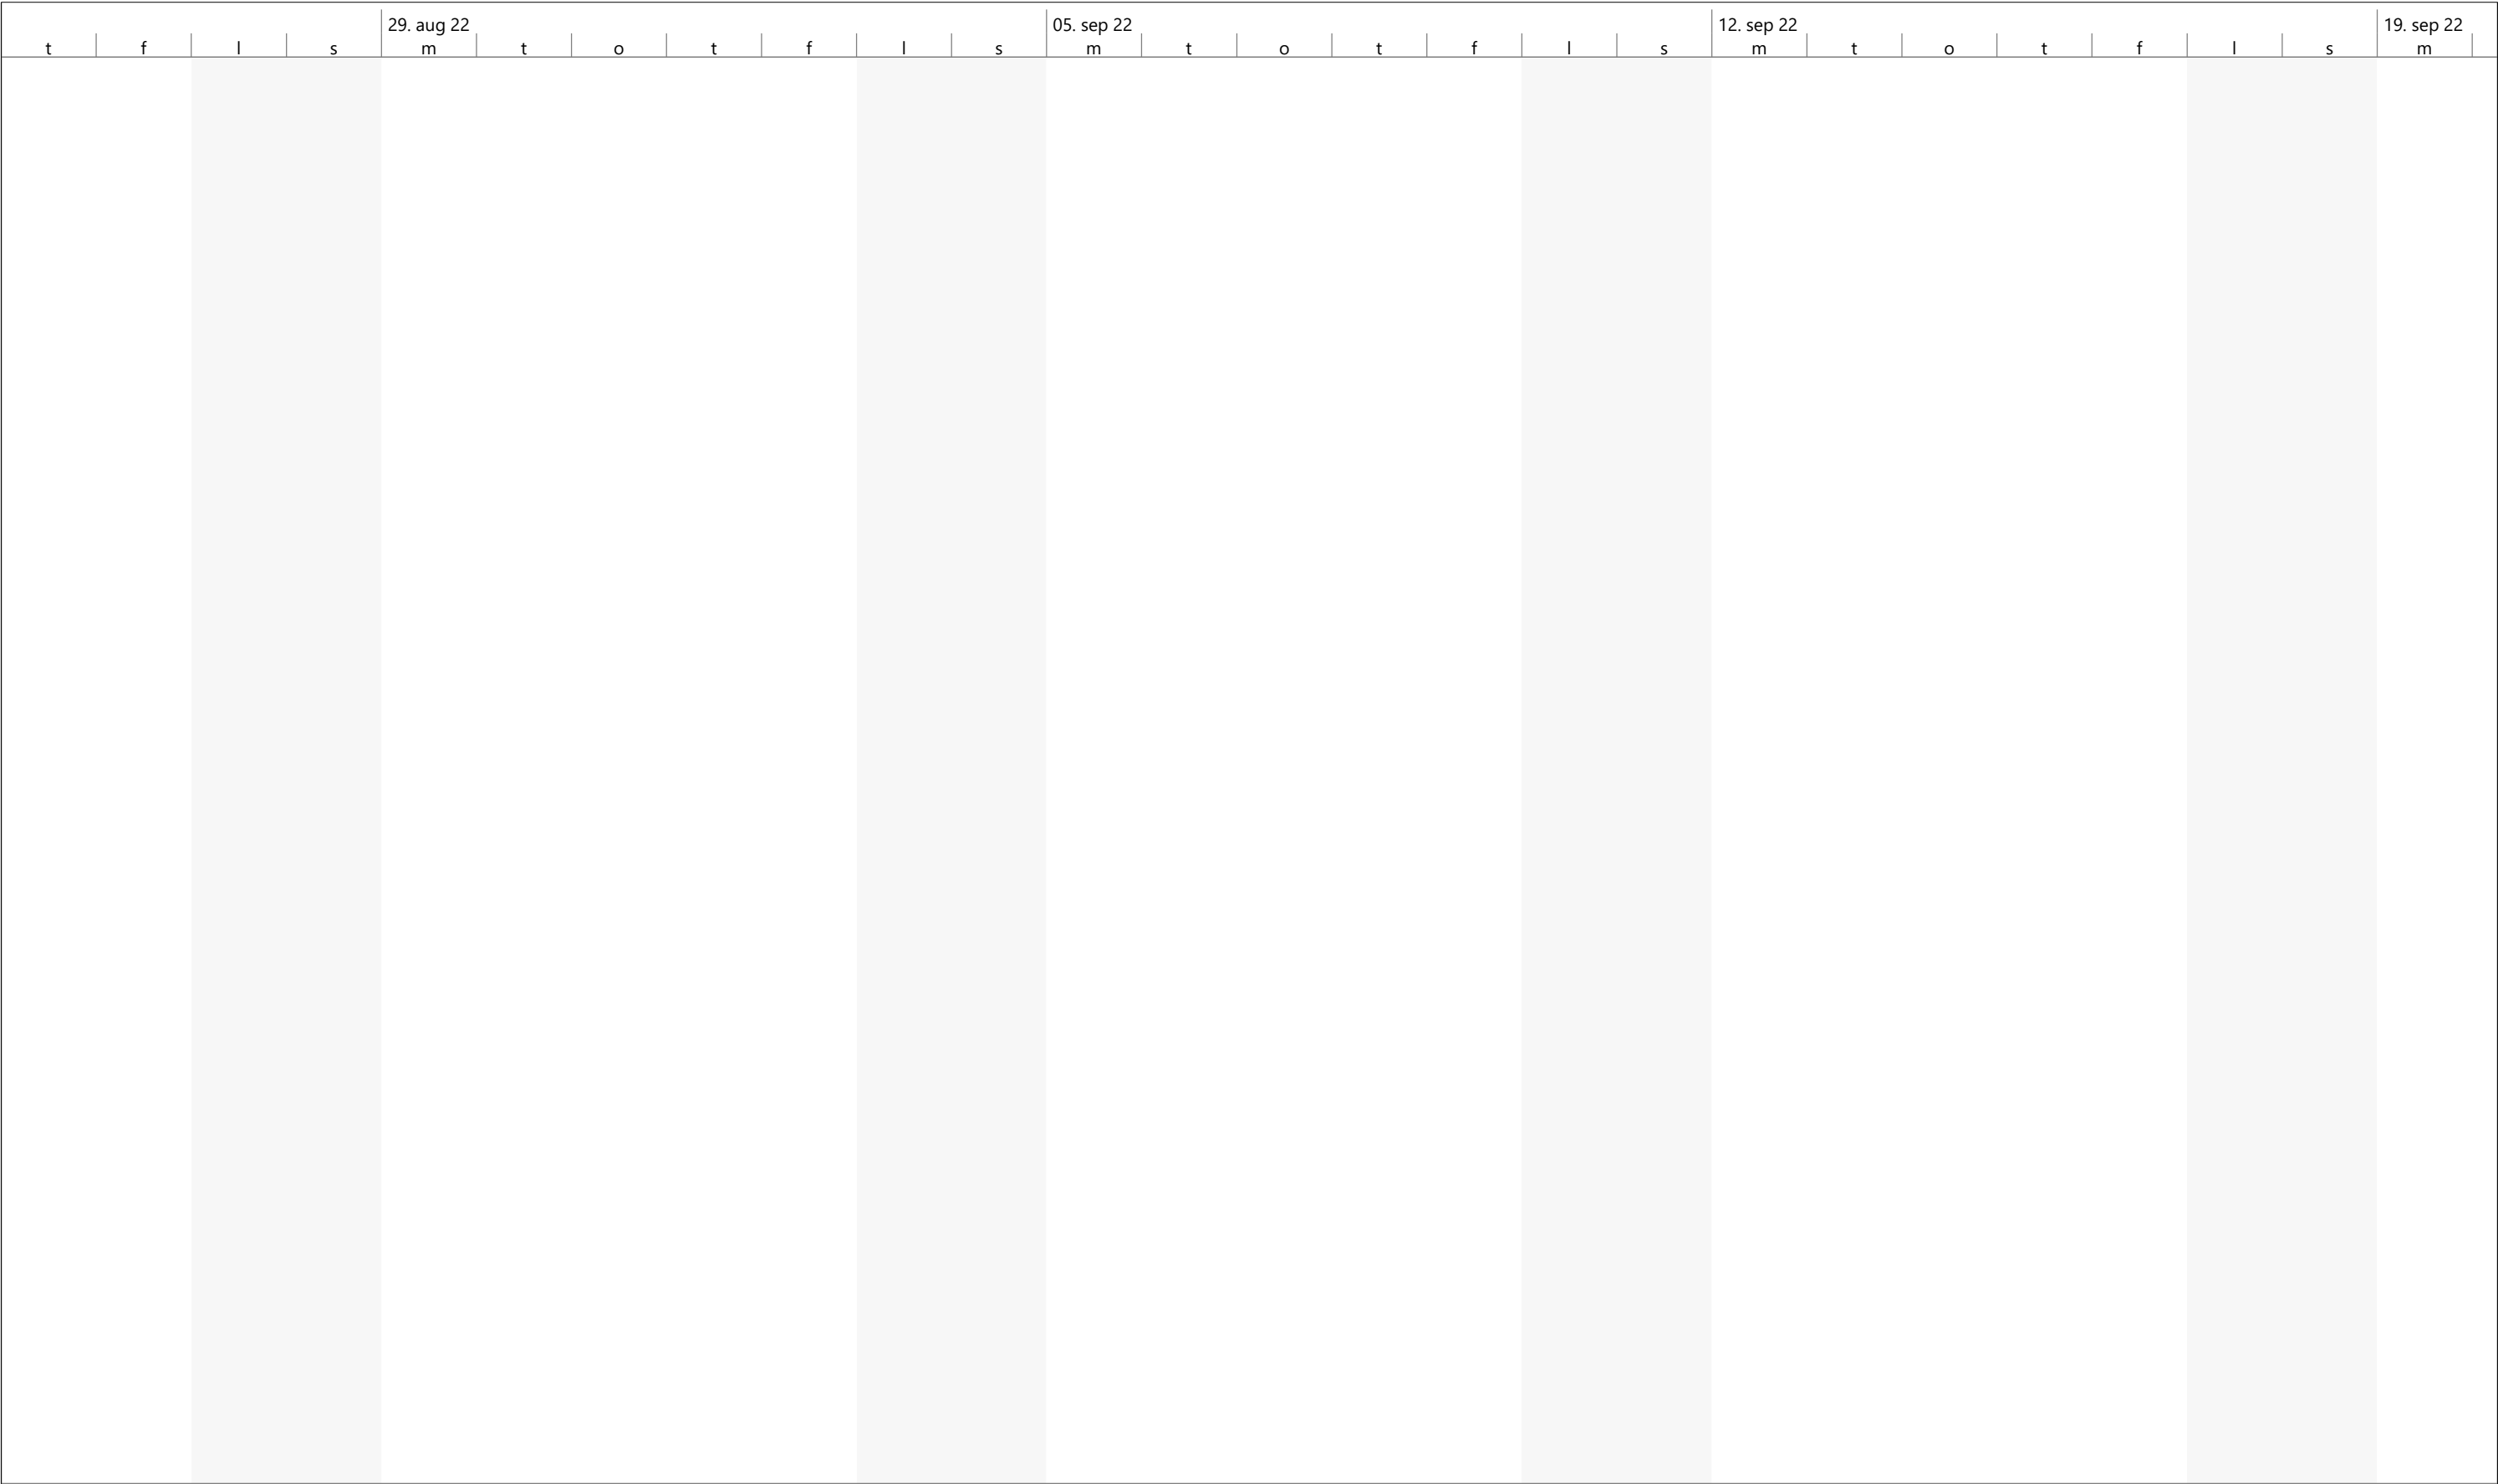














Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			










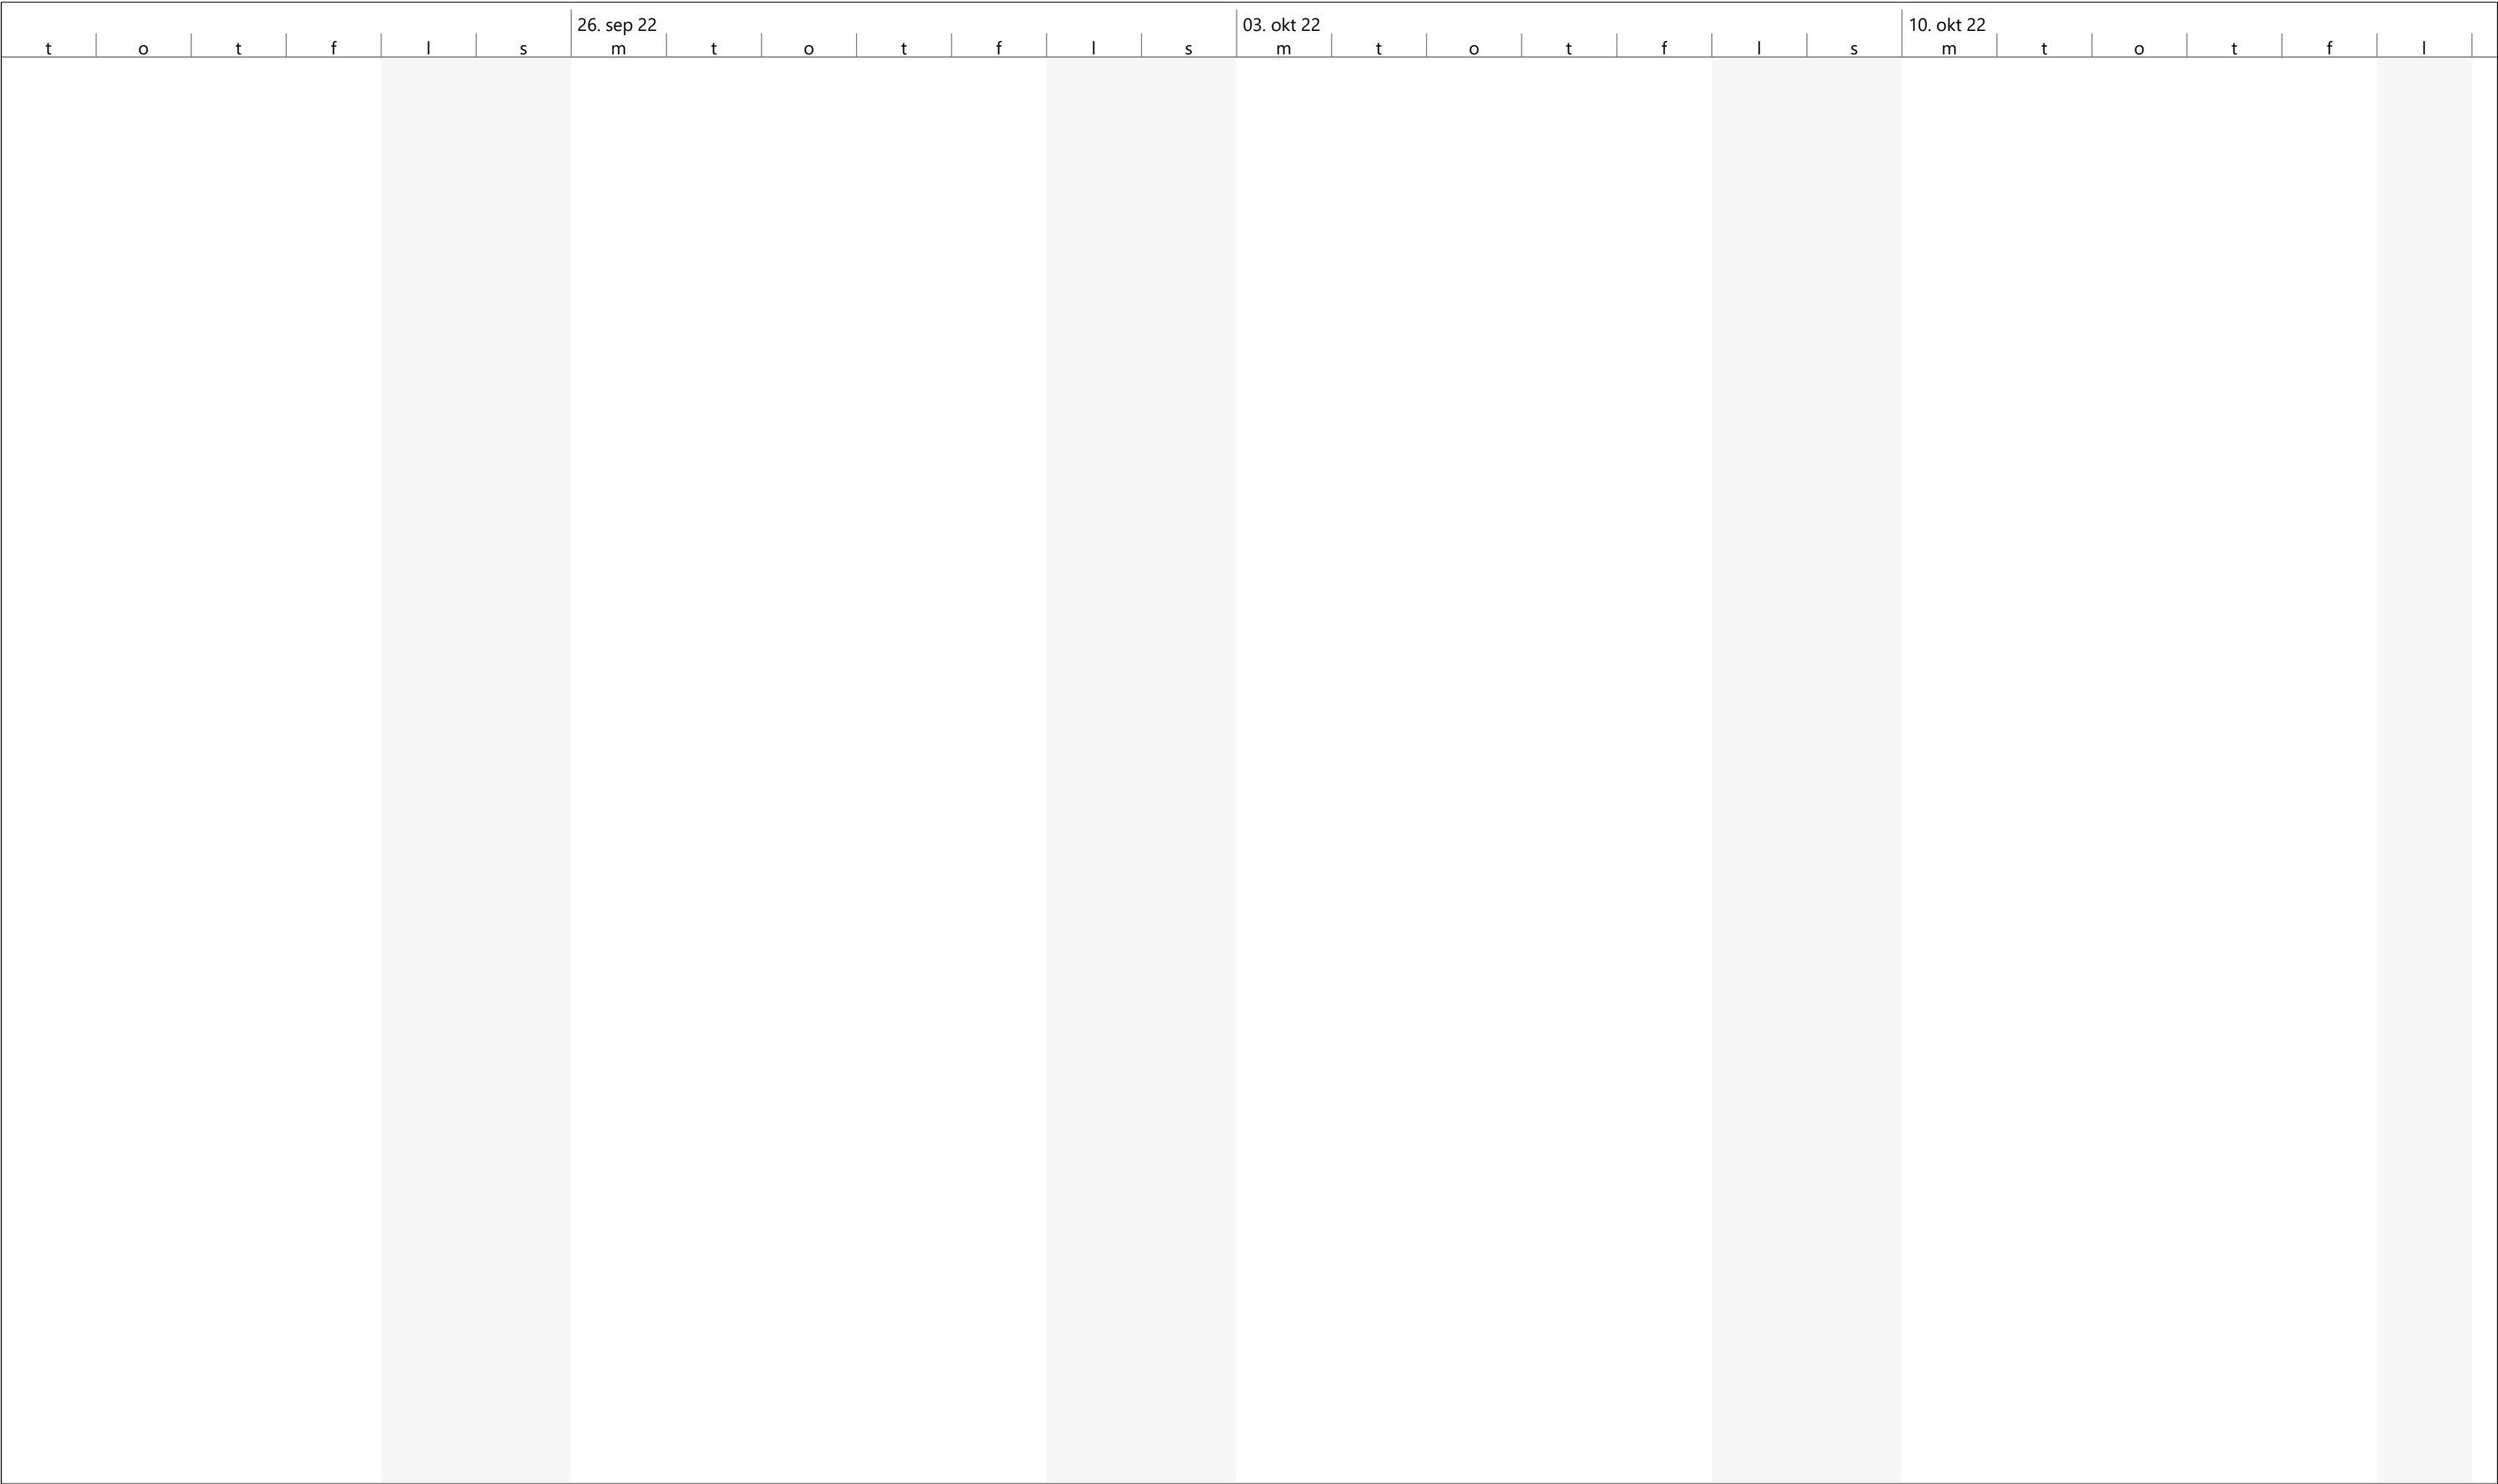













Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



s

17. okt 22

m

t

o

t

f

l

s

24. okt 22

m

t

o

t

f

l

s

31. okt 22

m

t

o

t

f

l

s

07. nov 22

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status


Side 15

s	17. okt 22							24. okt 22							31. okt 22							07. nov 22						
m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t				



Dato: ti 26-05-26	Opgave	<div></div>	Projektoversigt	<div></div>	Manuel opgave	<div></div>	kun start	<div></div>	Deadline	<div></div>
	Opdeling	<div></div>	Inaktiv opgave	<div></div>	Kun varighed	<div></div>	Kun slutdato	<div></div>	Fremdrift	<div></div>
	Milepæl	<div></div>	Inaktiv milepæl	<div></div>	Manuel oversigtsopløftning	<div></div>	Eksterne opgaver	<div></div>	Manuel status	<div></div>
	Hovedopgave	<div></div>	Inaktiv oversigt	<div></div>	Manuel oversigt	<div></div>	Ekstern milepæl	<div></div>		



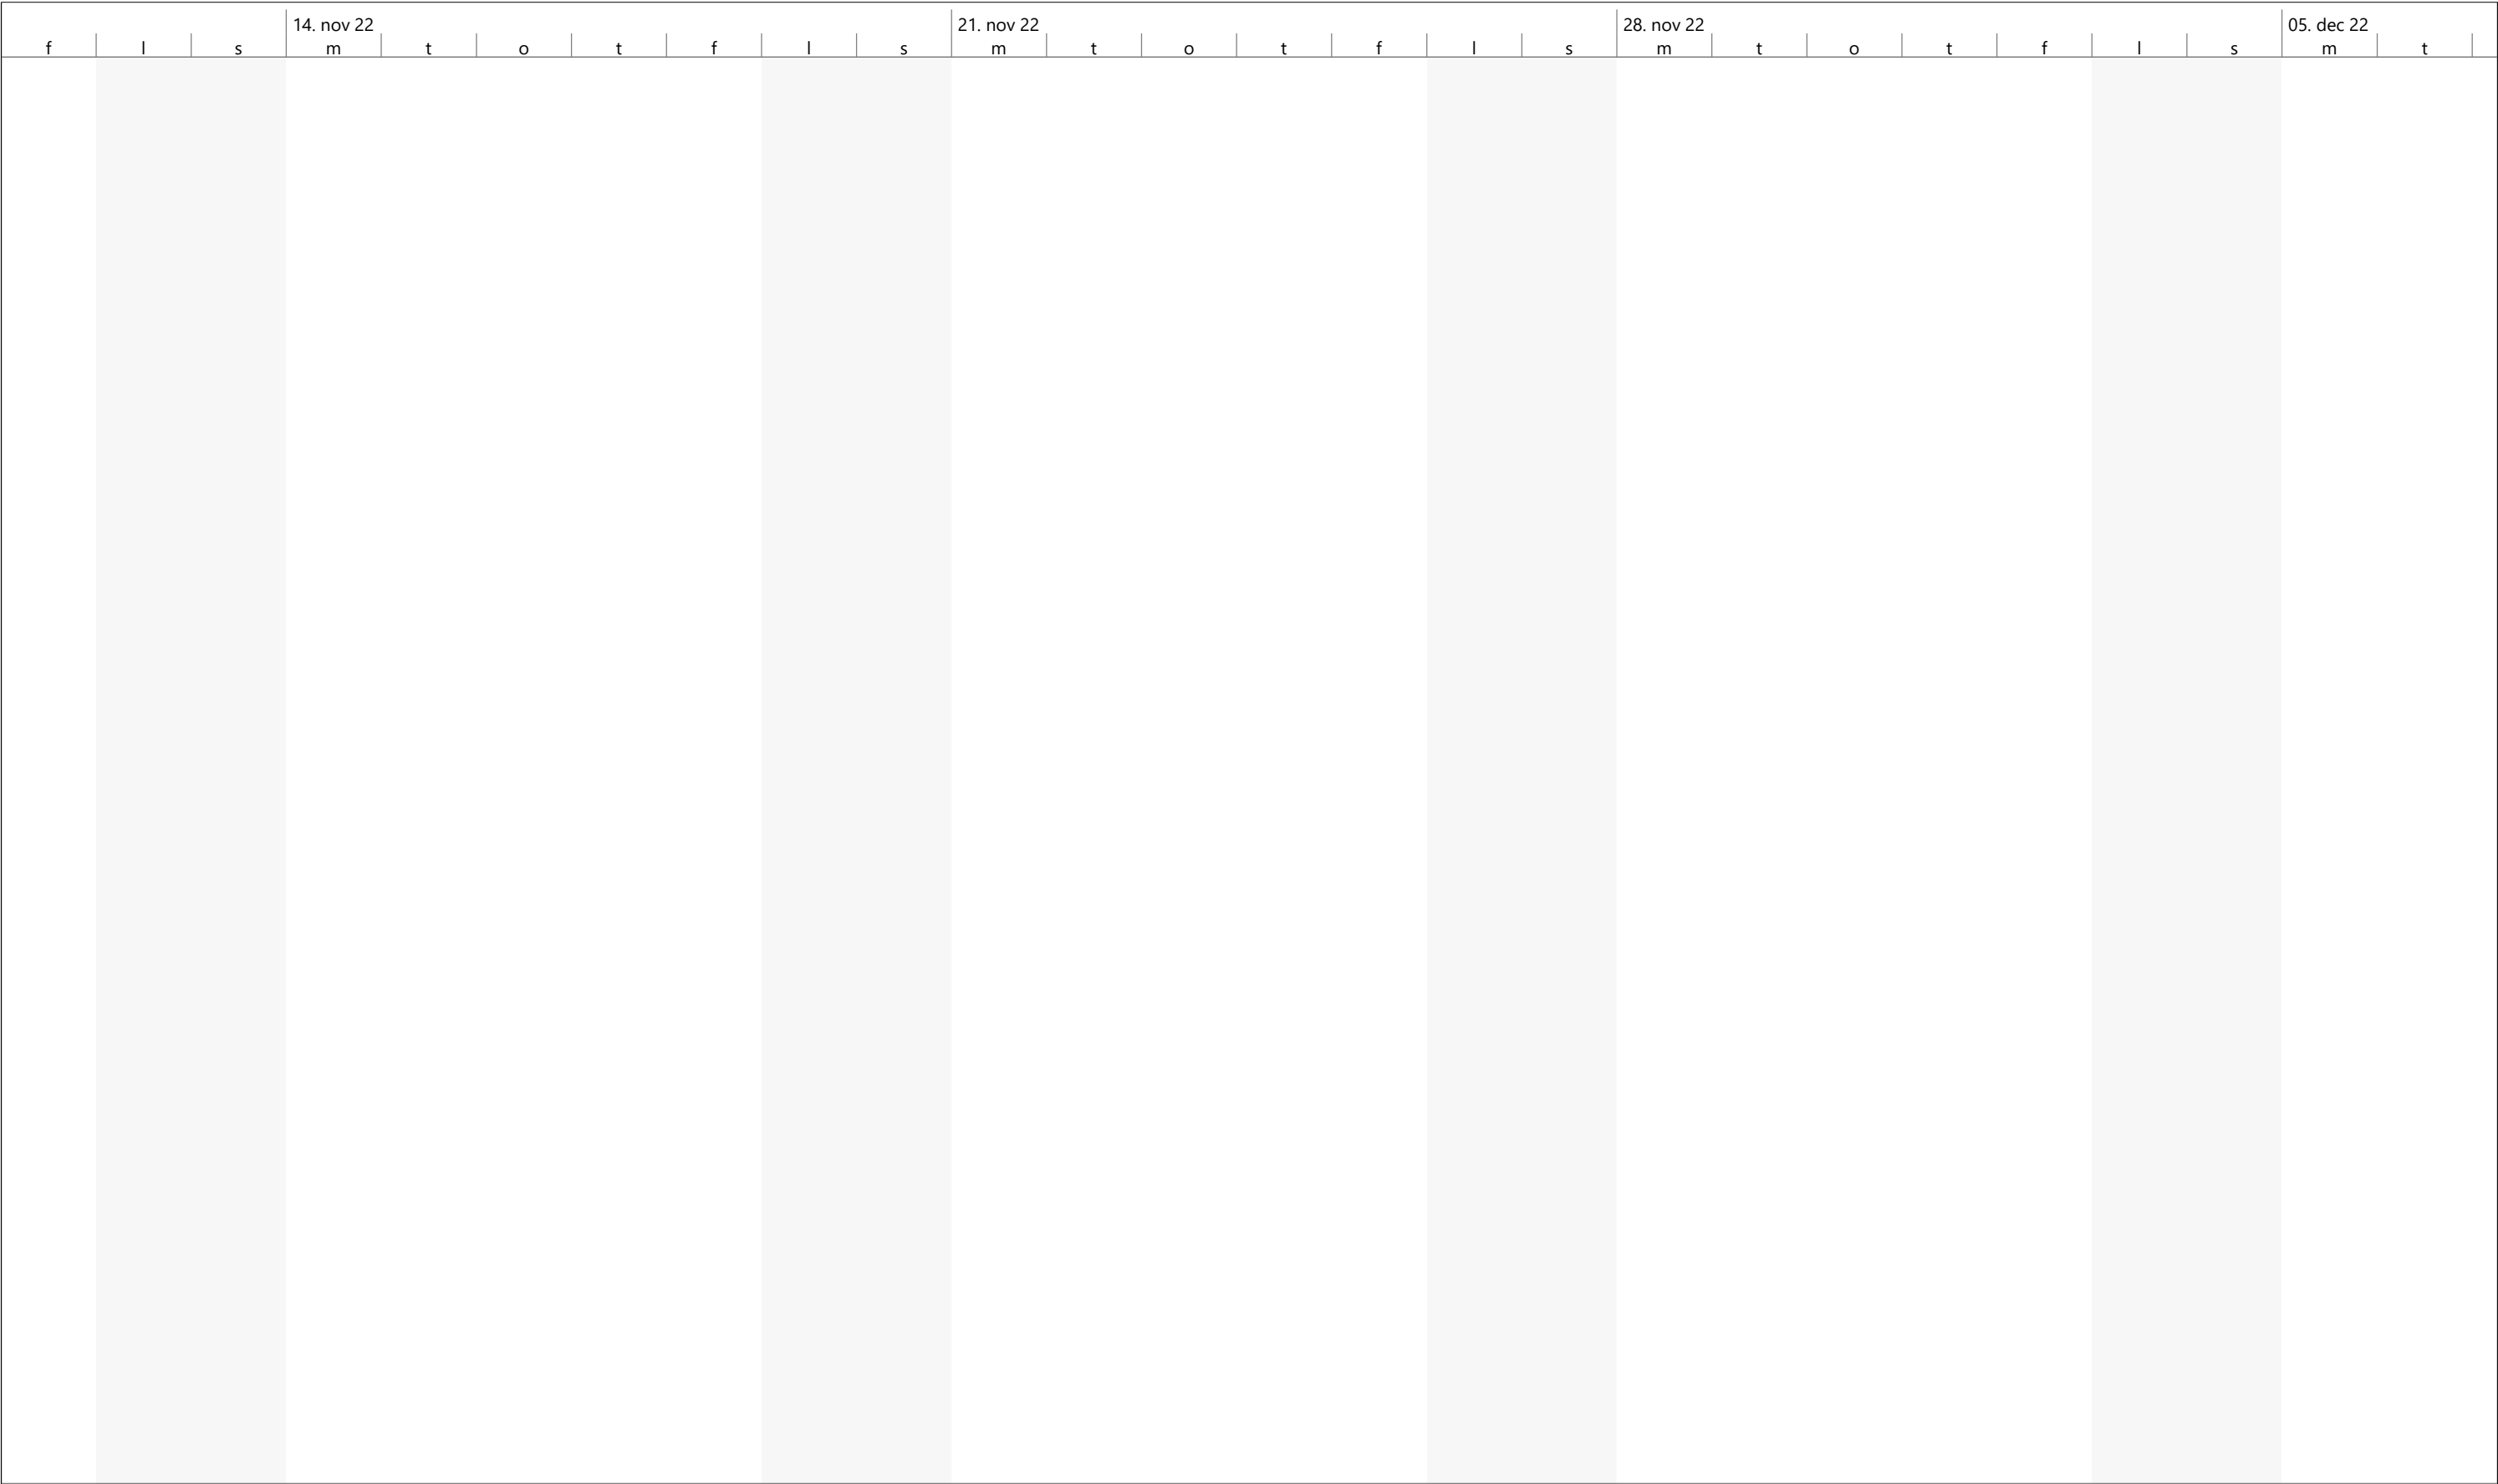

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



o

t

f

l

s

12. dec 22

m

t

o

t

f

l

s

19. dec 22

m

t

o

t

f

l

s

26. dec 22

m

t

o

t

f

l

s

02

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift


Manuel status

Side 19

o	t	f	l	s	12. dec 22	m	t	o	t	f	l	s	19. dec 22	m	t	o	t	f	l	s	26. dec 22	m	t	o	t	f	l	s	02







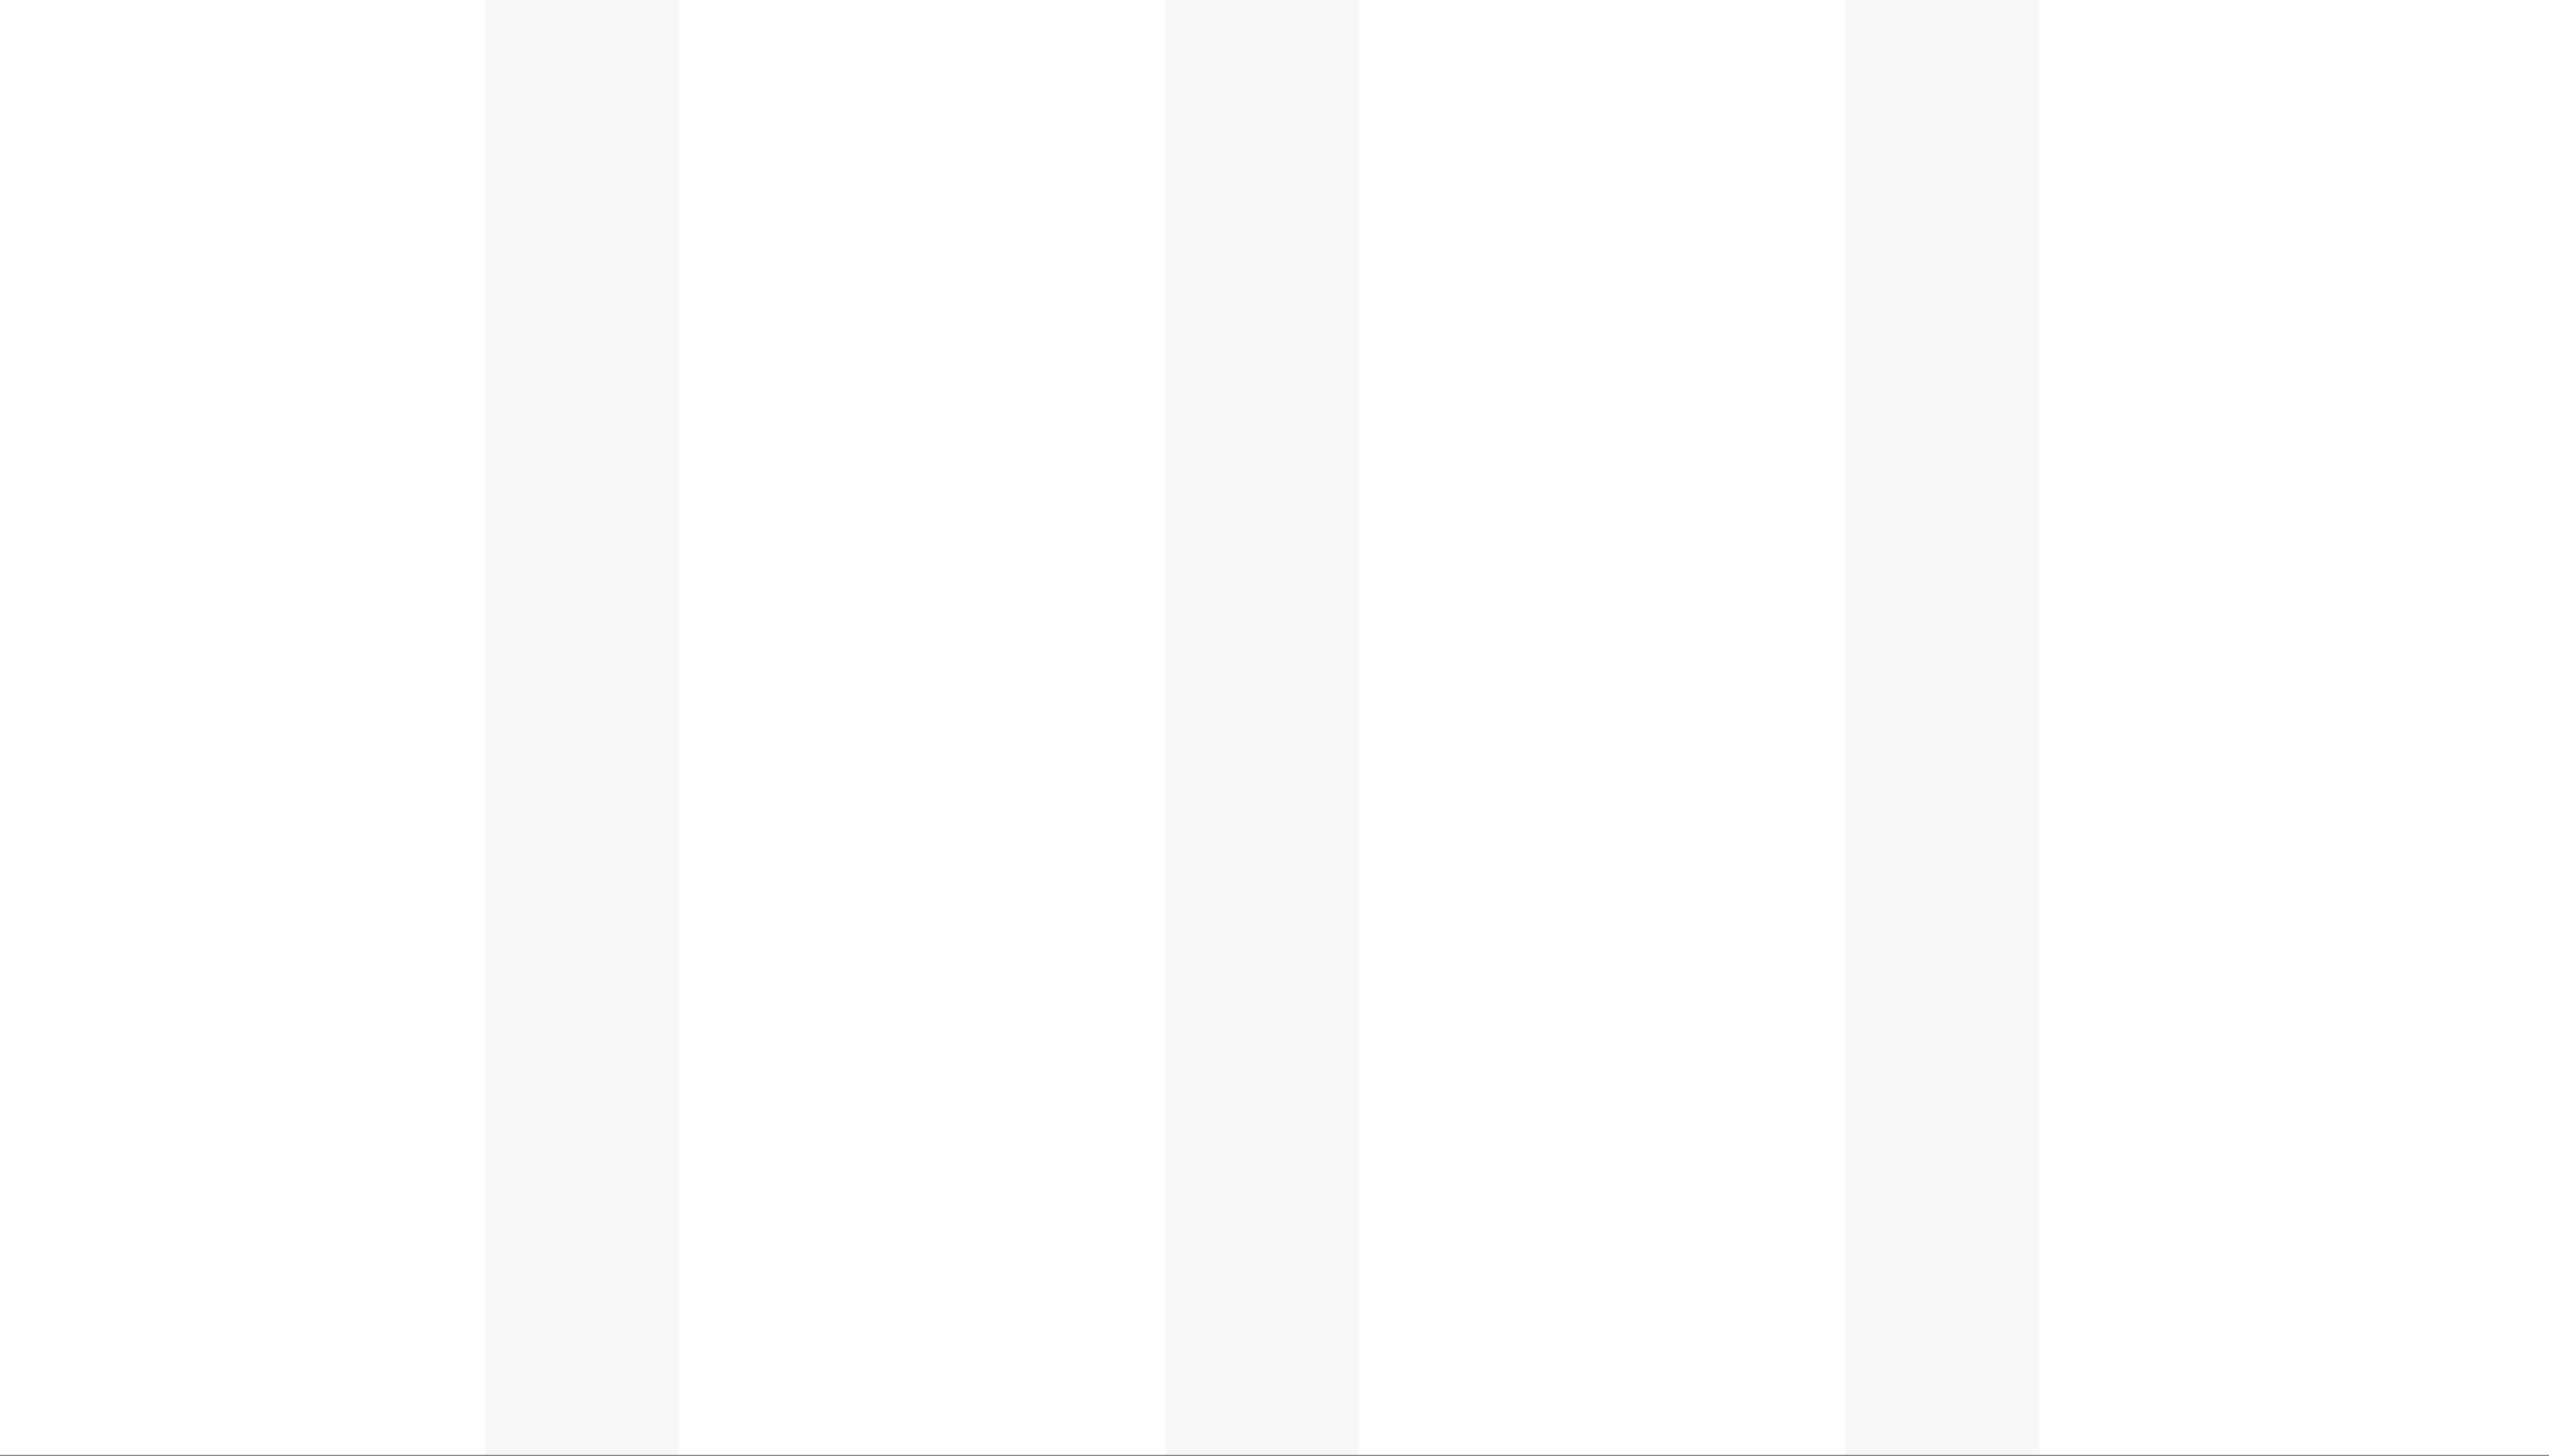





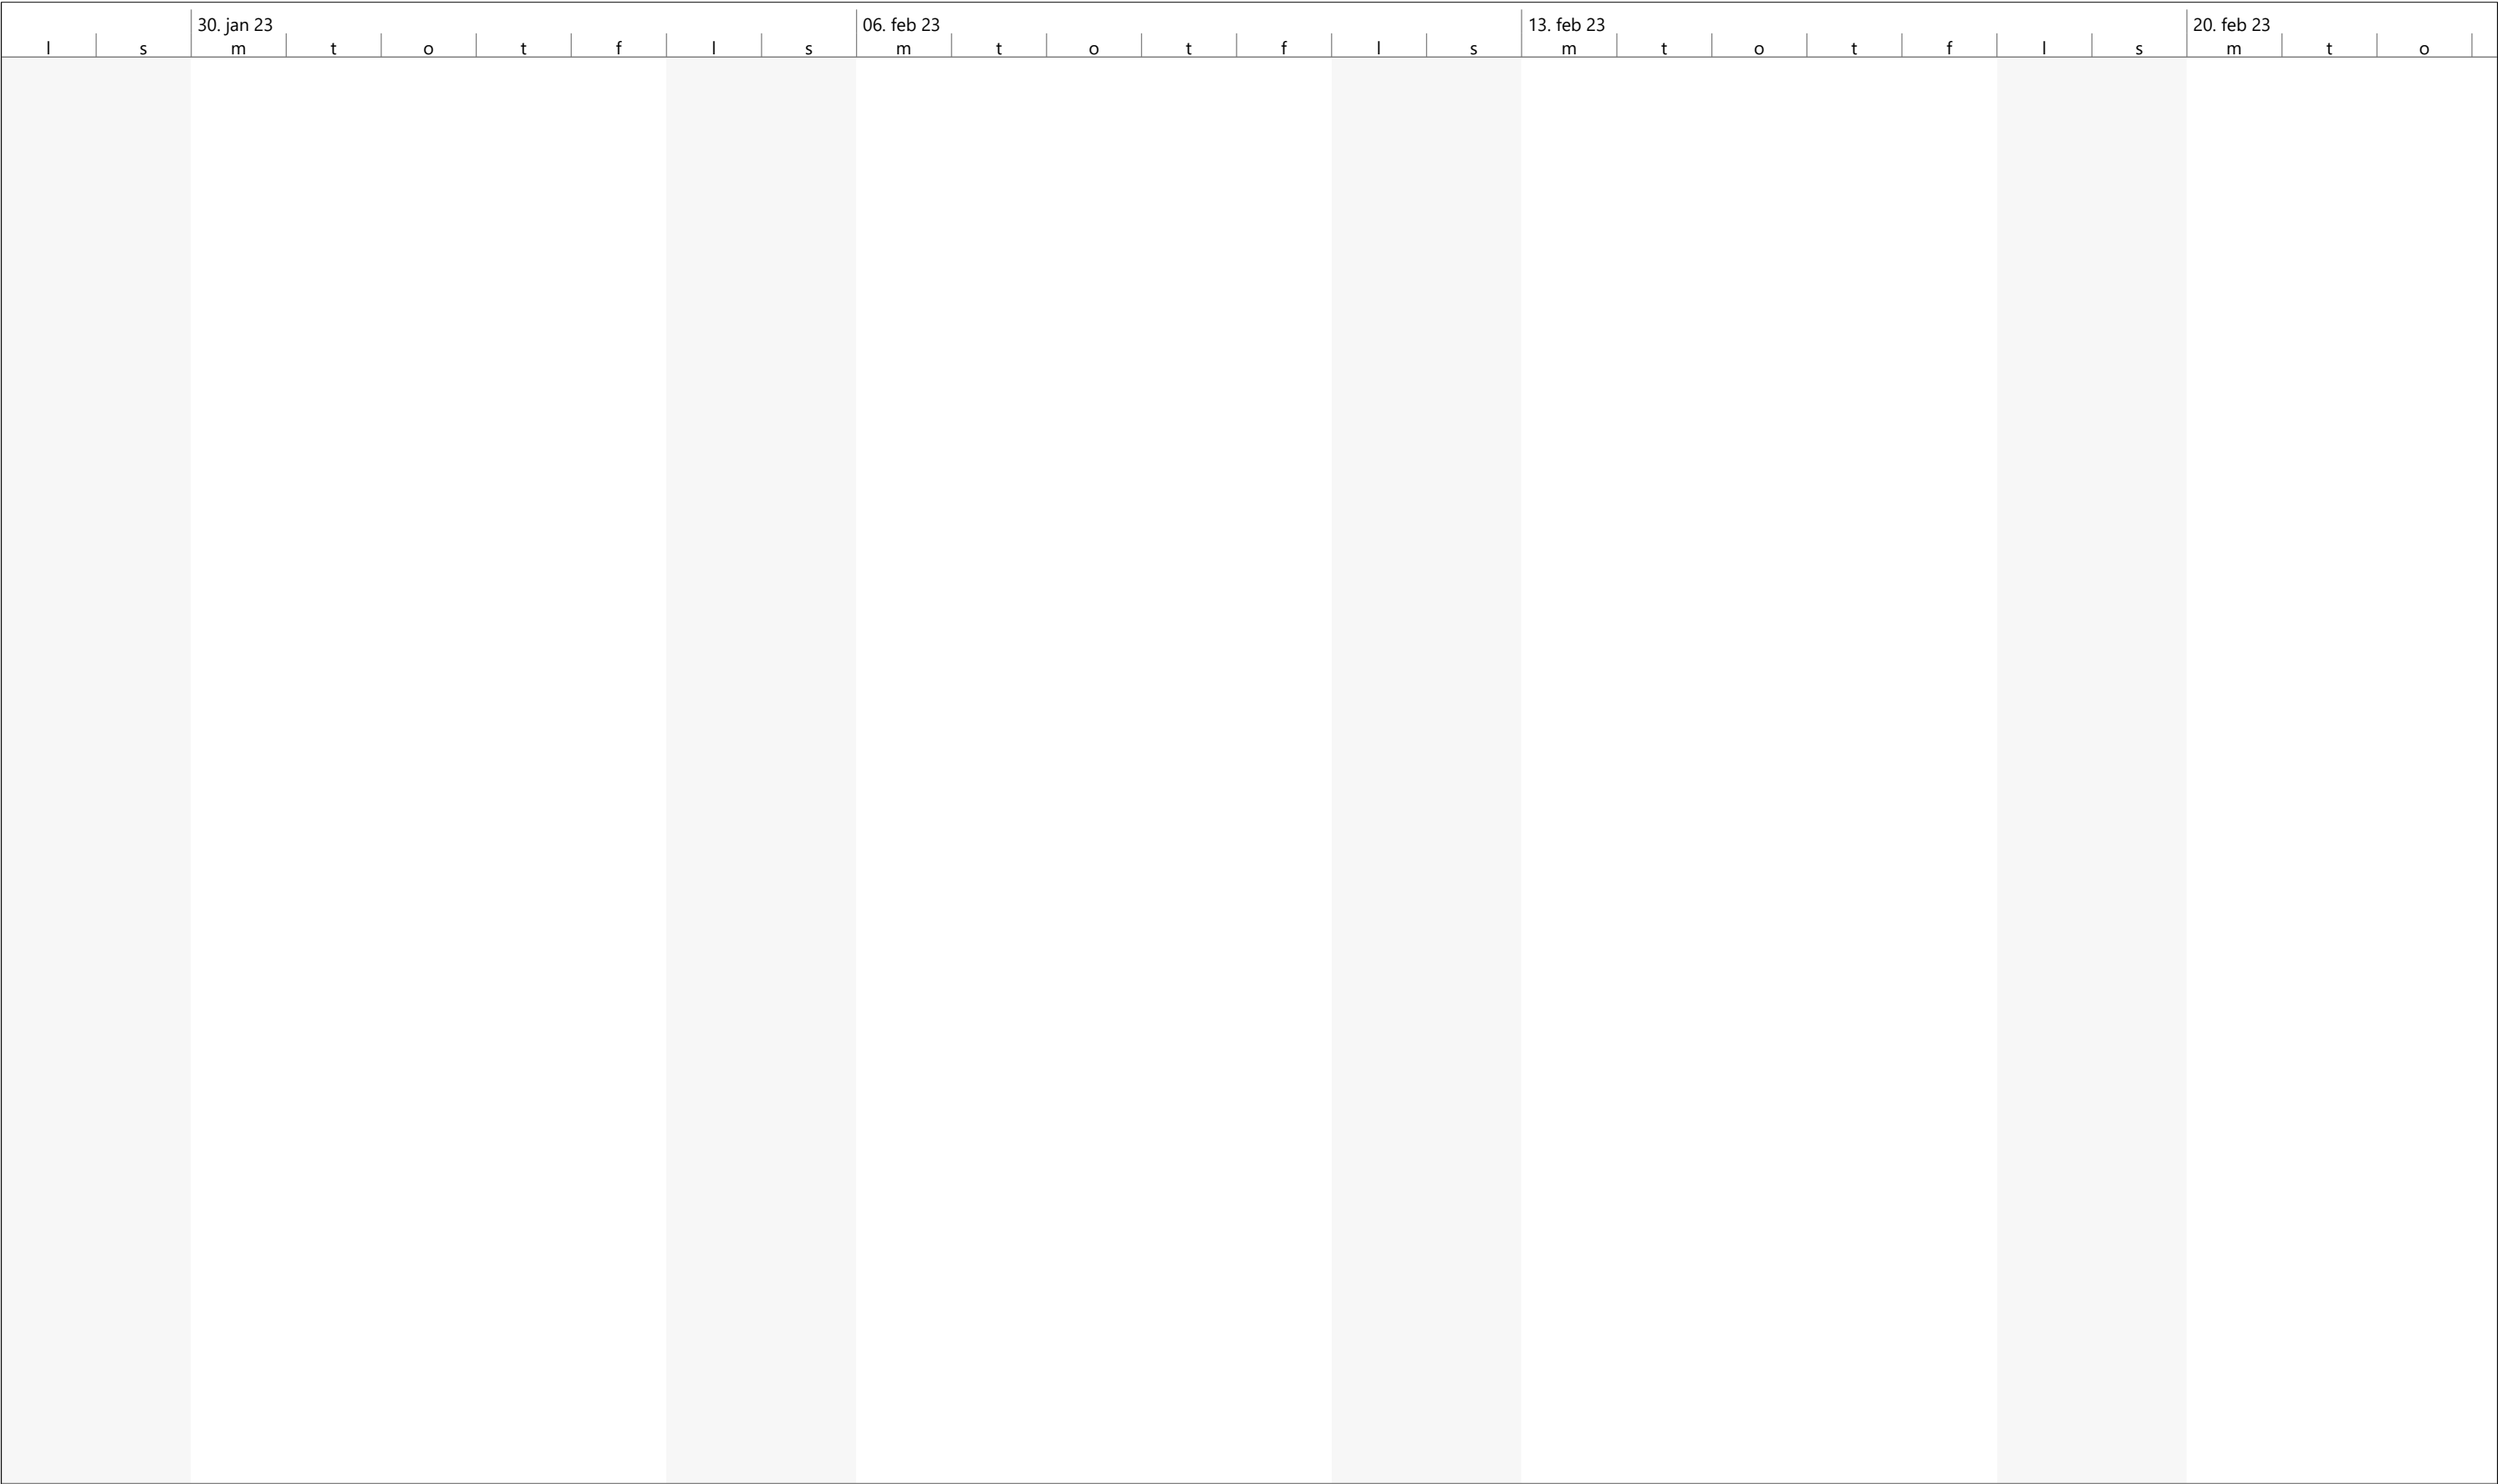









Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			






Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			






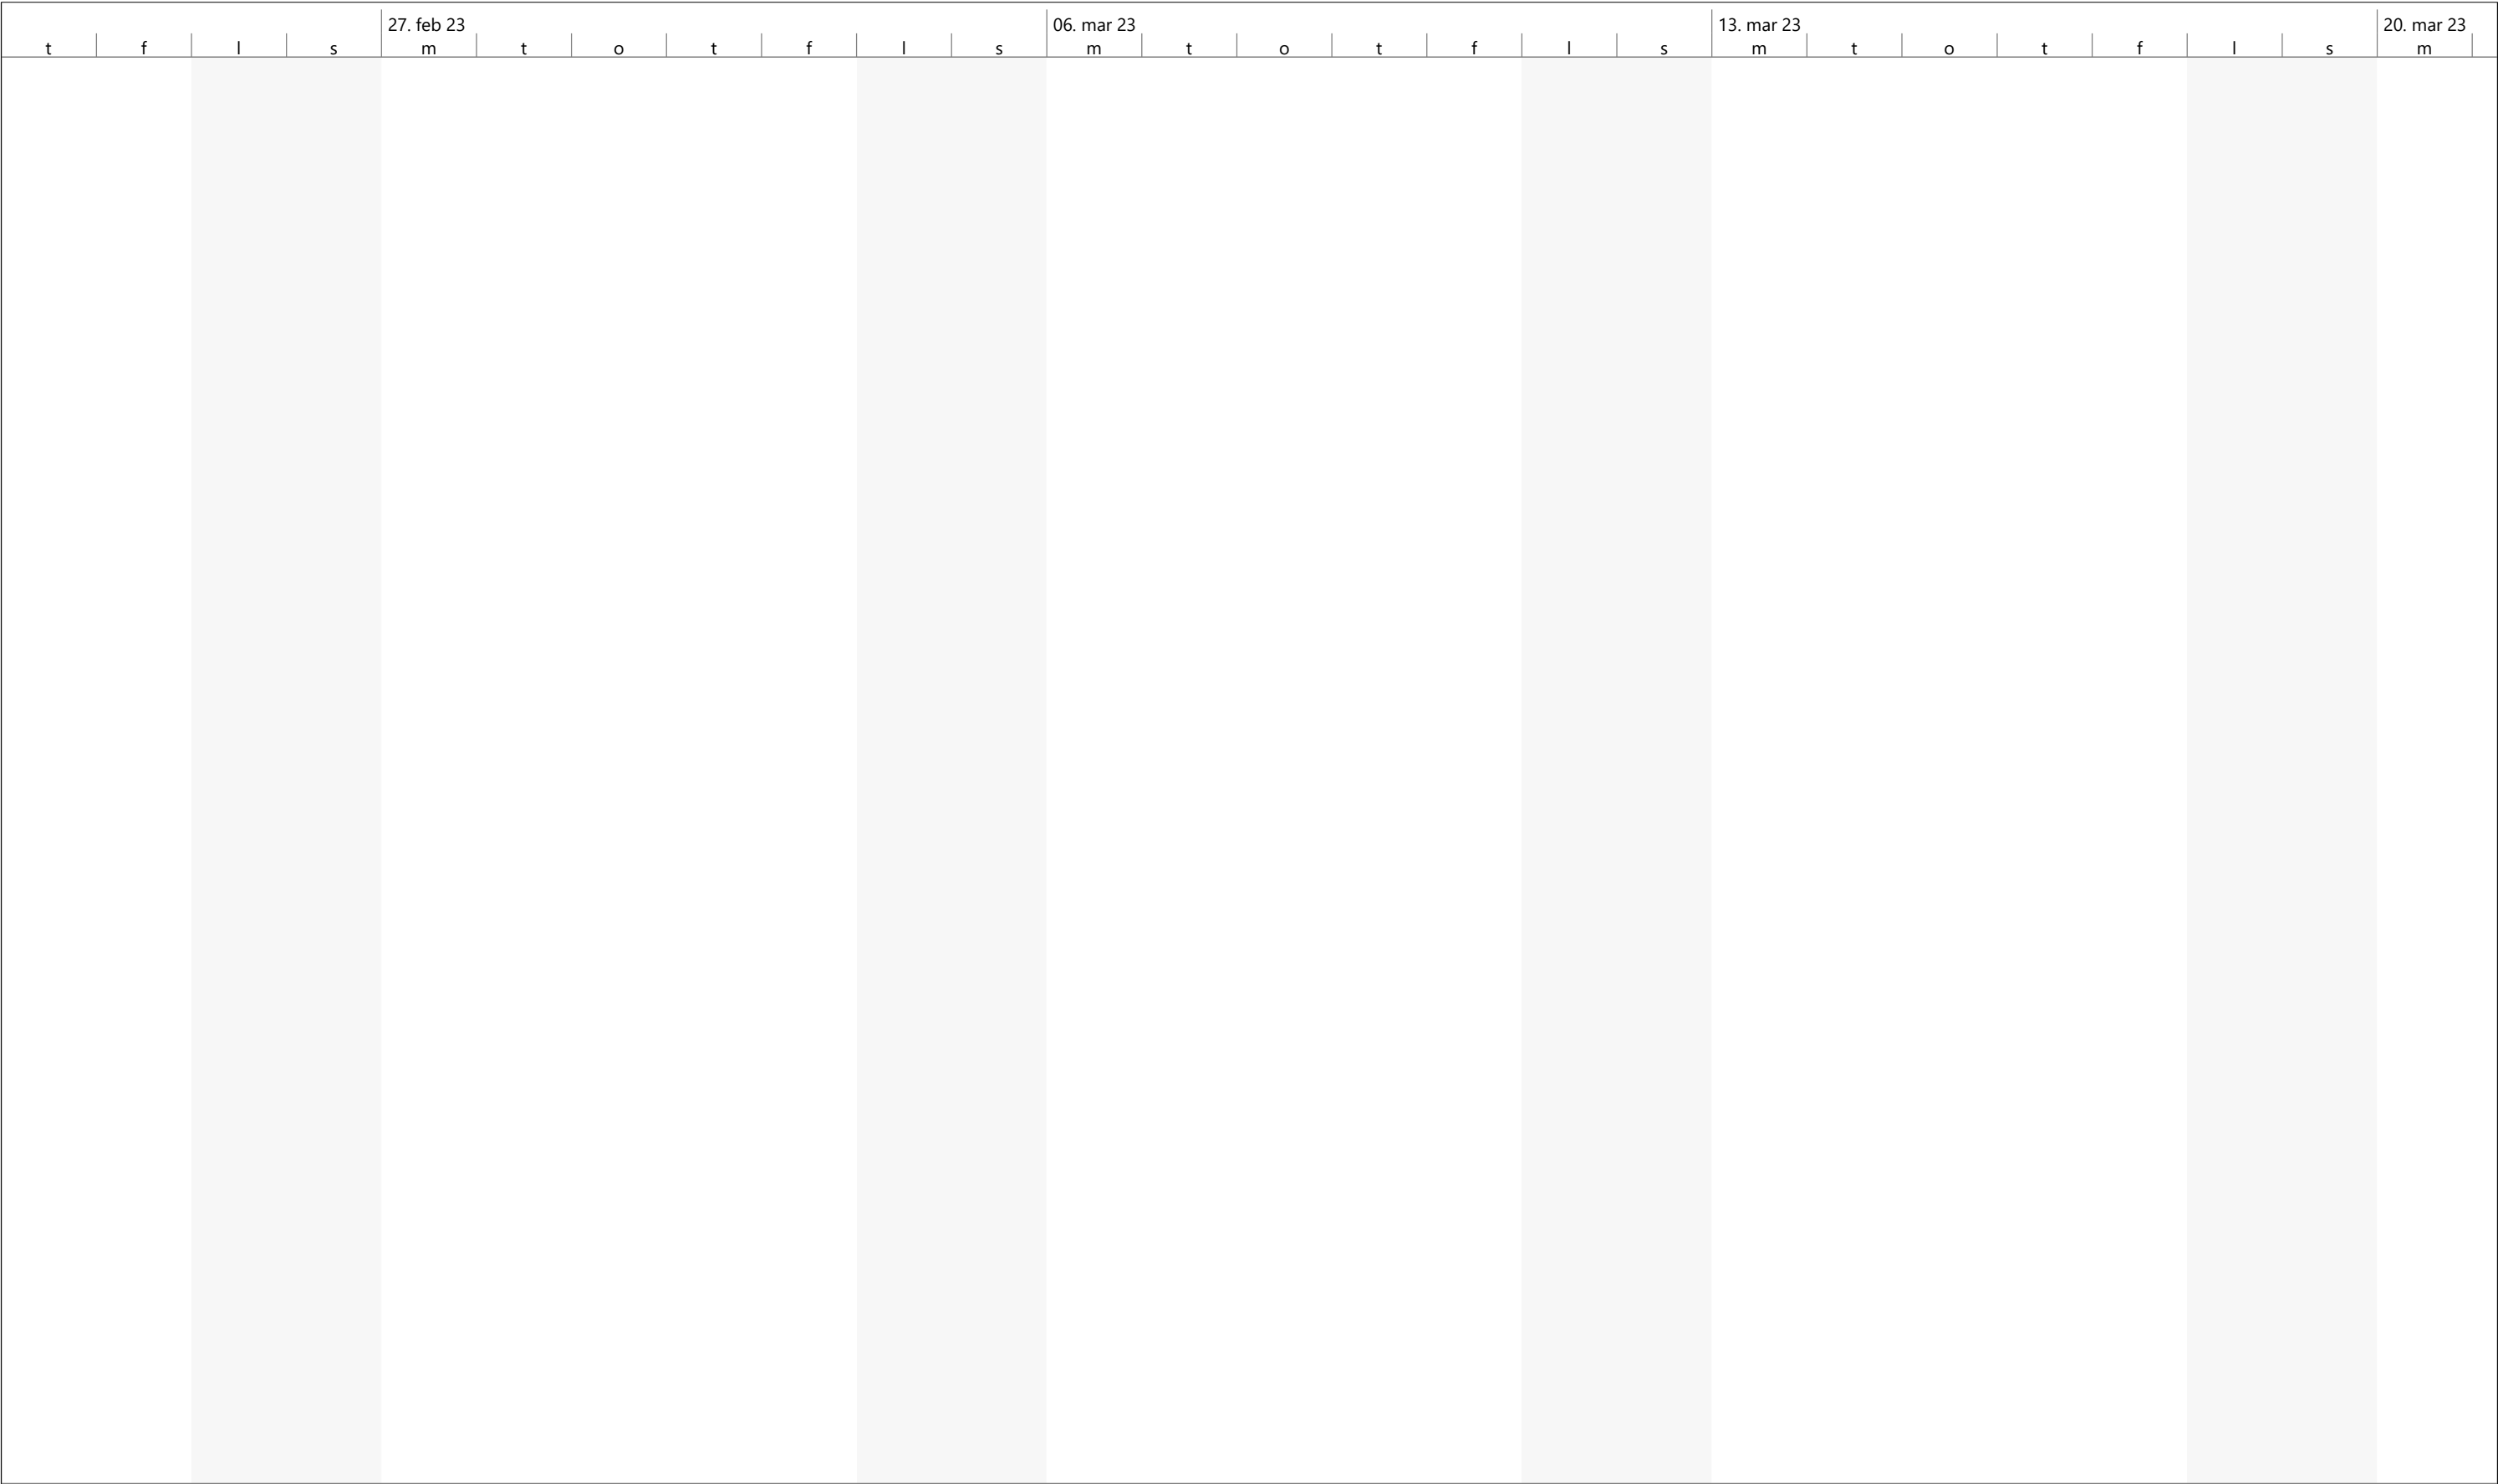








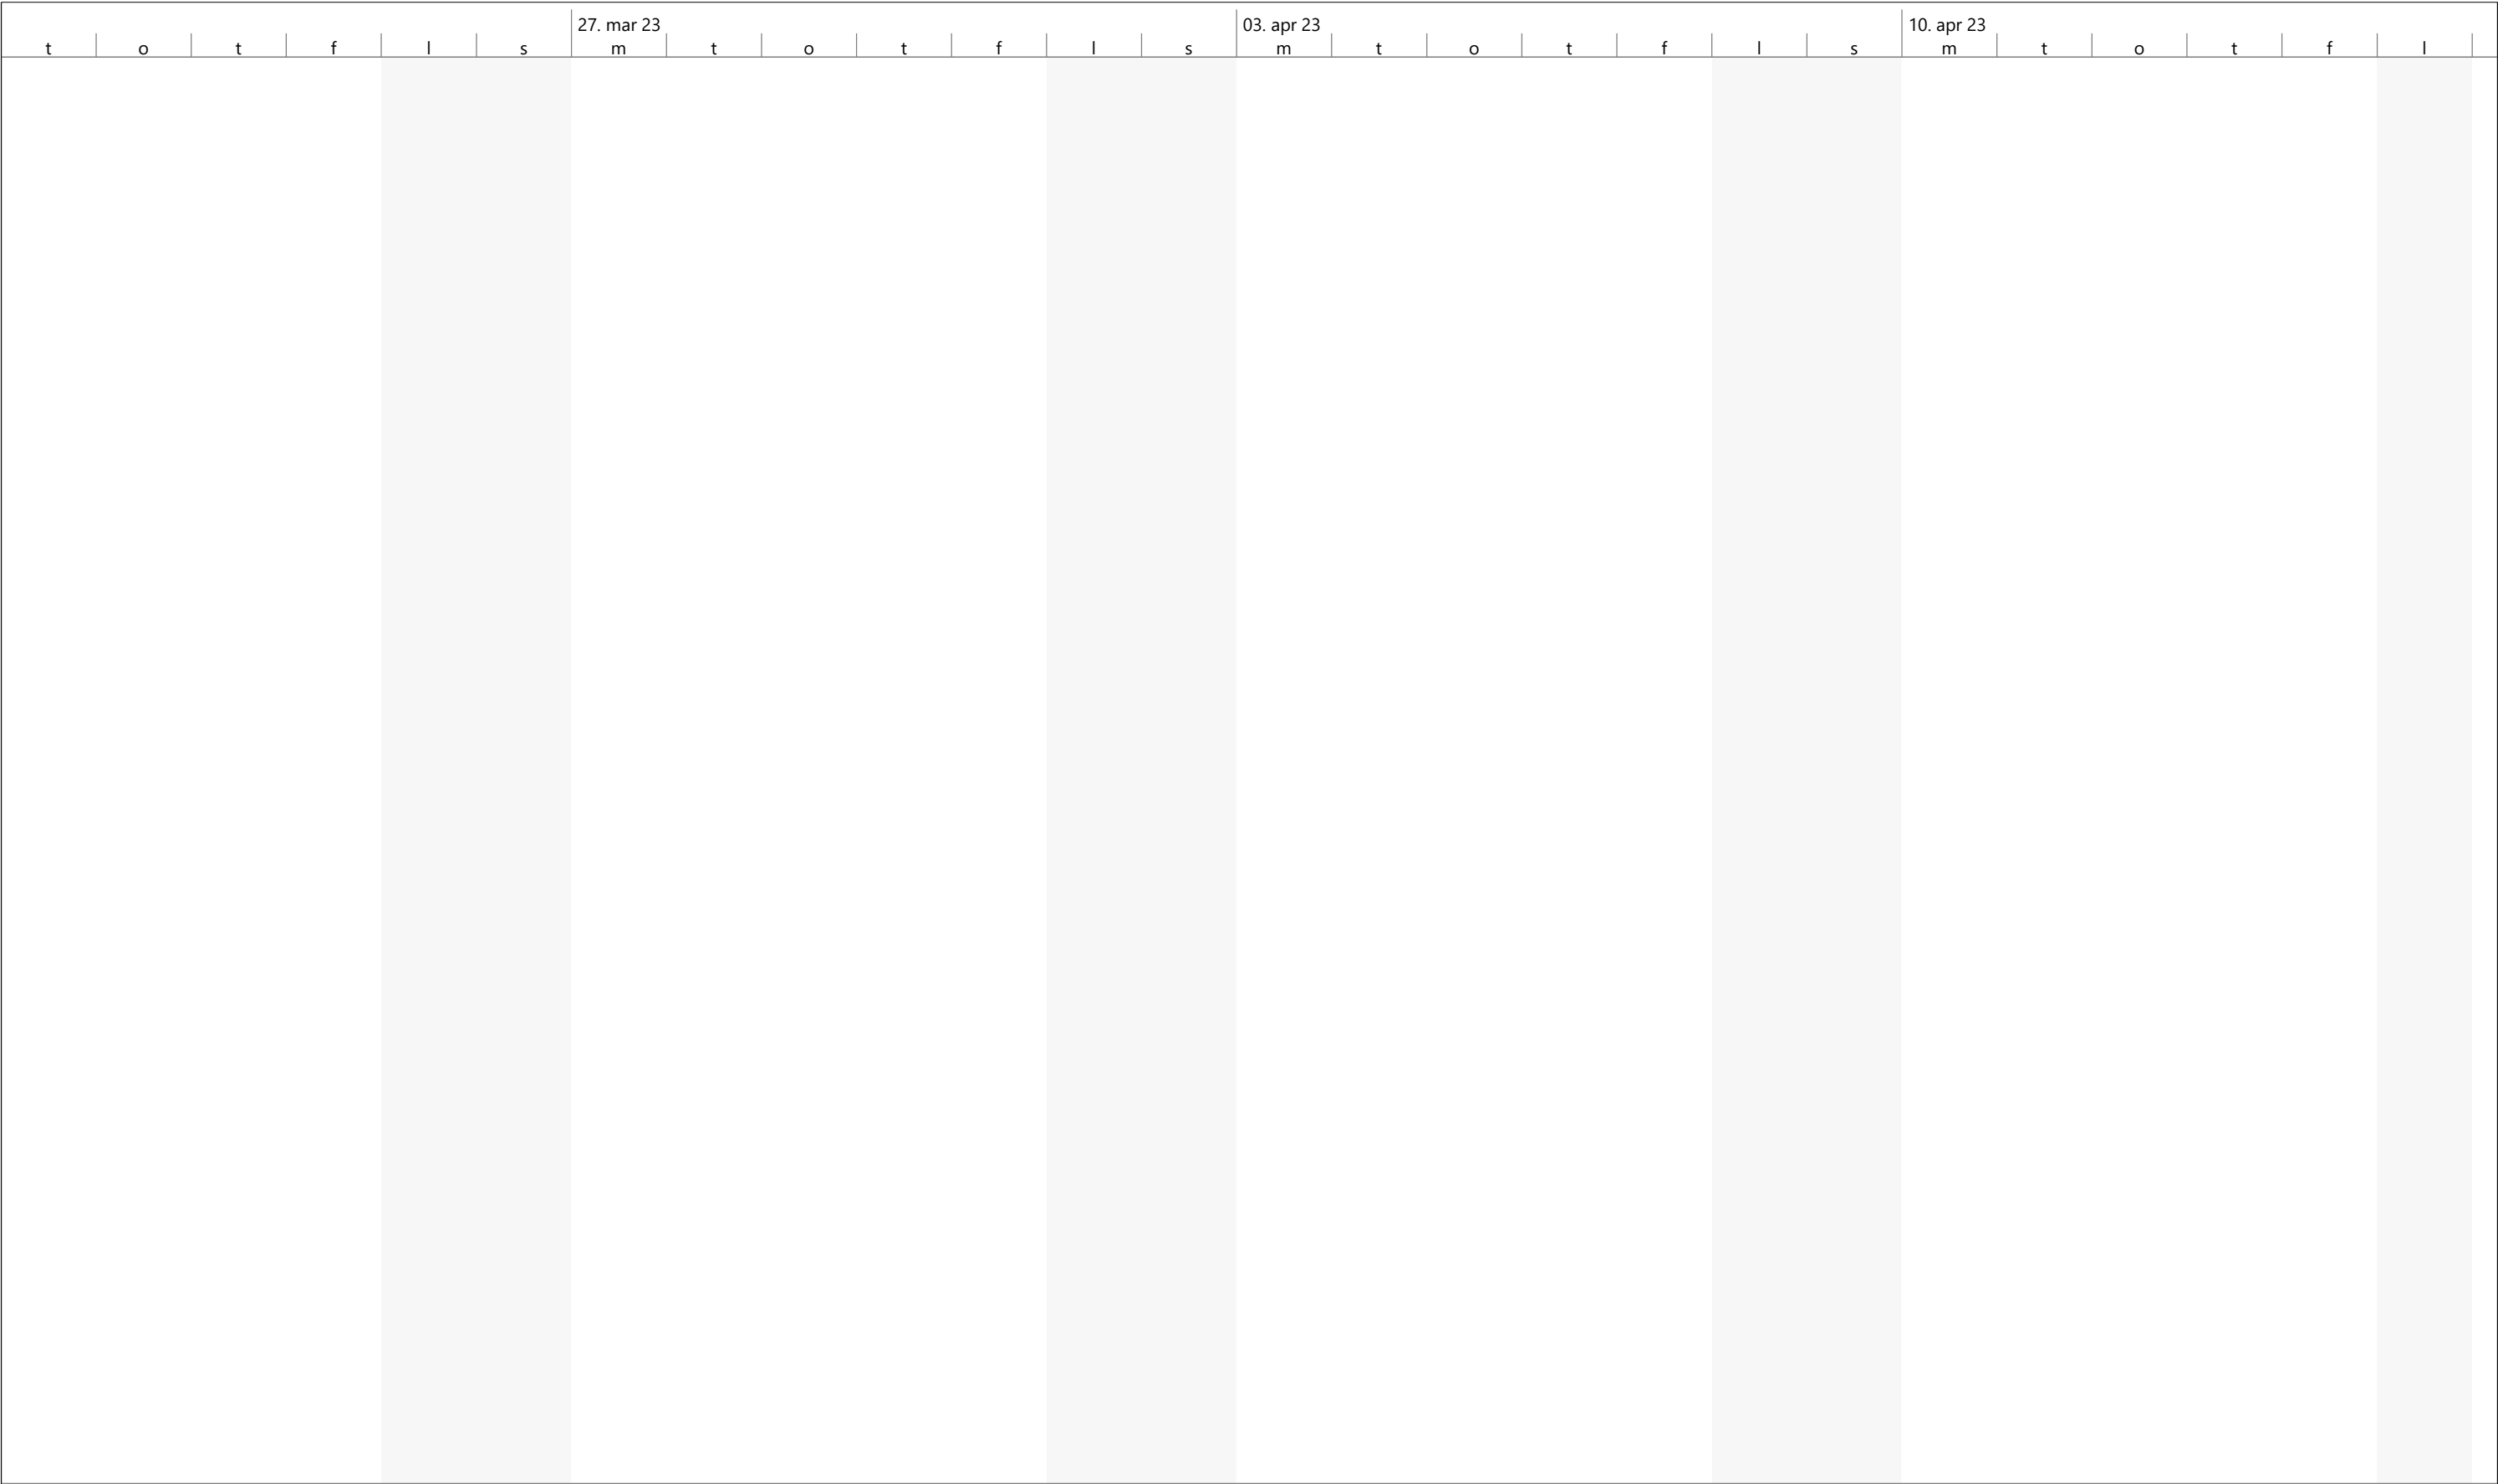












Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

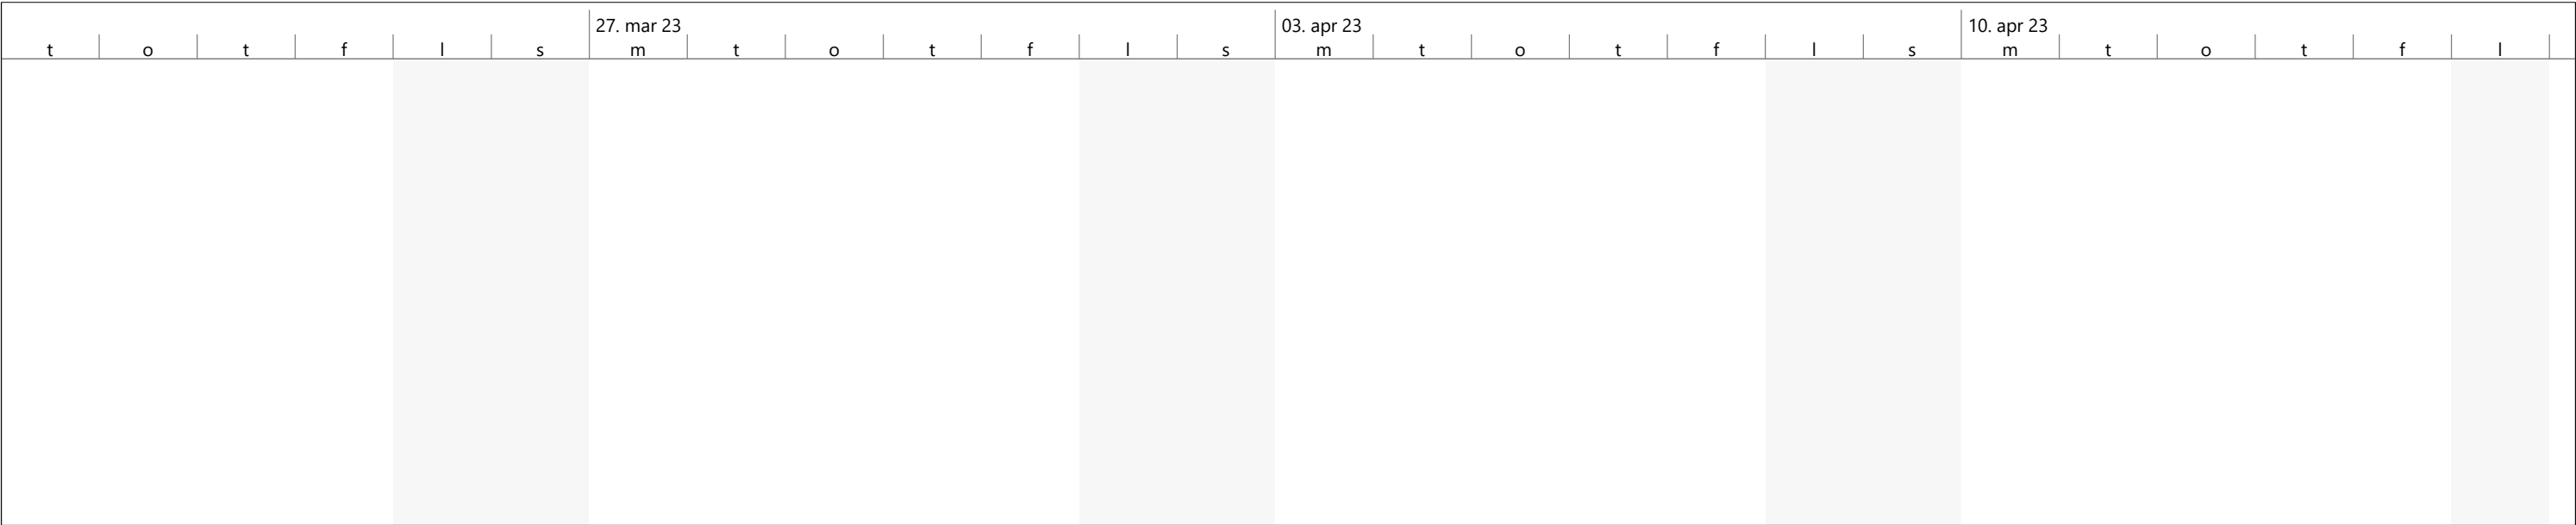

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

s

17. apr 23

m

t

o

t

f

l

s

24. apr 23

m

t

o

t

f

l

s

01. maj 23

m

t

o

t

f

l

s

08. maj 23

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift


Manuel status

Side 29

s	17. apr 23 m t o t f l s							24. apr 23 m t o t f l s							01. maj 23 m t o t f l s							08. maj 23 m t o t				



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

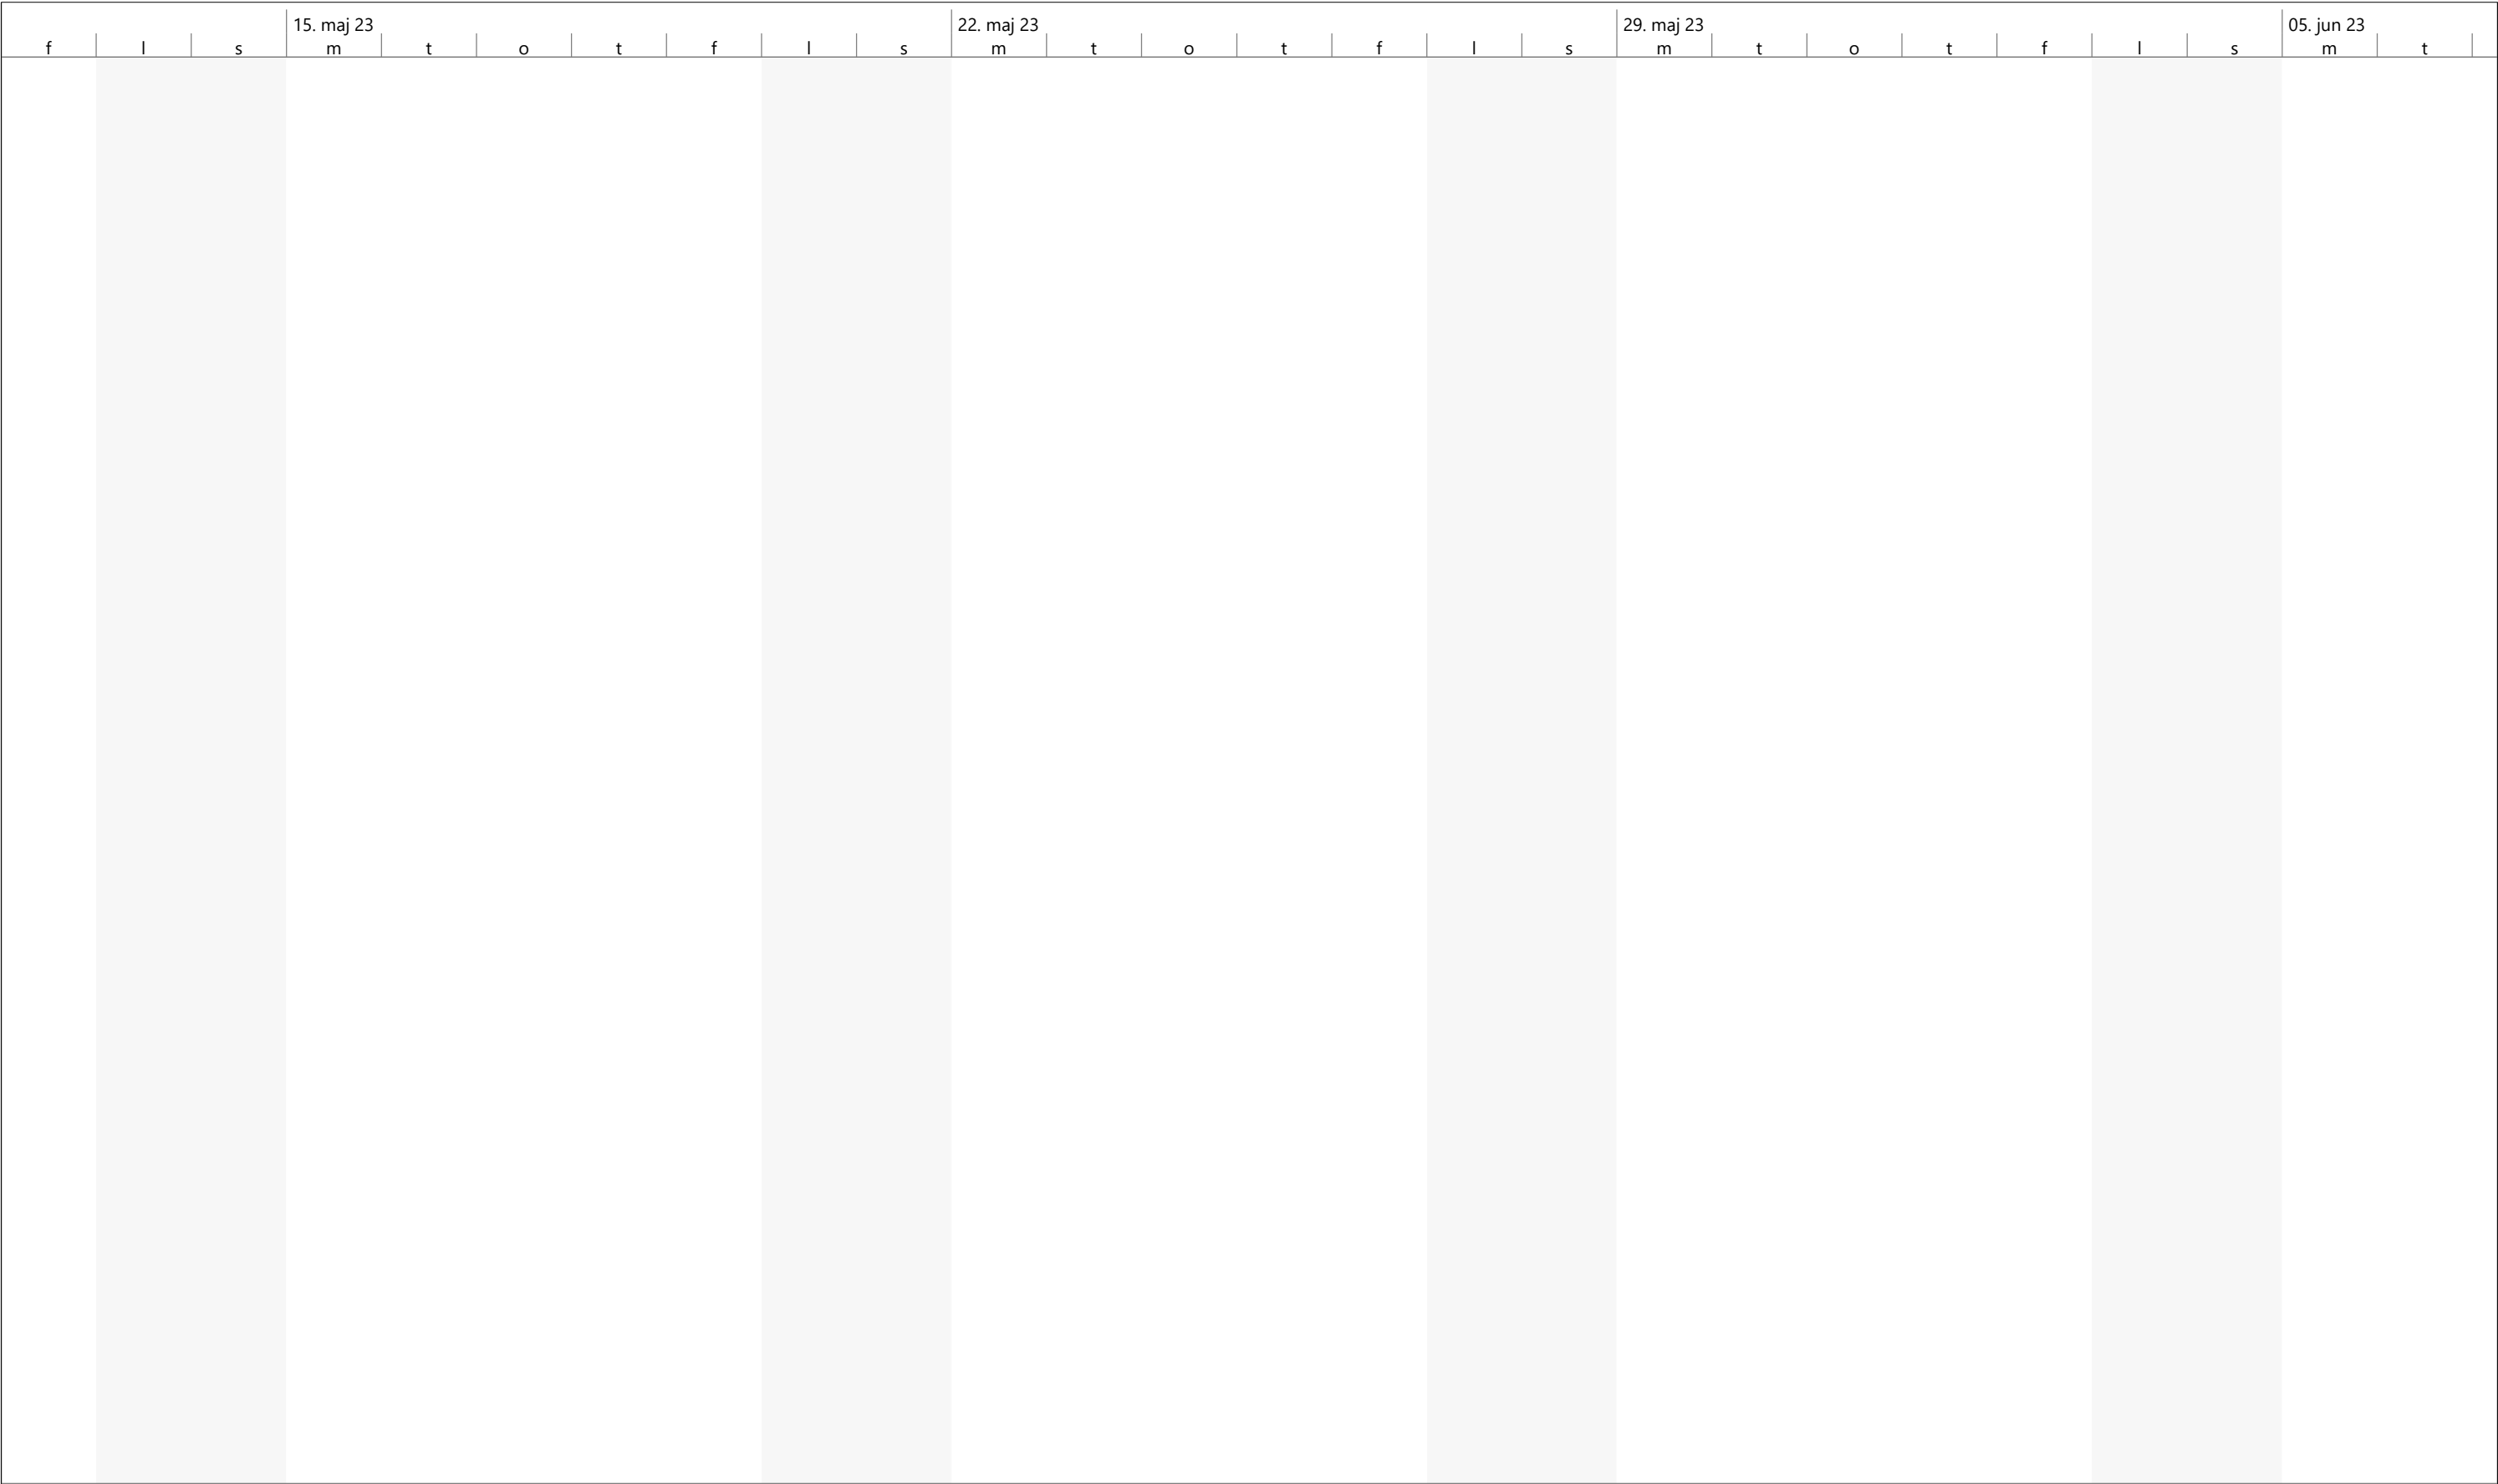

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





o

t

f

l

s

12. jun 23

m

t

o

t

f

l

s

19. jun 23

m

t

o

t

f

l

s

26. jun 23

m

t

o

t

f

l

s

03

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

◆

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 33



03. jul 23

m

t

o

t

f

l

s

10. jul 23

m

t

o

t

f

l

s

17. jul 23

m

t

o

t

f

l

s

24. jul 23

m

t

o

t

f

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl


Deadline










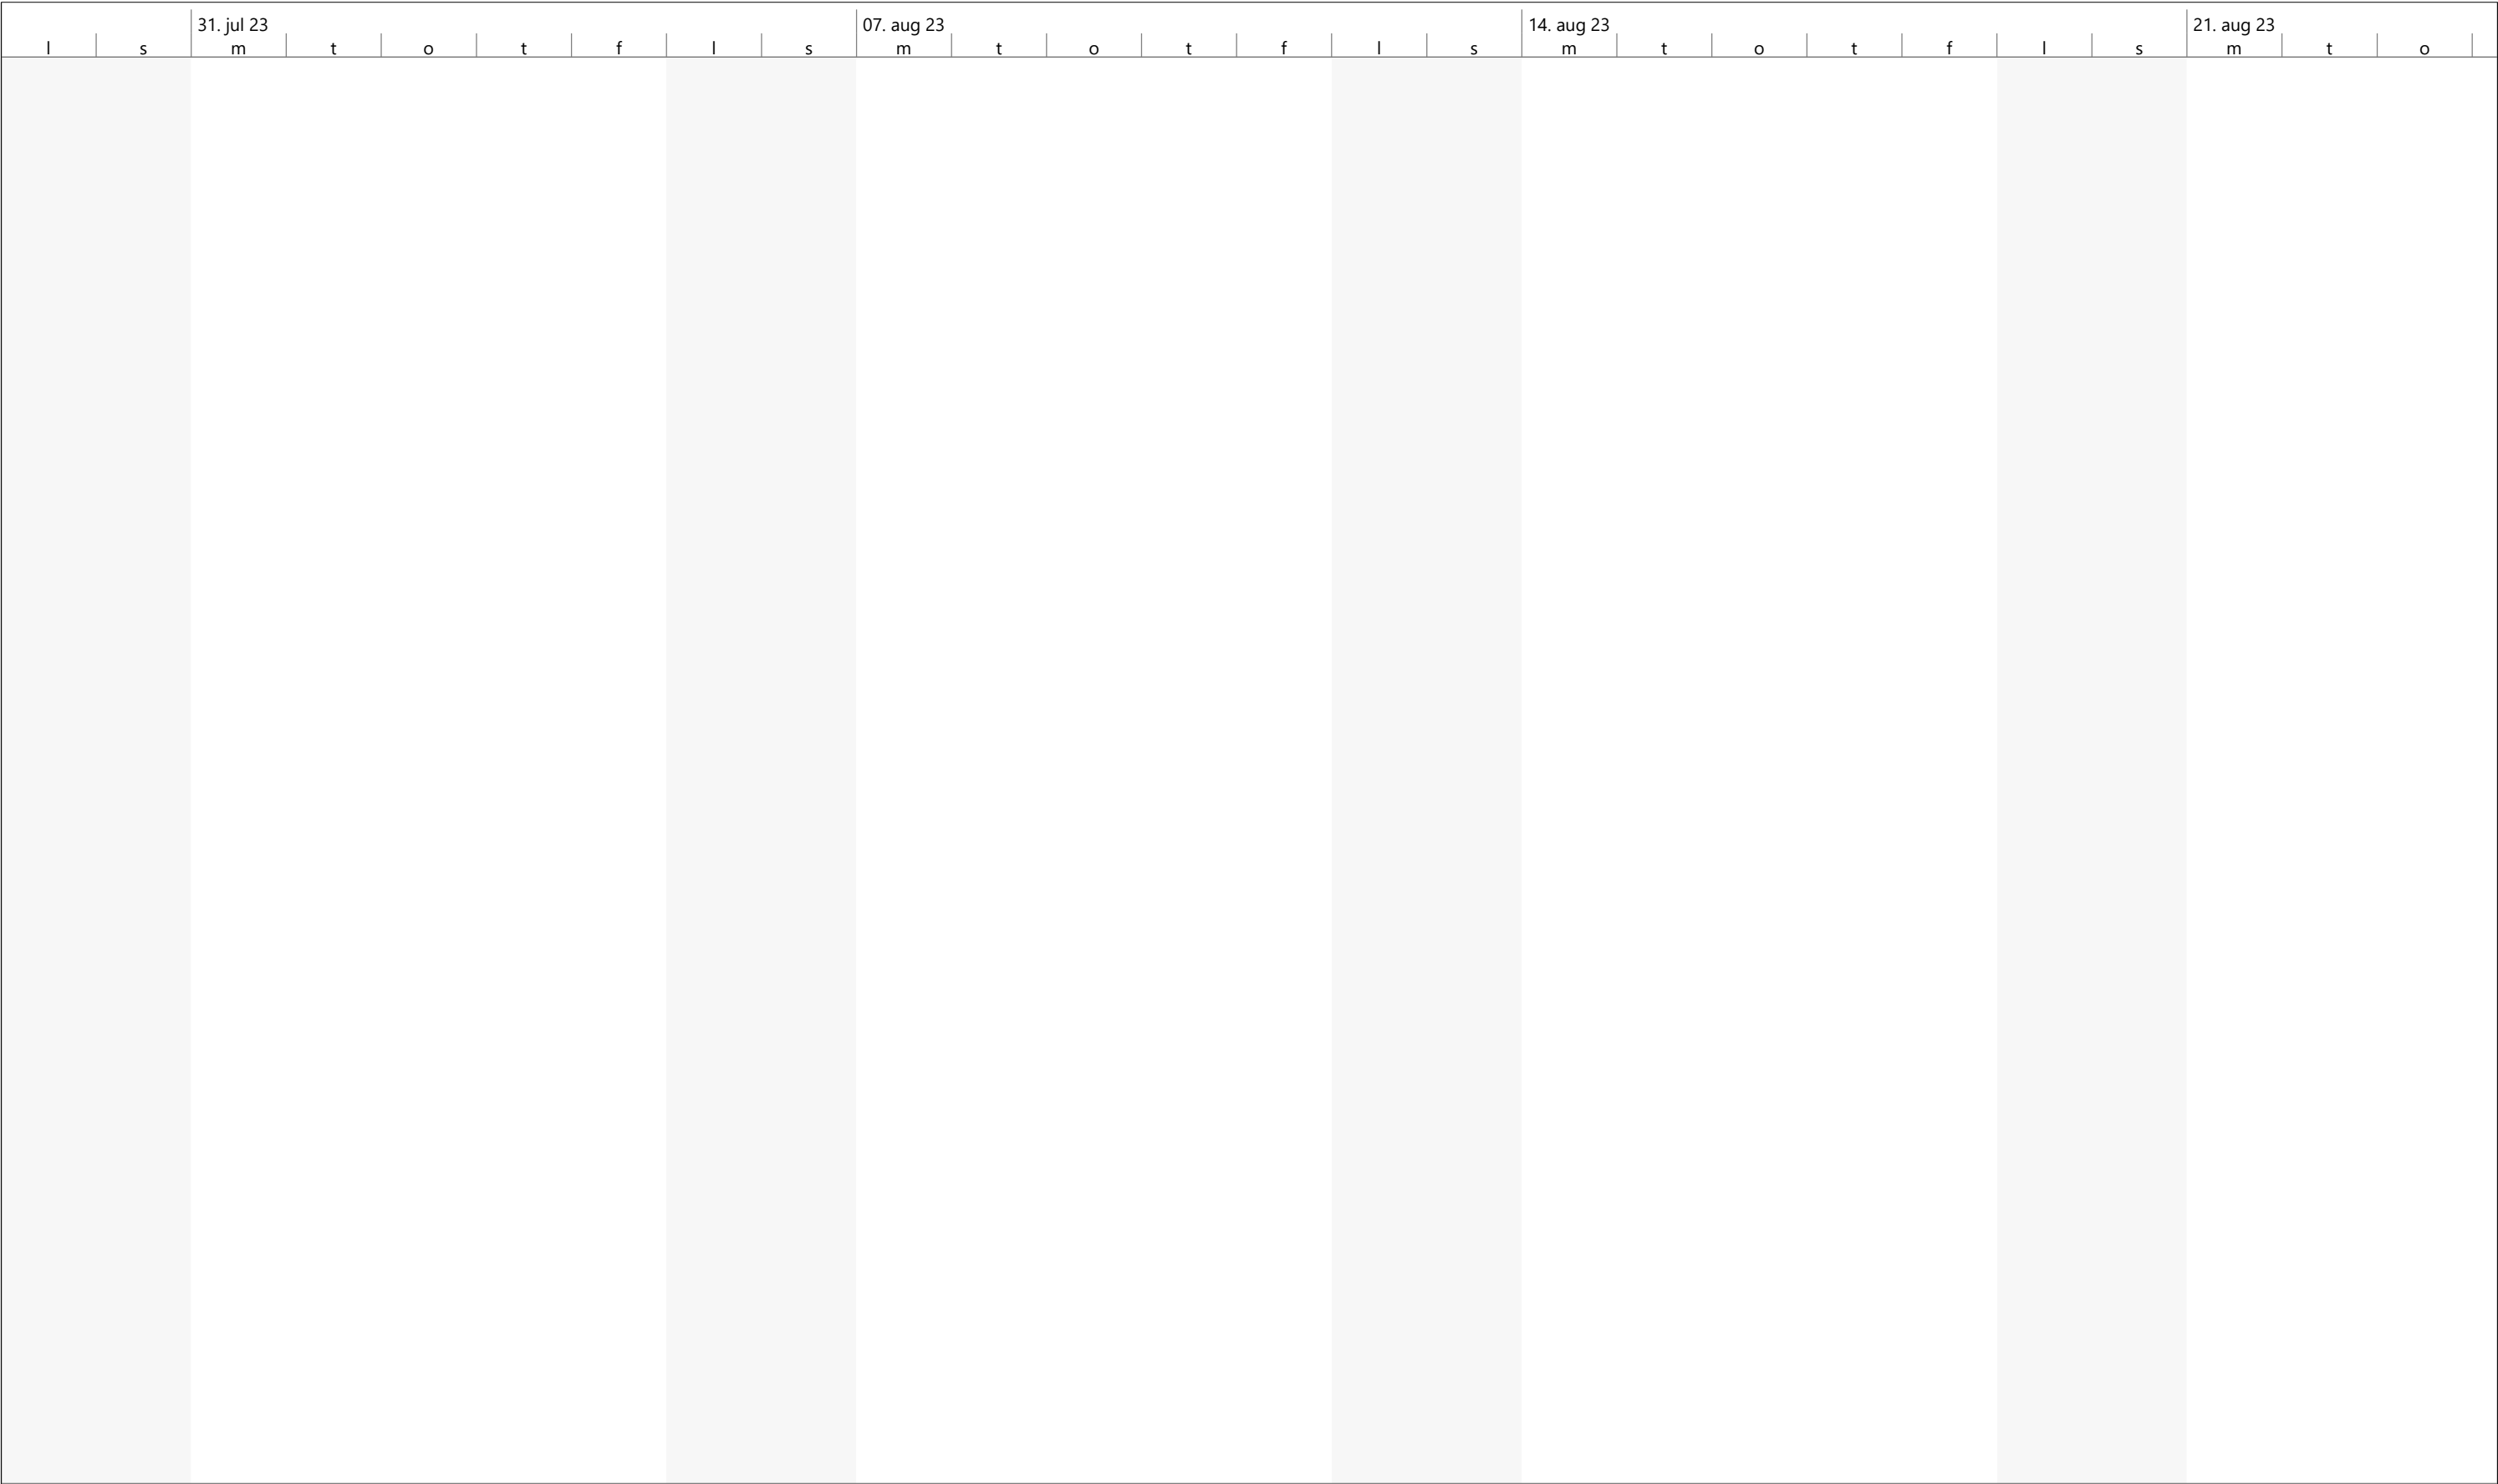









Fremdrift

Manuel status


Side 35





Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



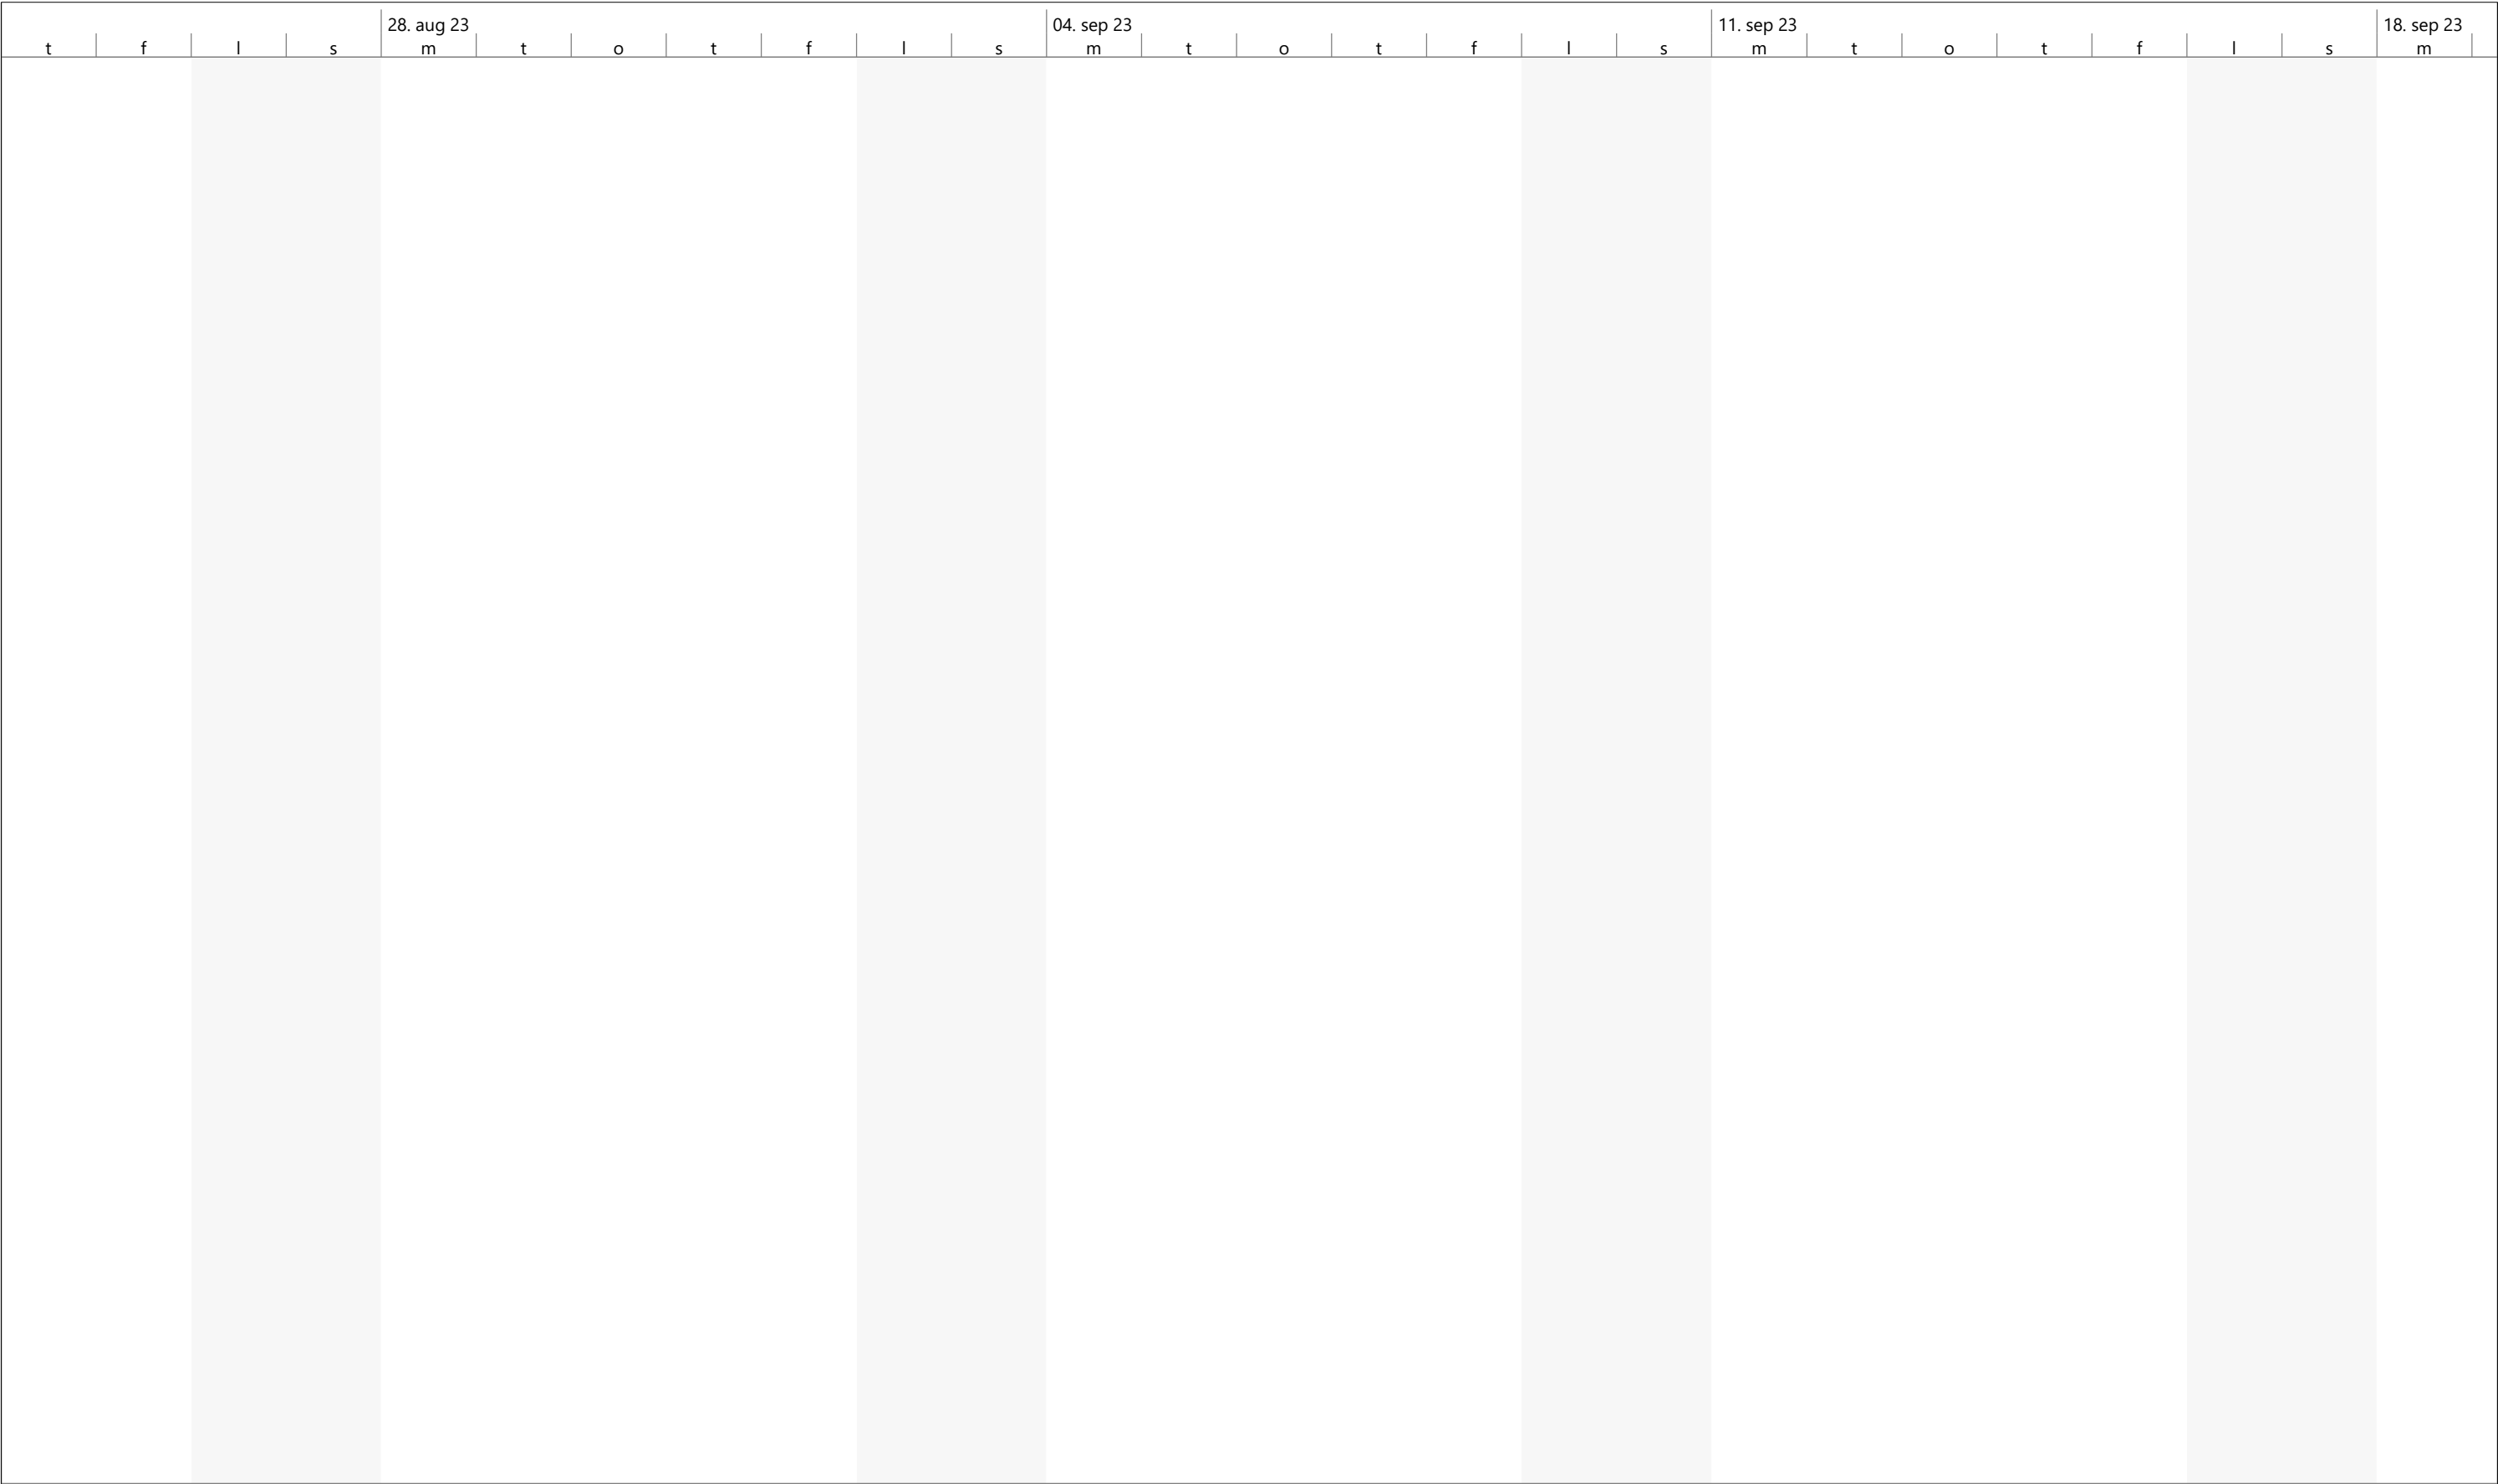

Dato: ti 26-05-26


Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

t	f	l	s	28. aug 23 m	t	o	t	f	l	s	04. sep 23 m	t	o	t	f	l	s	11. sep 23 m	t	o	t	f	l	s	18. sep 23 m



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



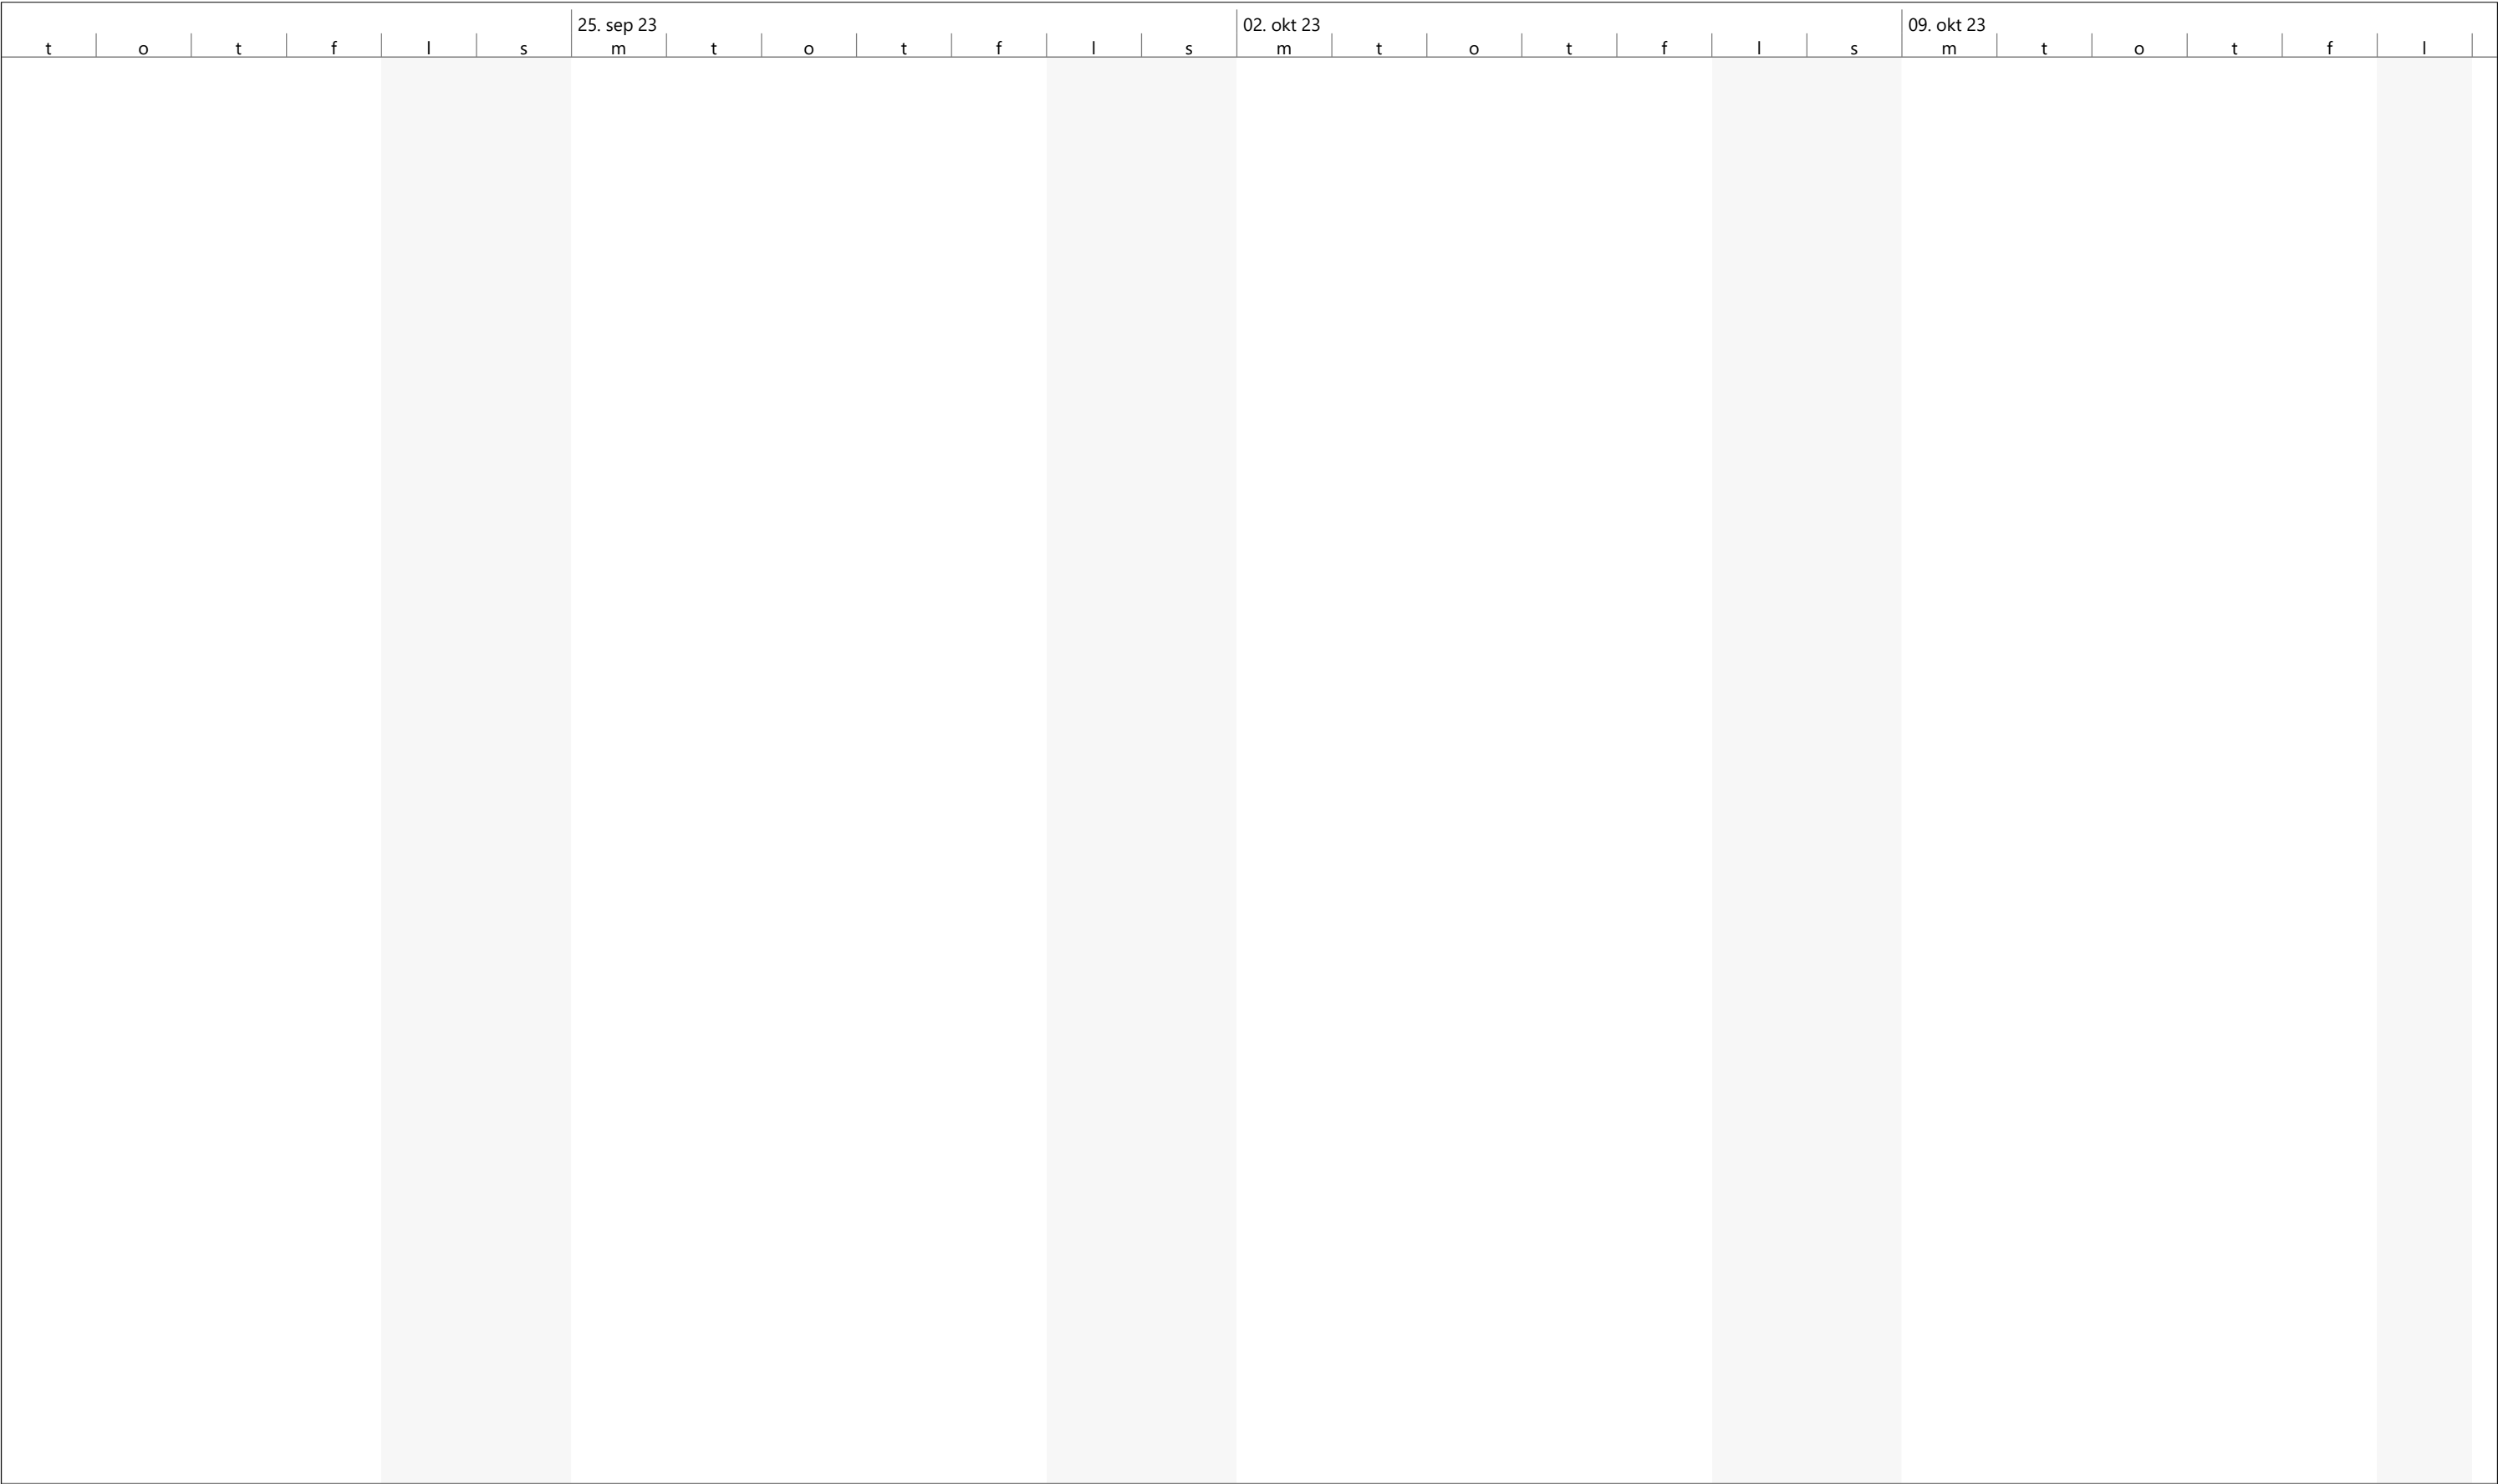

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



s

16. okt 23

m

t

o

t

f

l

s

23. okt 23

m

t

o

t

f

l

s

30. okt 23

m

t

o

t

f

l

s

06. nov 23

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift


Manuel status

Side 43

s	16. okt 23							23. okt 23							30. okt 23							06. nov 23						
m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t				



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

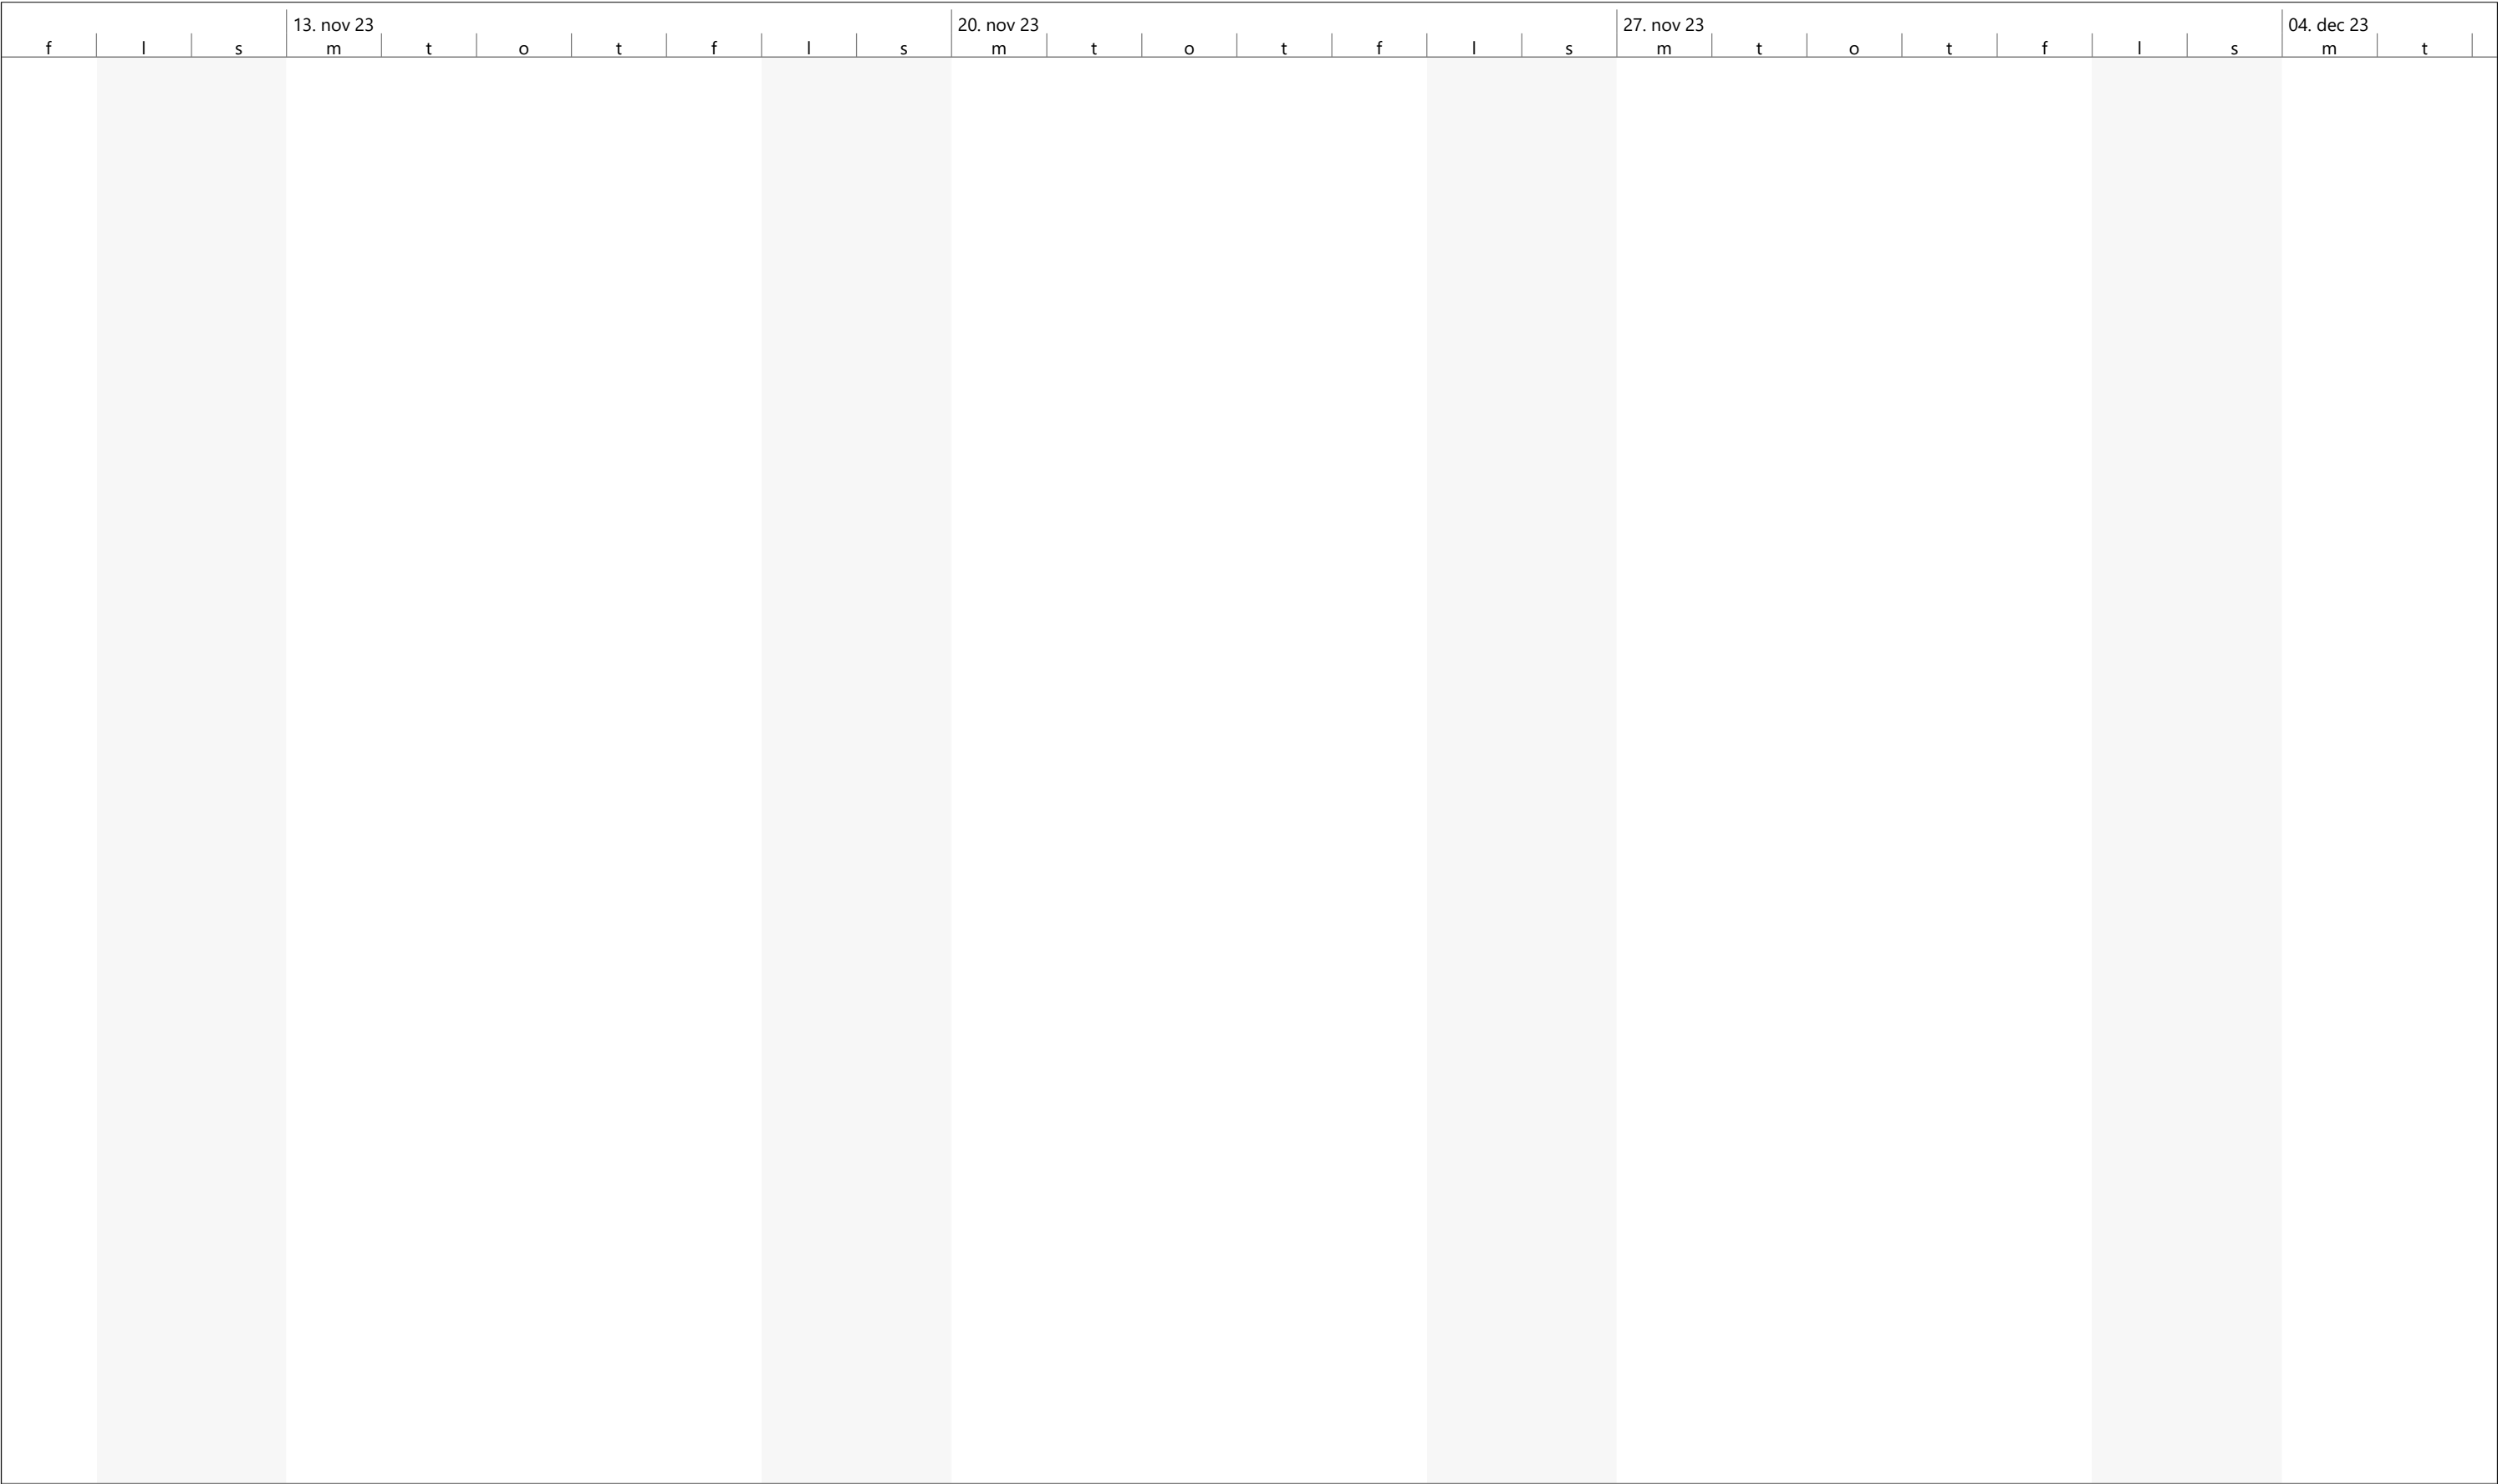

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



o

t

f

l

s

11. dec 23

m

t

o

t

f

l

s

18. dec 23

m

t

o

t

f

l

s

25. dec 23

m

t

o

t

f

l

s

01

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

◆

Deadline

Fremdrift

Manuel status


Side 47

o	t	f	l	s	11. dec 23	m	t	o	t	f	l	s	18. dec 23	m	t	o	t	f	l	s	25. dec 23	m	t	o	t	f	l	s	01




Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			




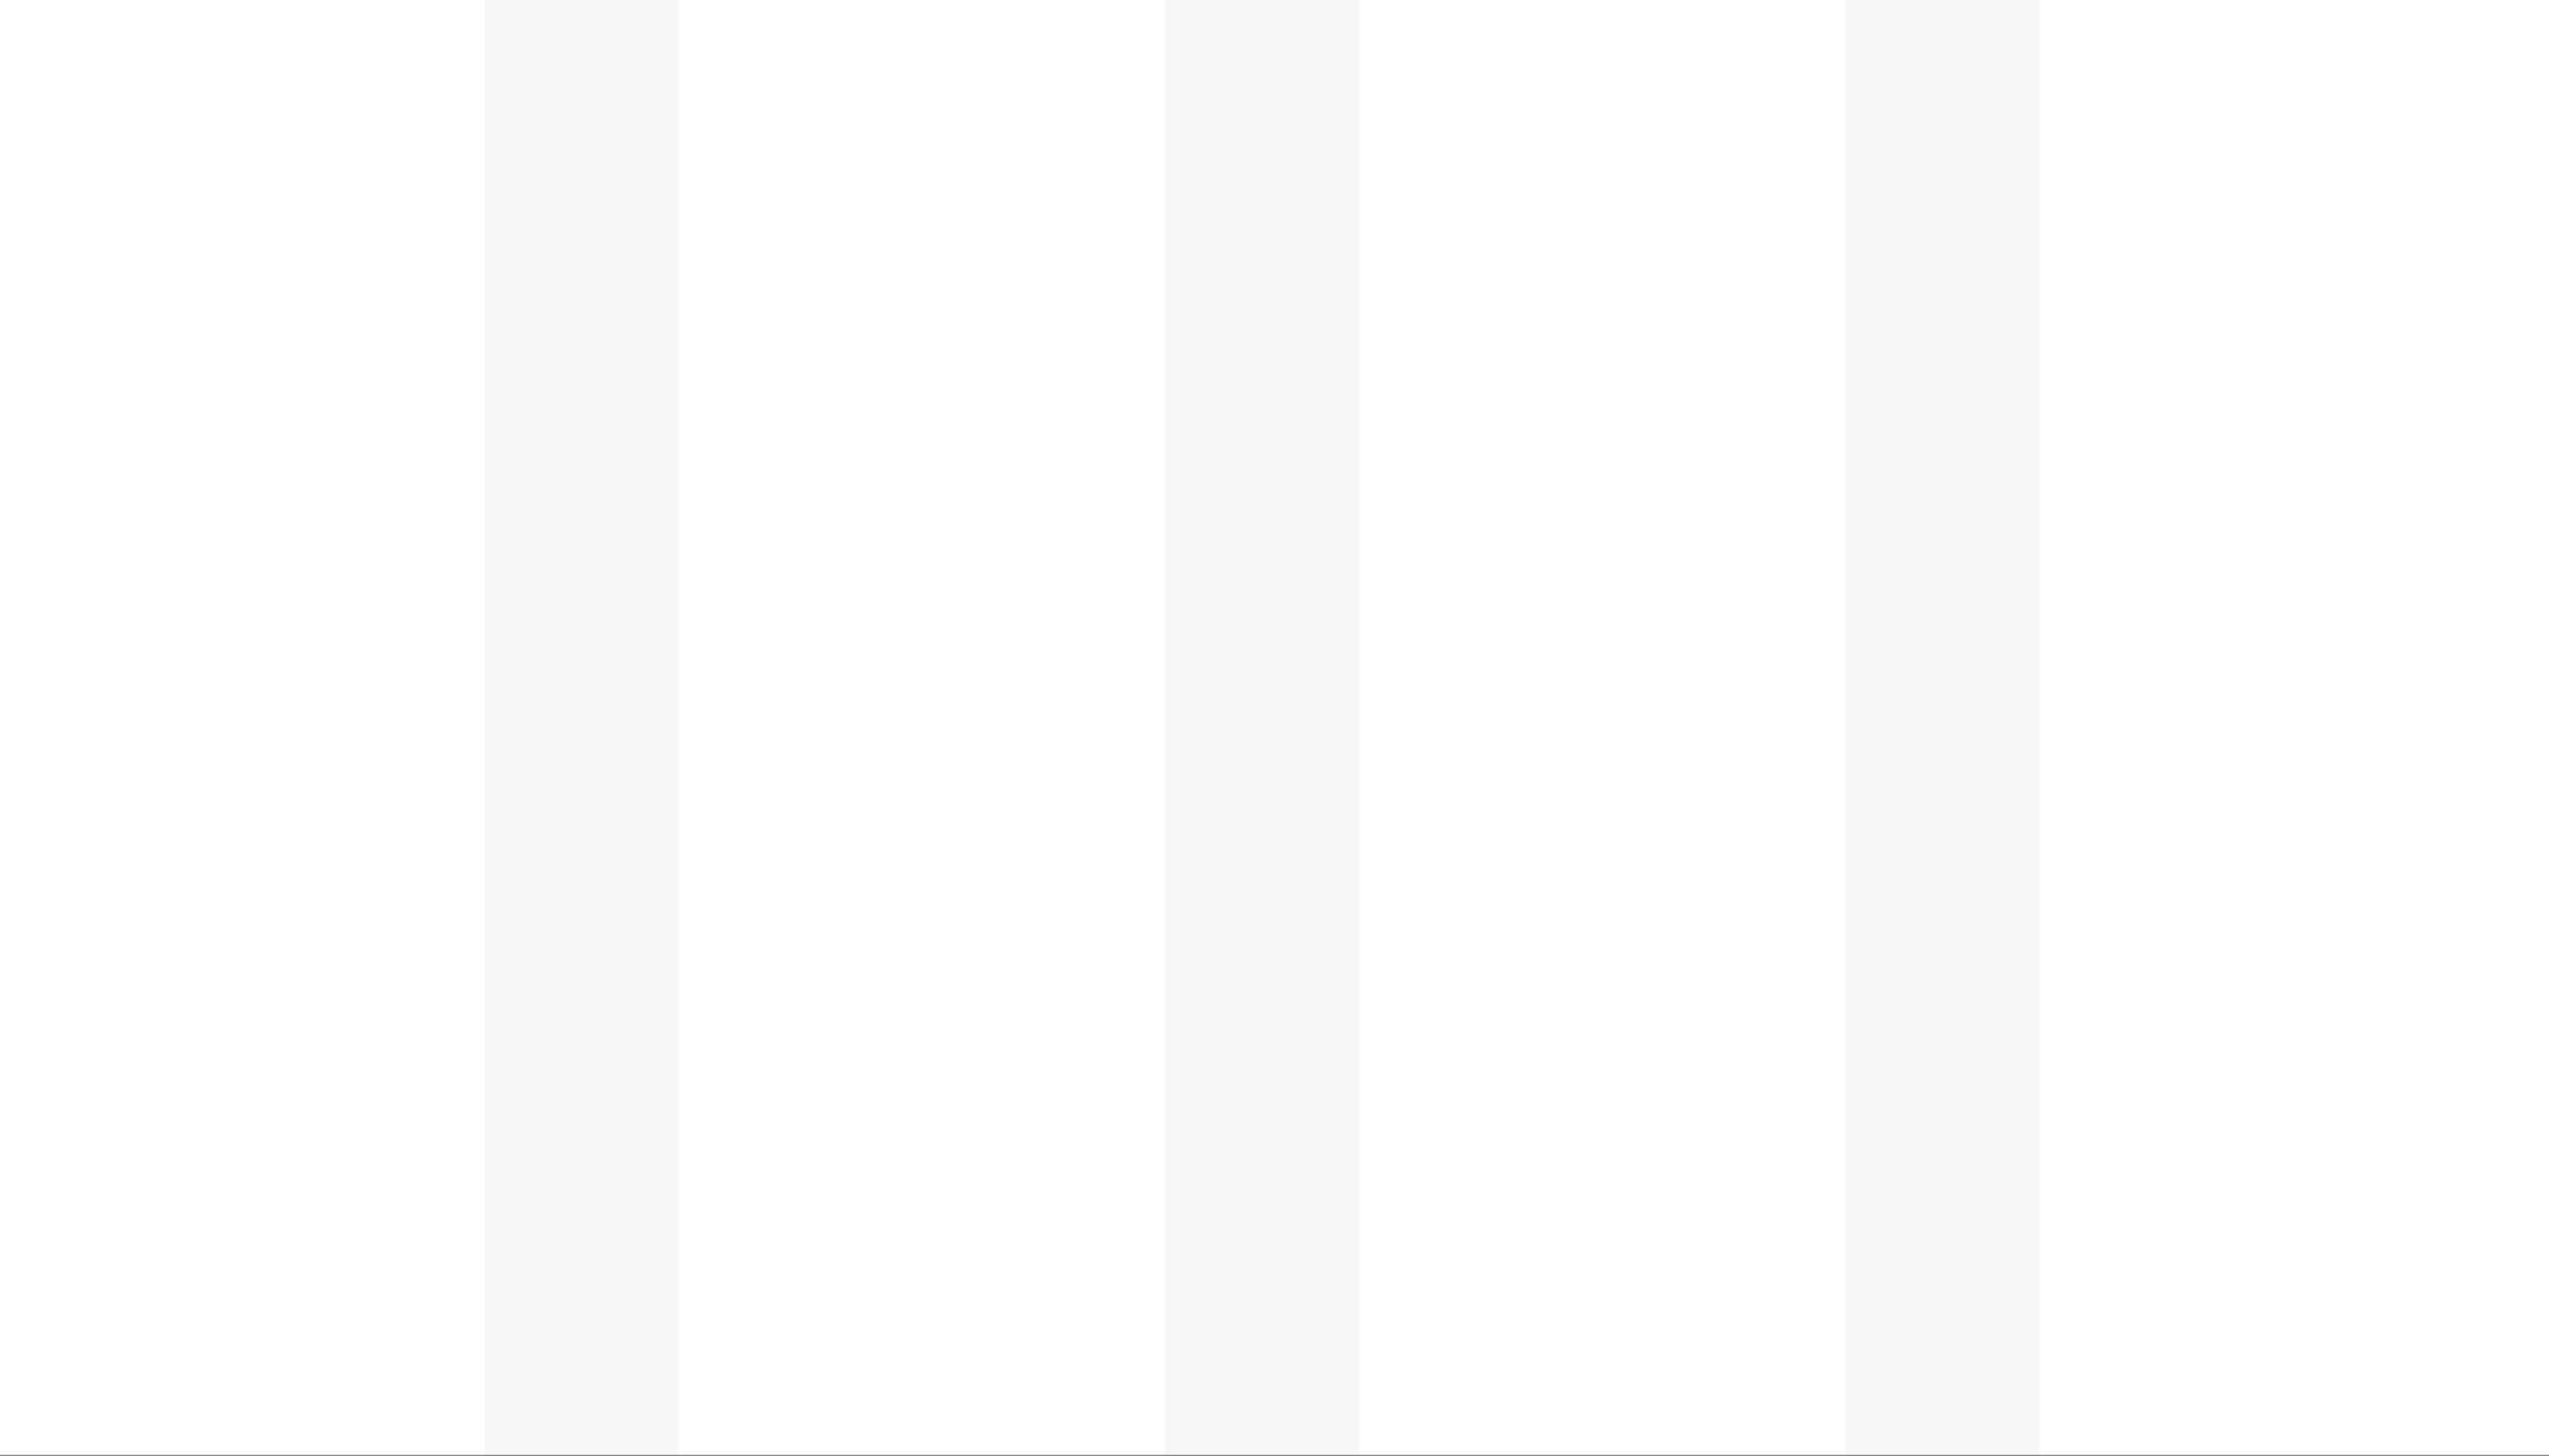





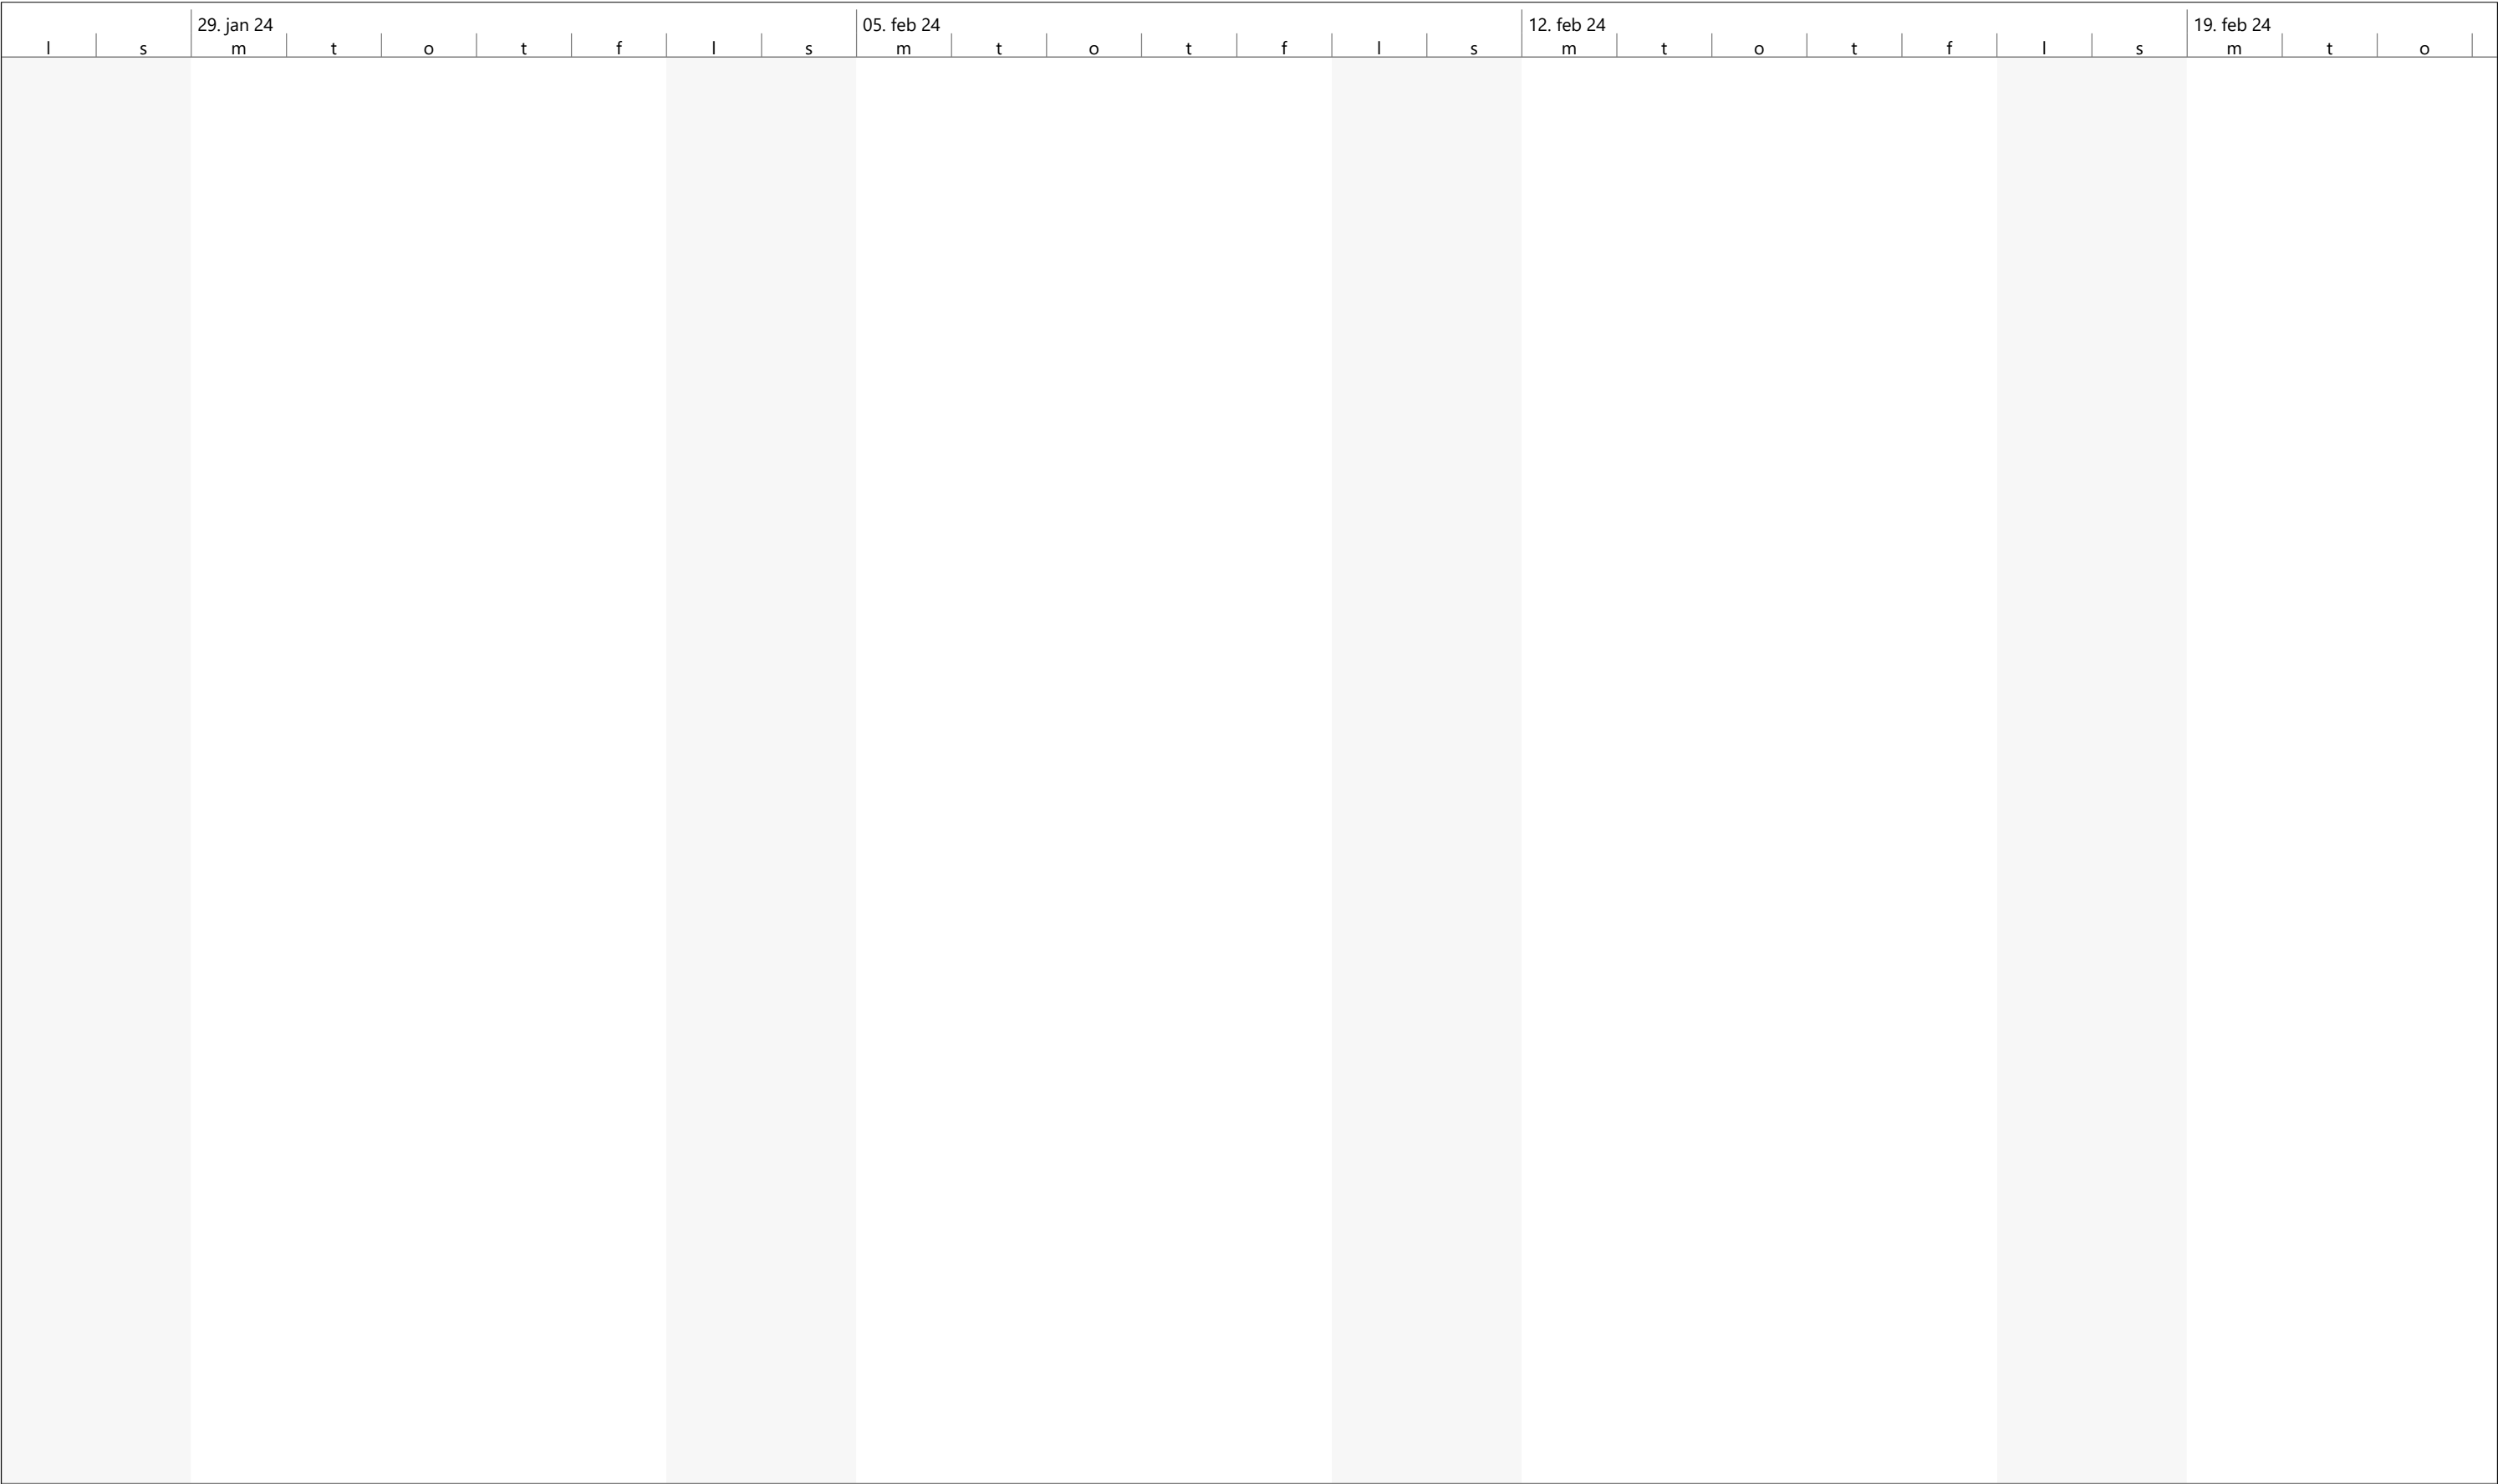













Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			






Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

l	s	29. jan 24 m	t	o	t	f	l	s	05. feb 24 m	t	o	t	f	l	s	12. feb 24 m	t	o	t	f	l	s	19. feb 24 m	t	o




Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

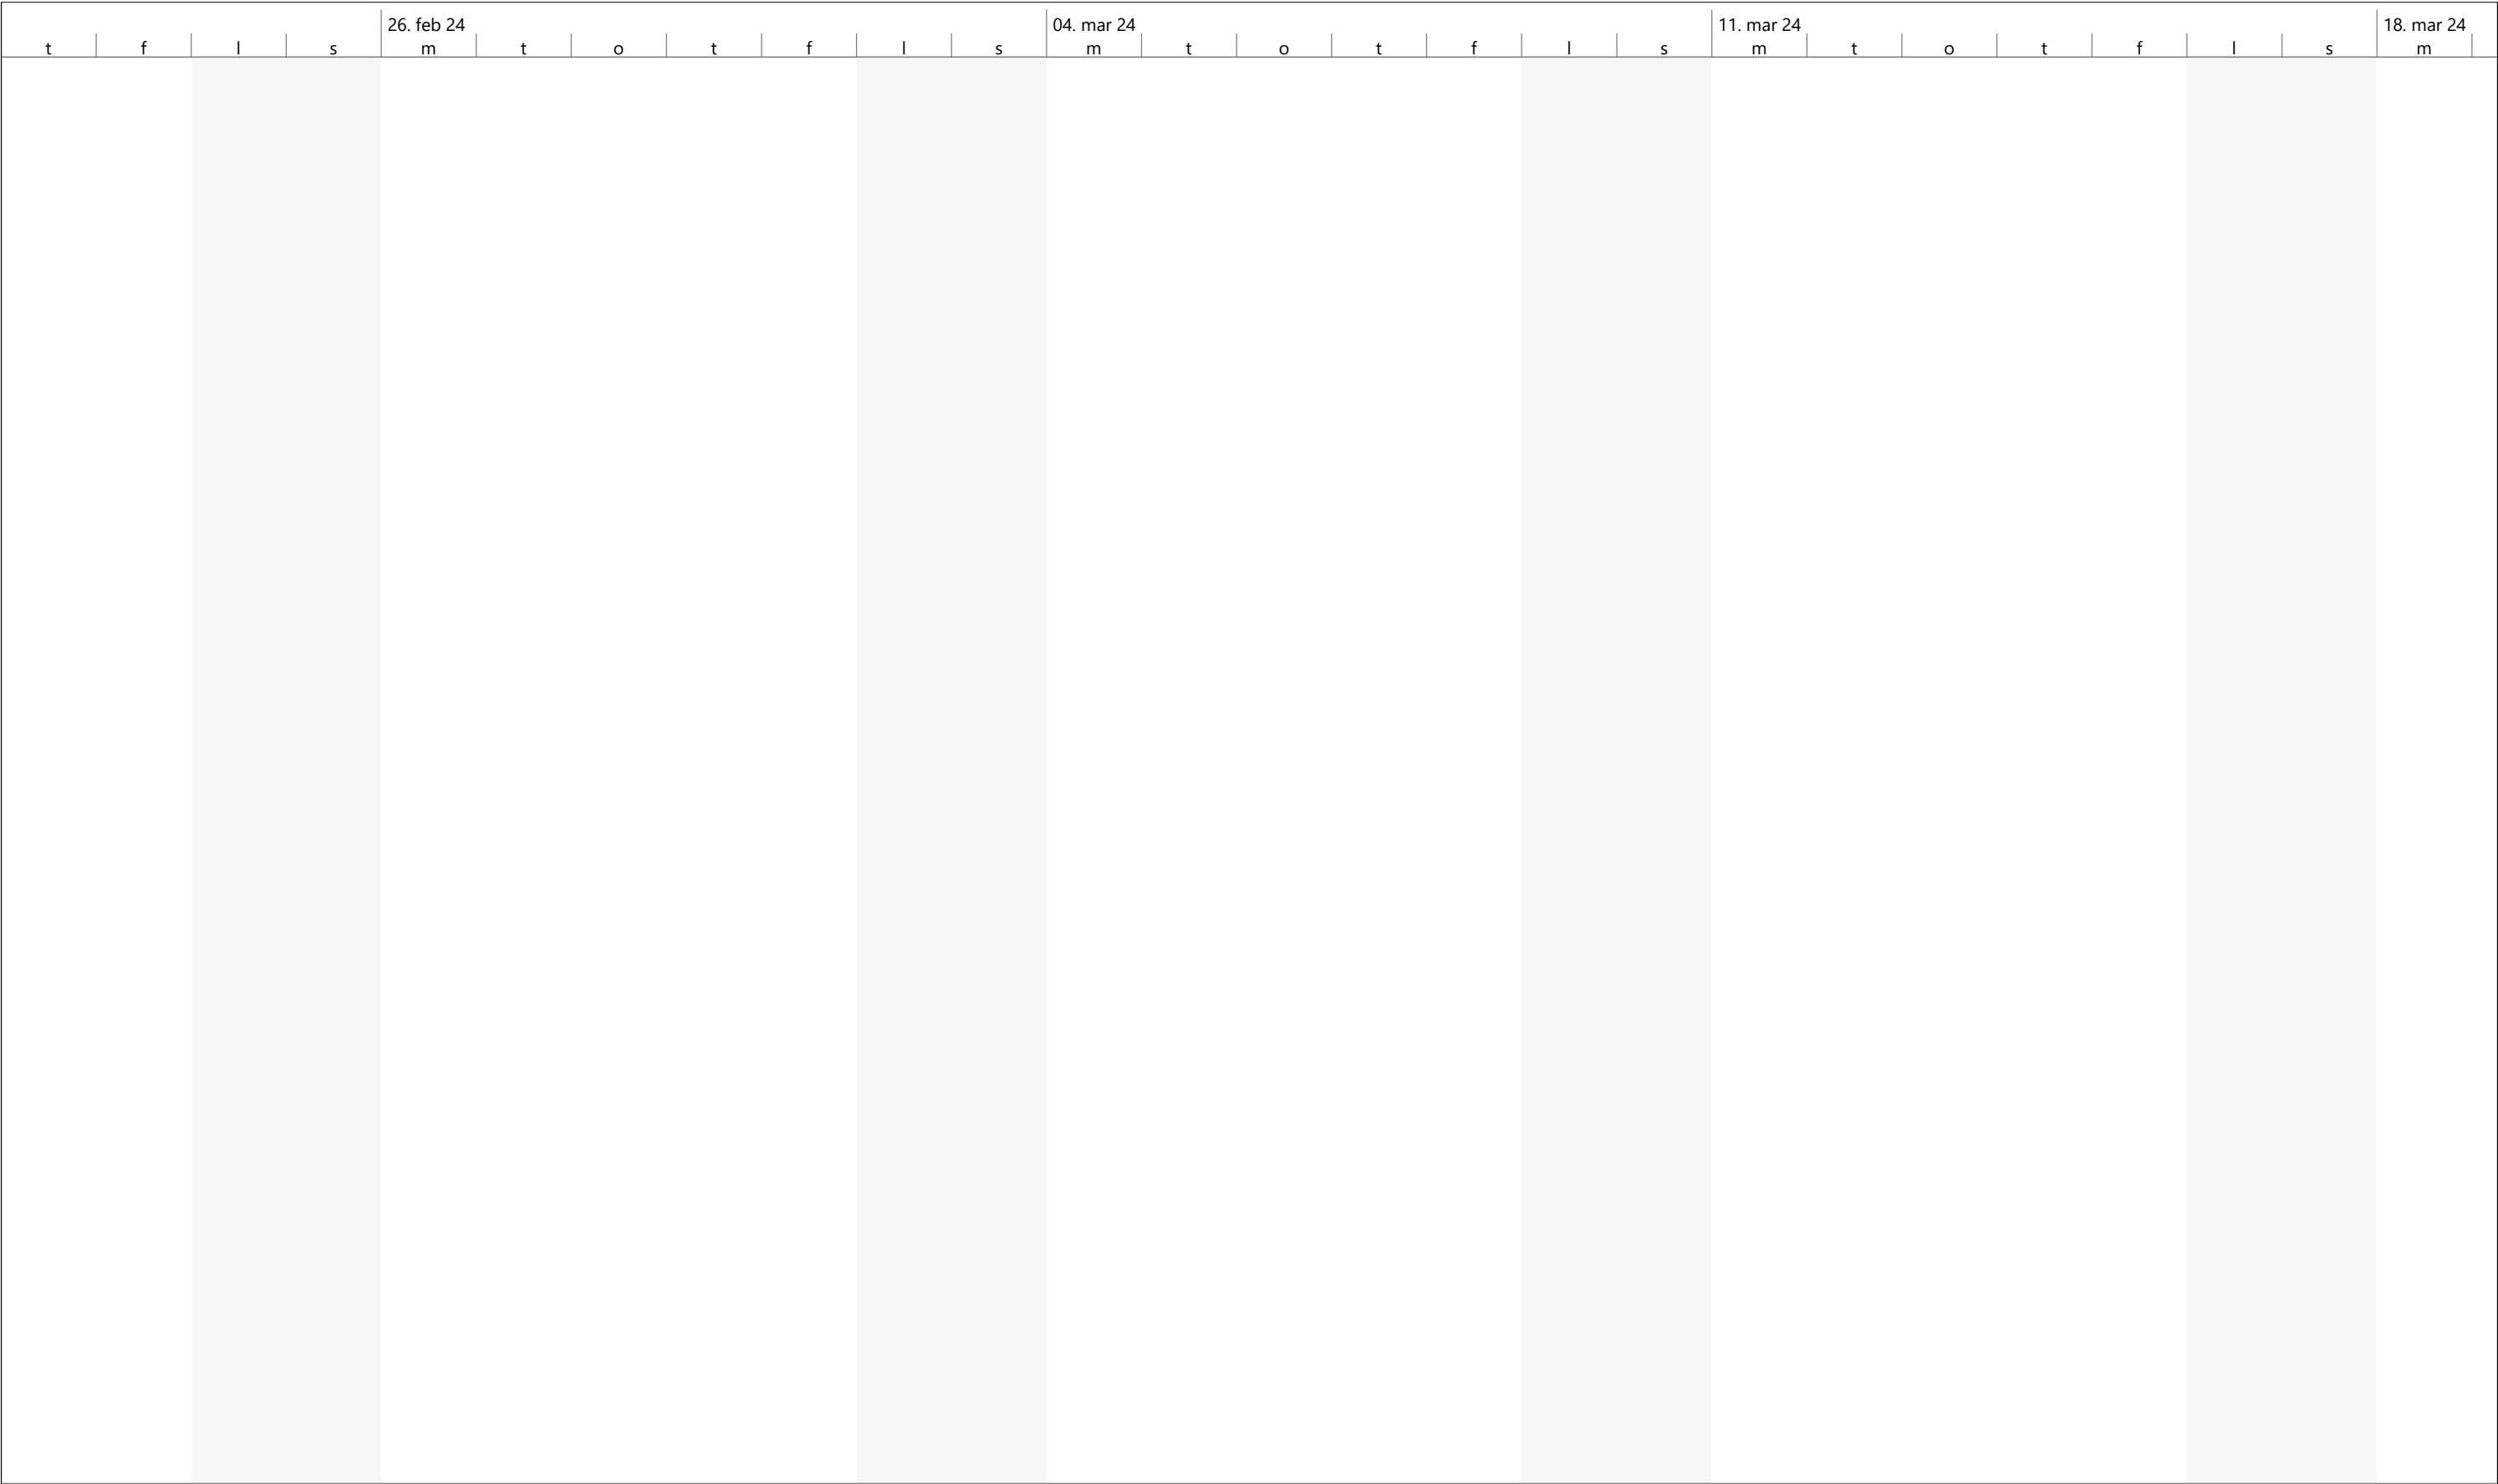

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



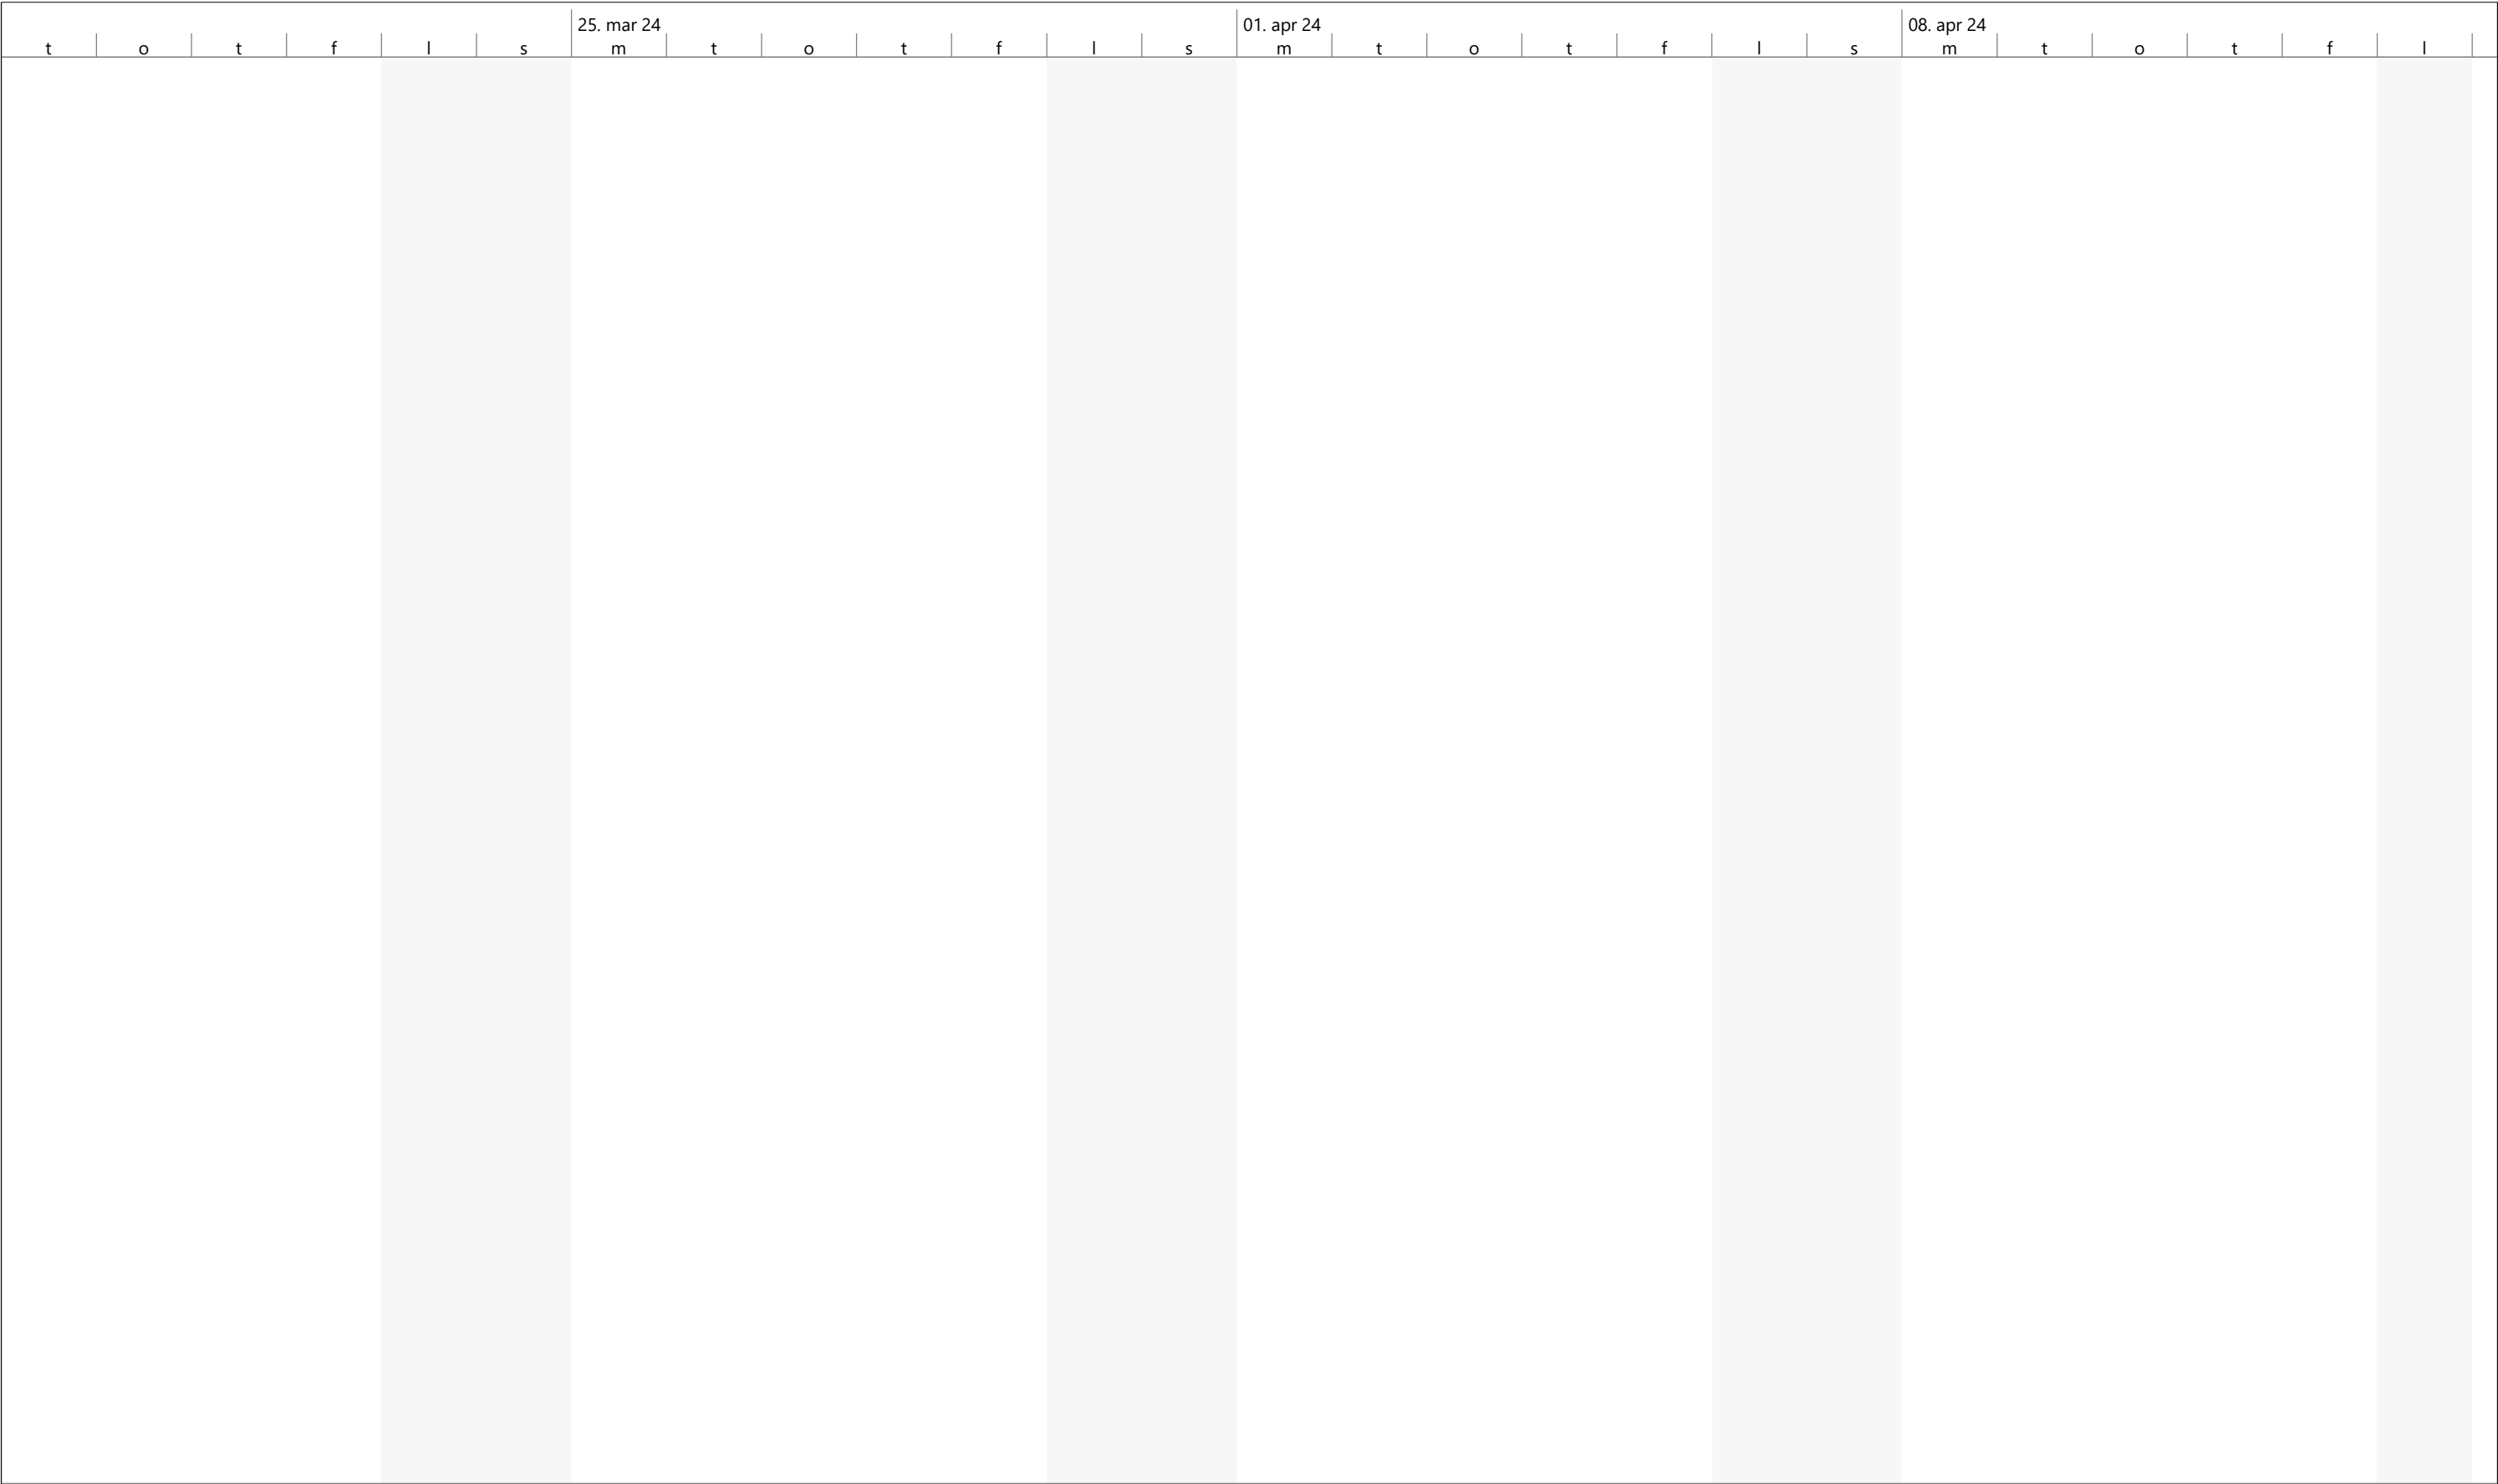

Dato: ti 26-05-26	Opgave	<div></div>	Projektoversigt	<div></div>	Manuel opgave	<div></div>	kun start	<div></div>	Deadline	<div></div>
	Opdeling	<div></div>	Inaktiv opgave	<div></div>	Kun varighed	<div></div>	Kun slutdato	<div></div>	Fremdrift	<div></div>
	Milepæl	<div></div>	Inaktiv milepæl	<div></div>	Manuel oversigtsopløftning	<div></div>	Eksterne opgaver	<div></div>	Manuel status	<div></div>
	Hovedopgave	<div></div>	Inaktiv oversigt	<div></div>	Manuel oversigt	<div></div>	Ekstern milepæl	<div></div>		<div></div>





s

15. apr 24

m

t

o

t

f

l

s

22. apr 24

m

t

o

t

f

l

s

29. apr 24

m

t

o

t

f

l

s

06. maj 24

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl


Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 57



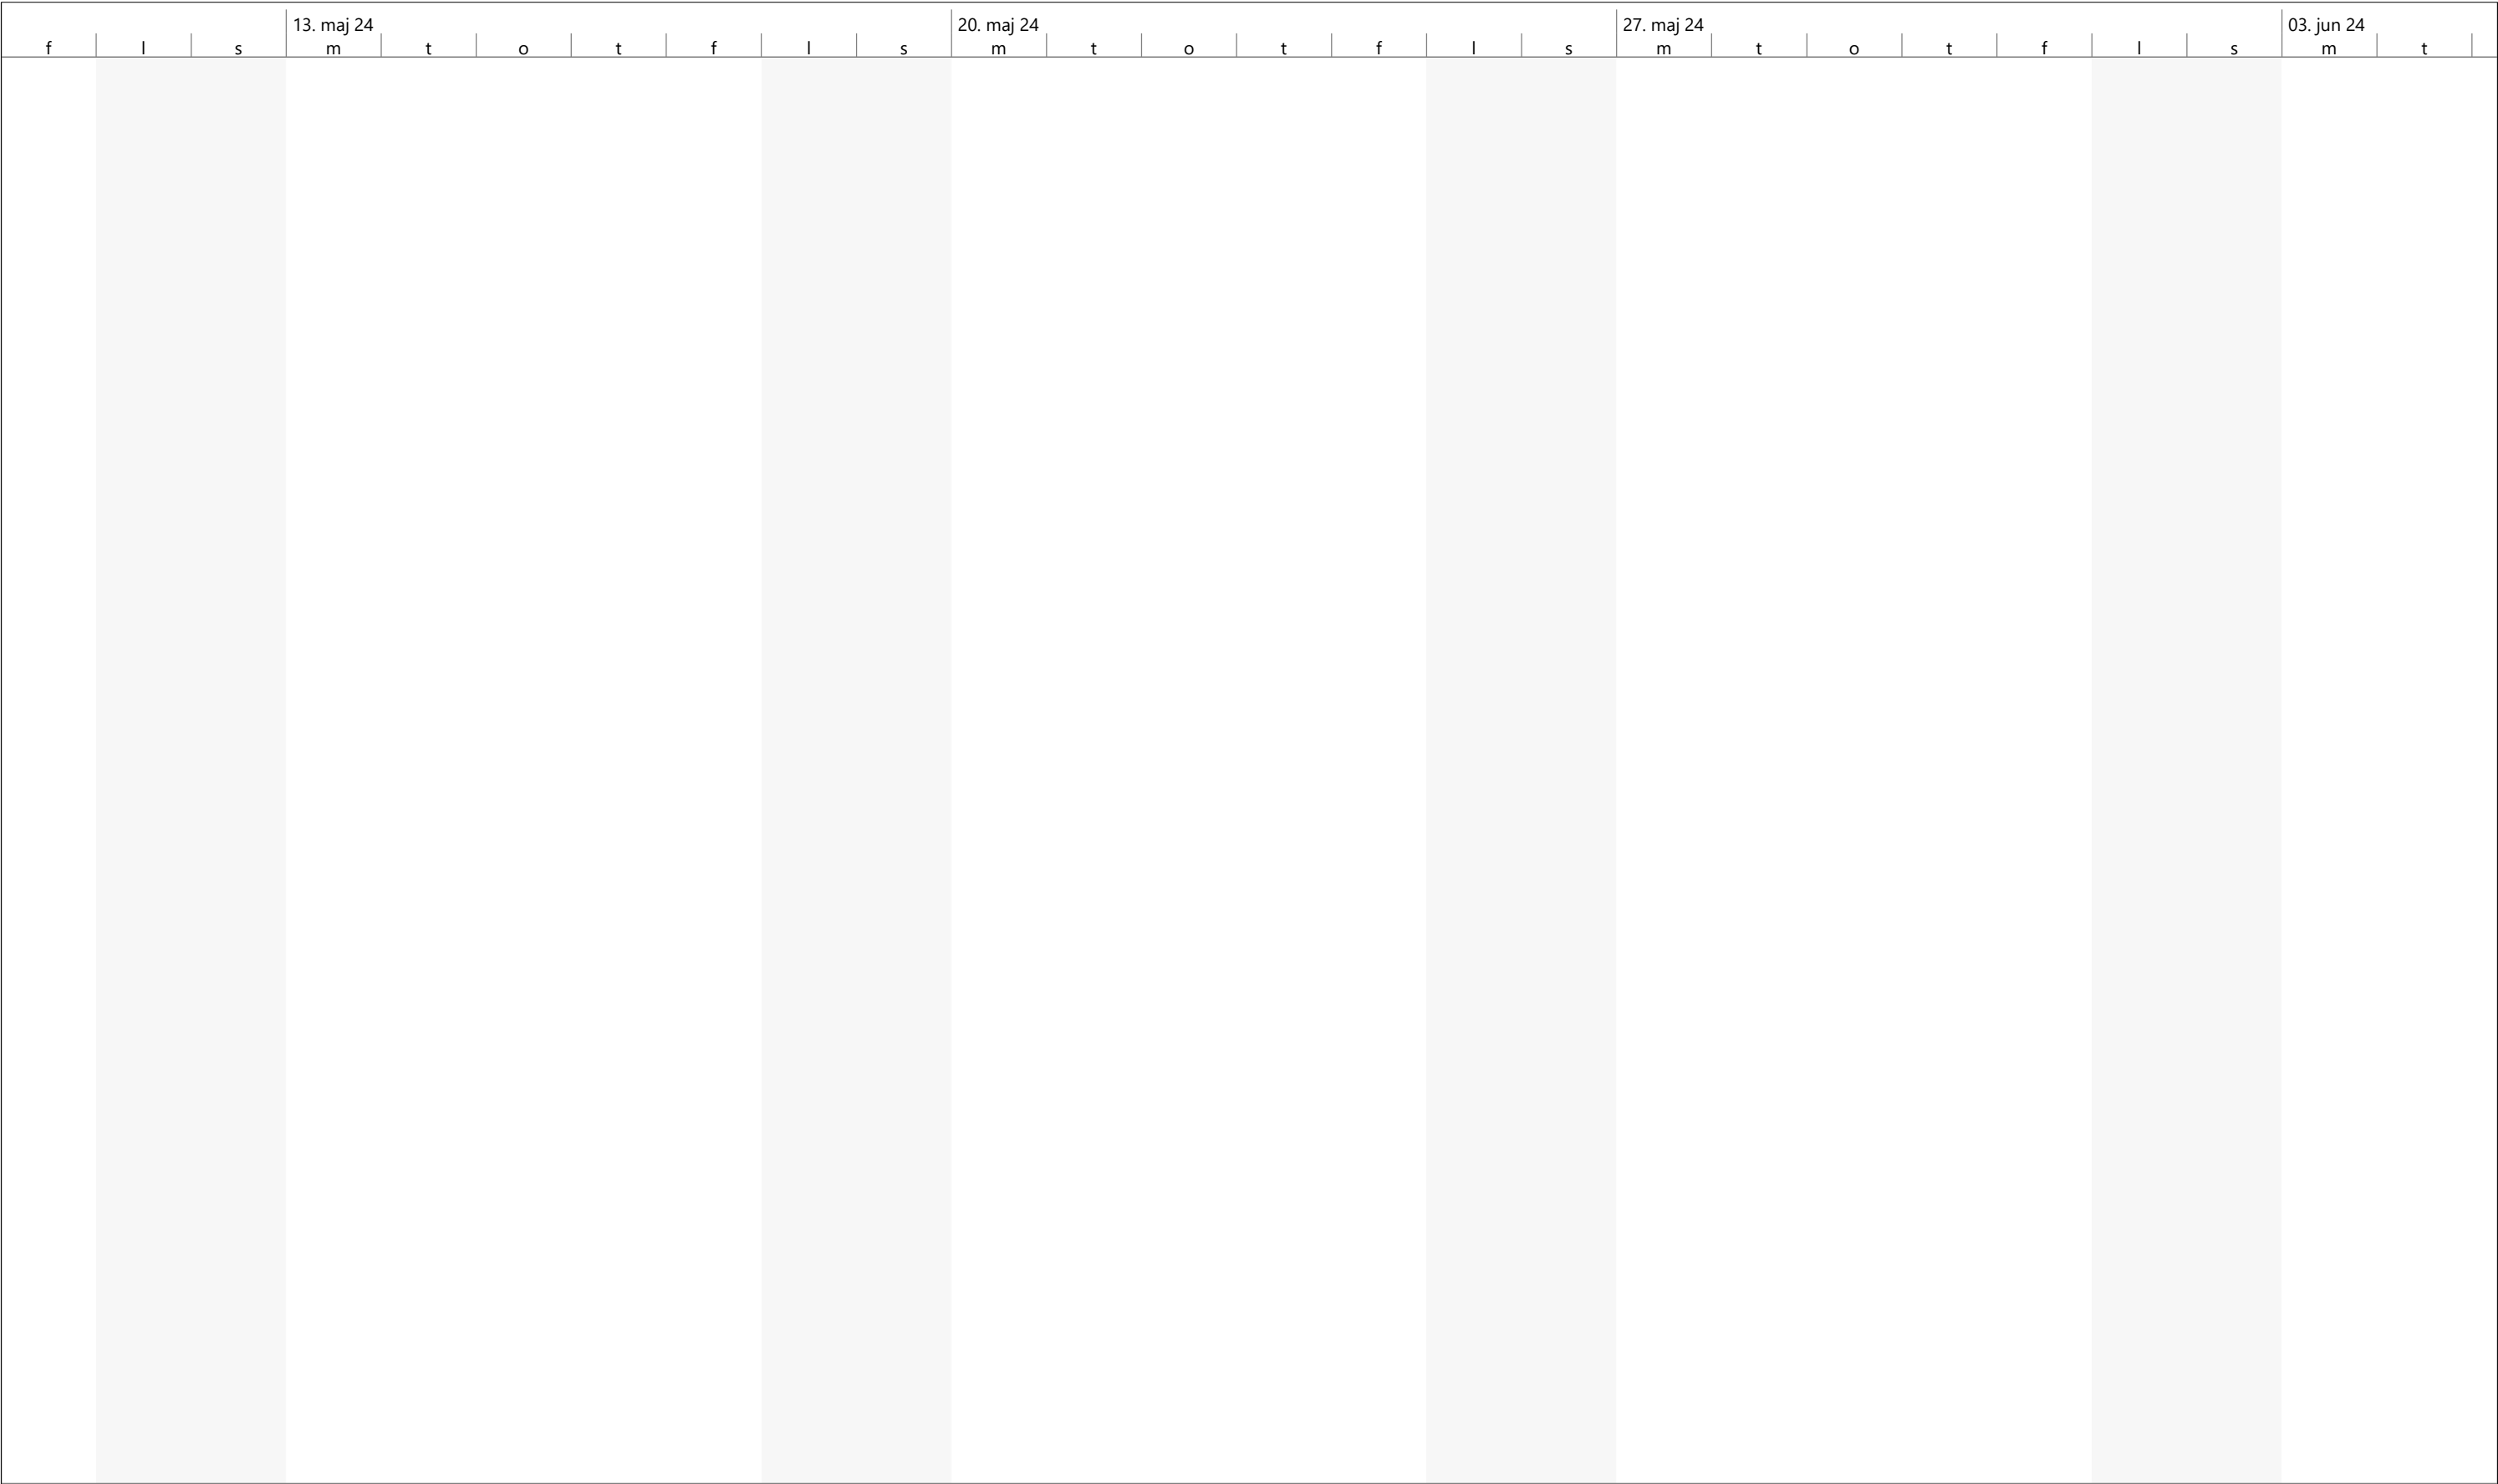




















Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



o	t	f	l	s	10. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	17. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	24. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	01

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

o	t	f	l	s	10. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	17. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	24. jun 24 m	t	o	t	f	l	s	01



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

01. jul 24

m

t

o

t

f

l

s

08. jul 24

m

t

o

t

f

l

s

15. jul 24

m

t

o

t

f

l

s

22. jul 24

m

t

o

t

f

l

s

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline




















Fremdrift

Manuel status


Side 63

01. jul 24	m	t	o	t	f	l	s	08. jul 24	m	t	o	t	f	l	s	15. jul 24	m	t	o	t	f	l	s	22. jul 24	m	t	o	t	f	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			




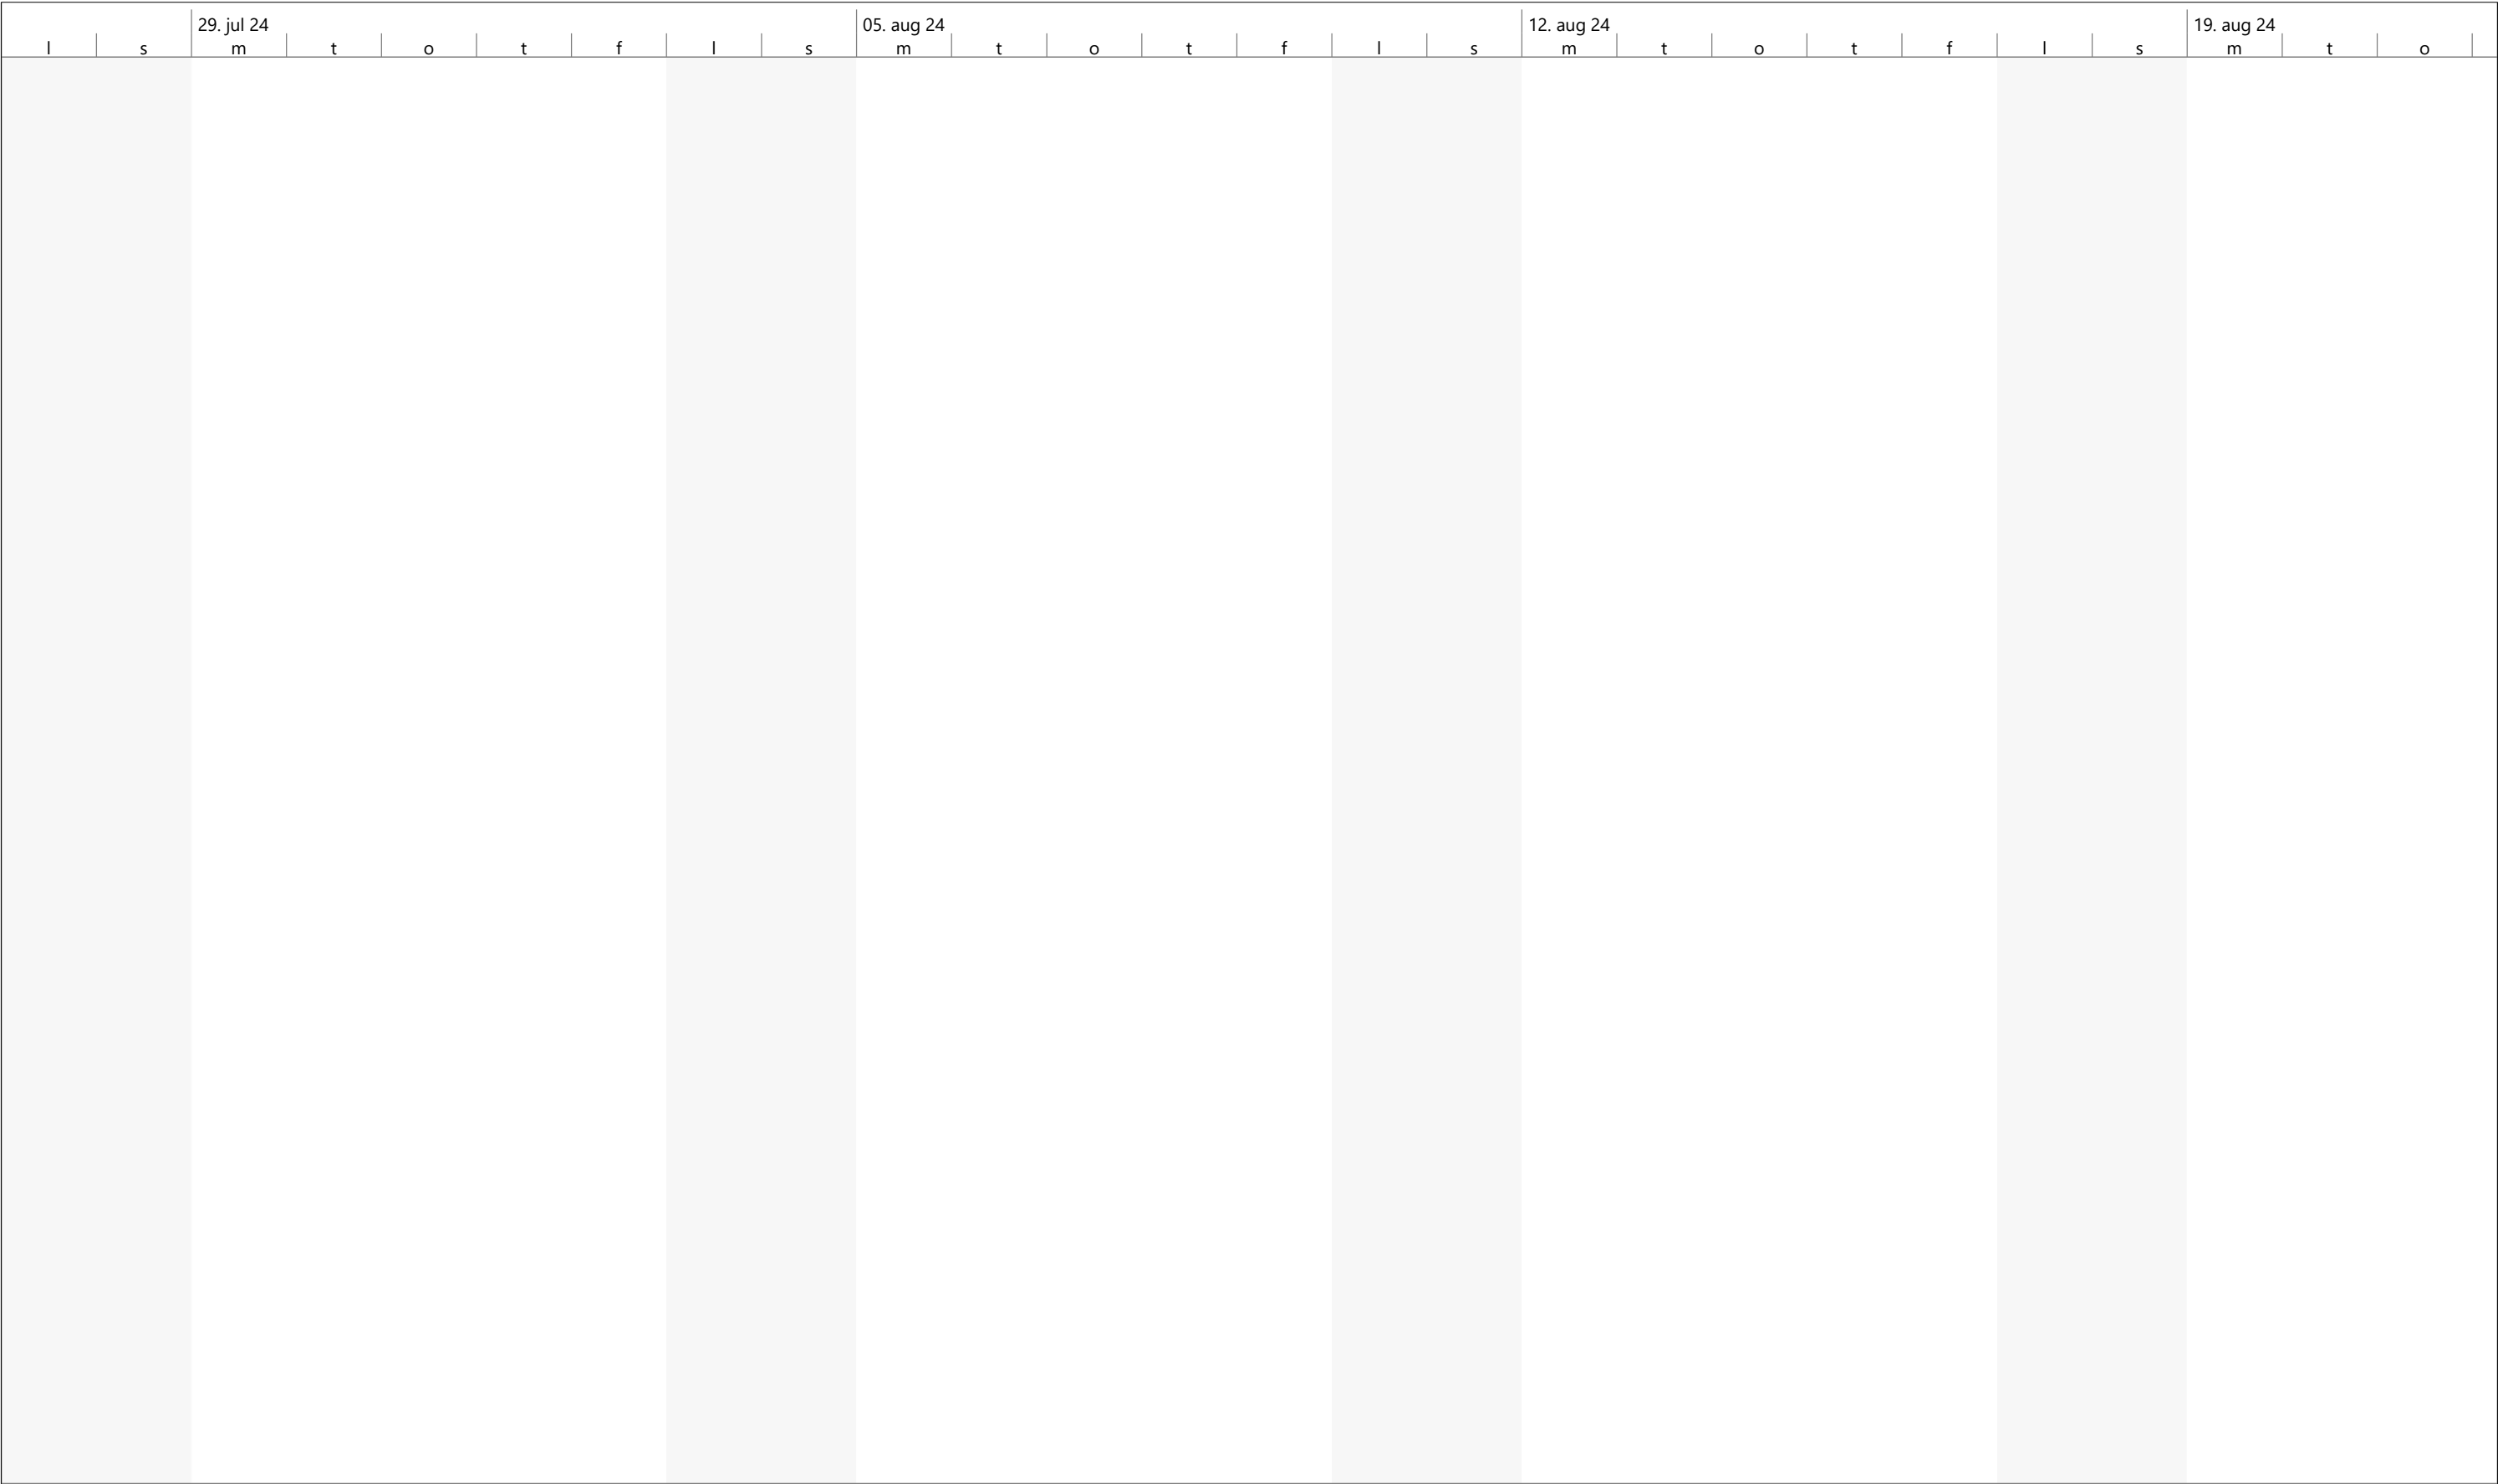

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



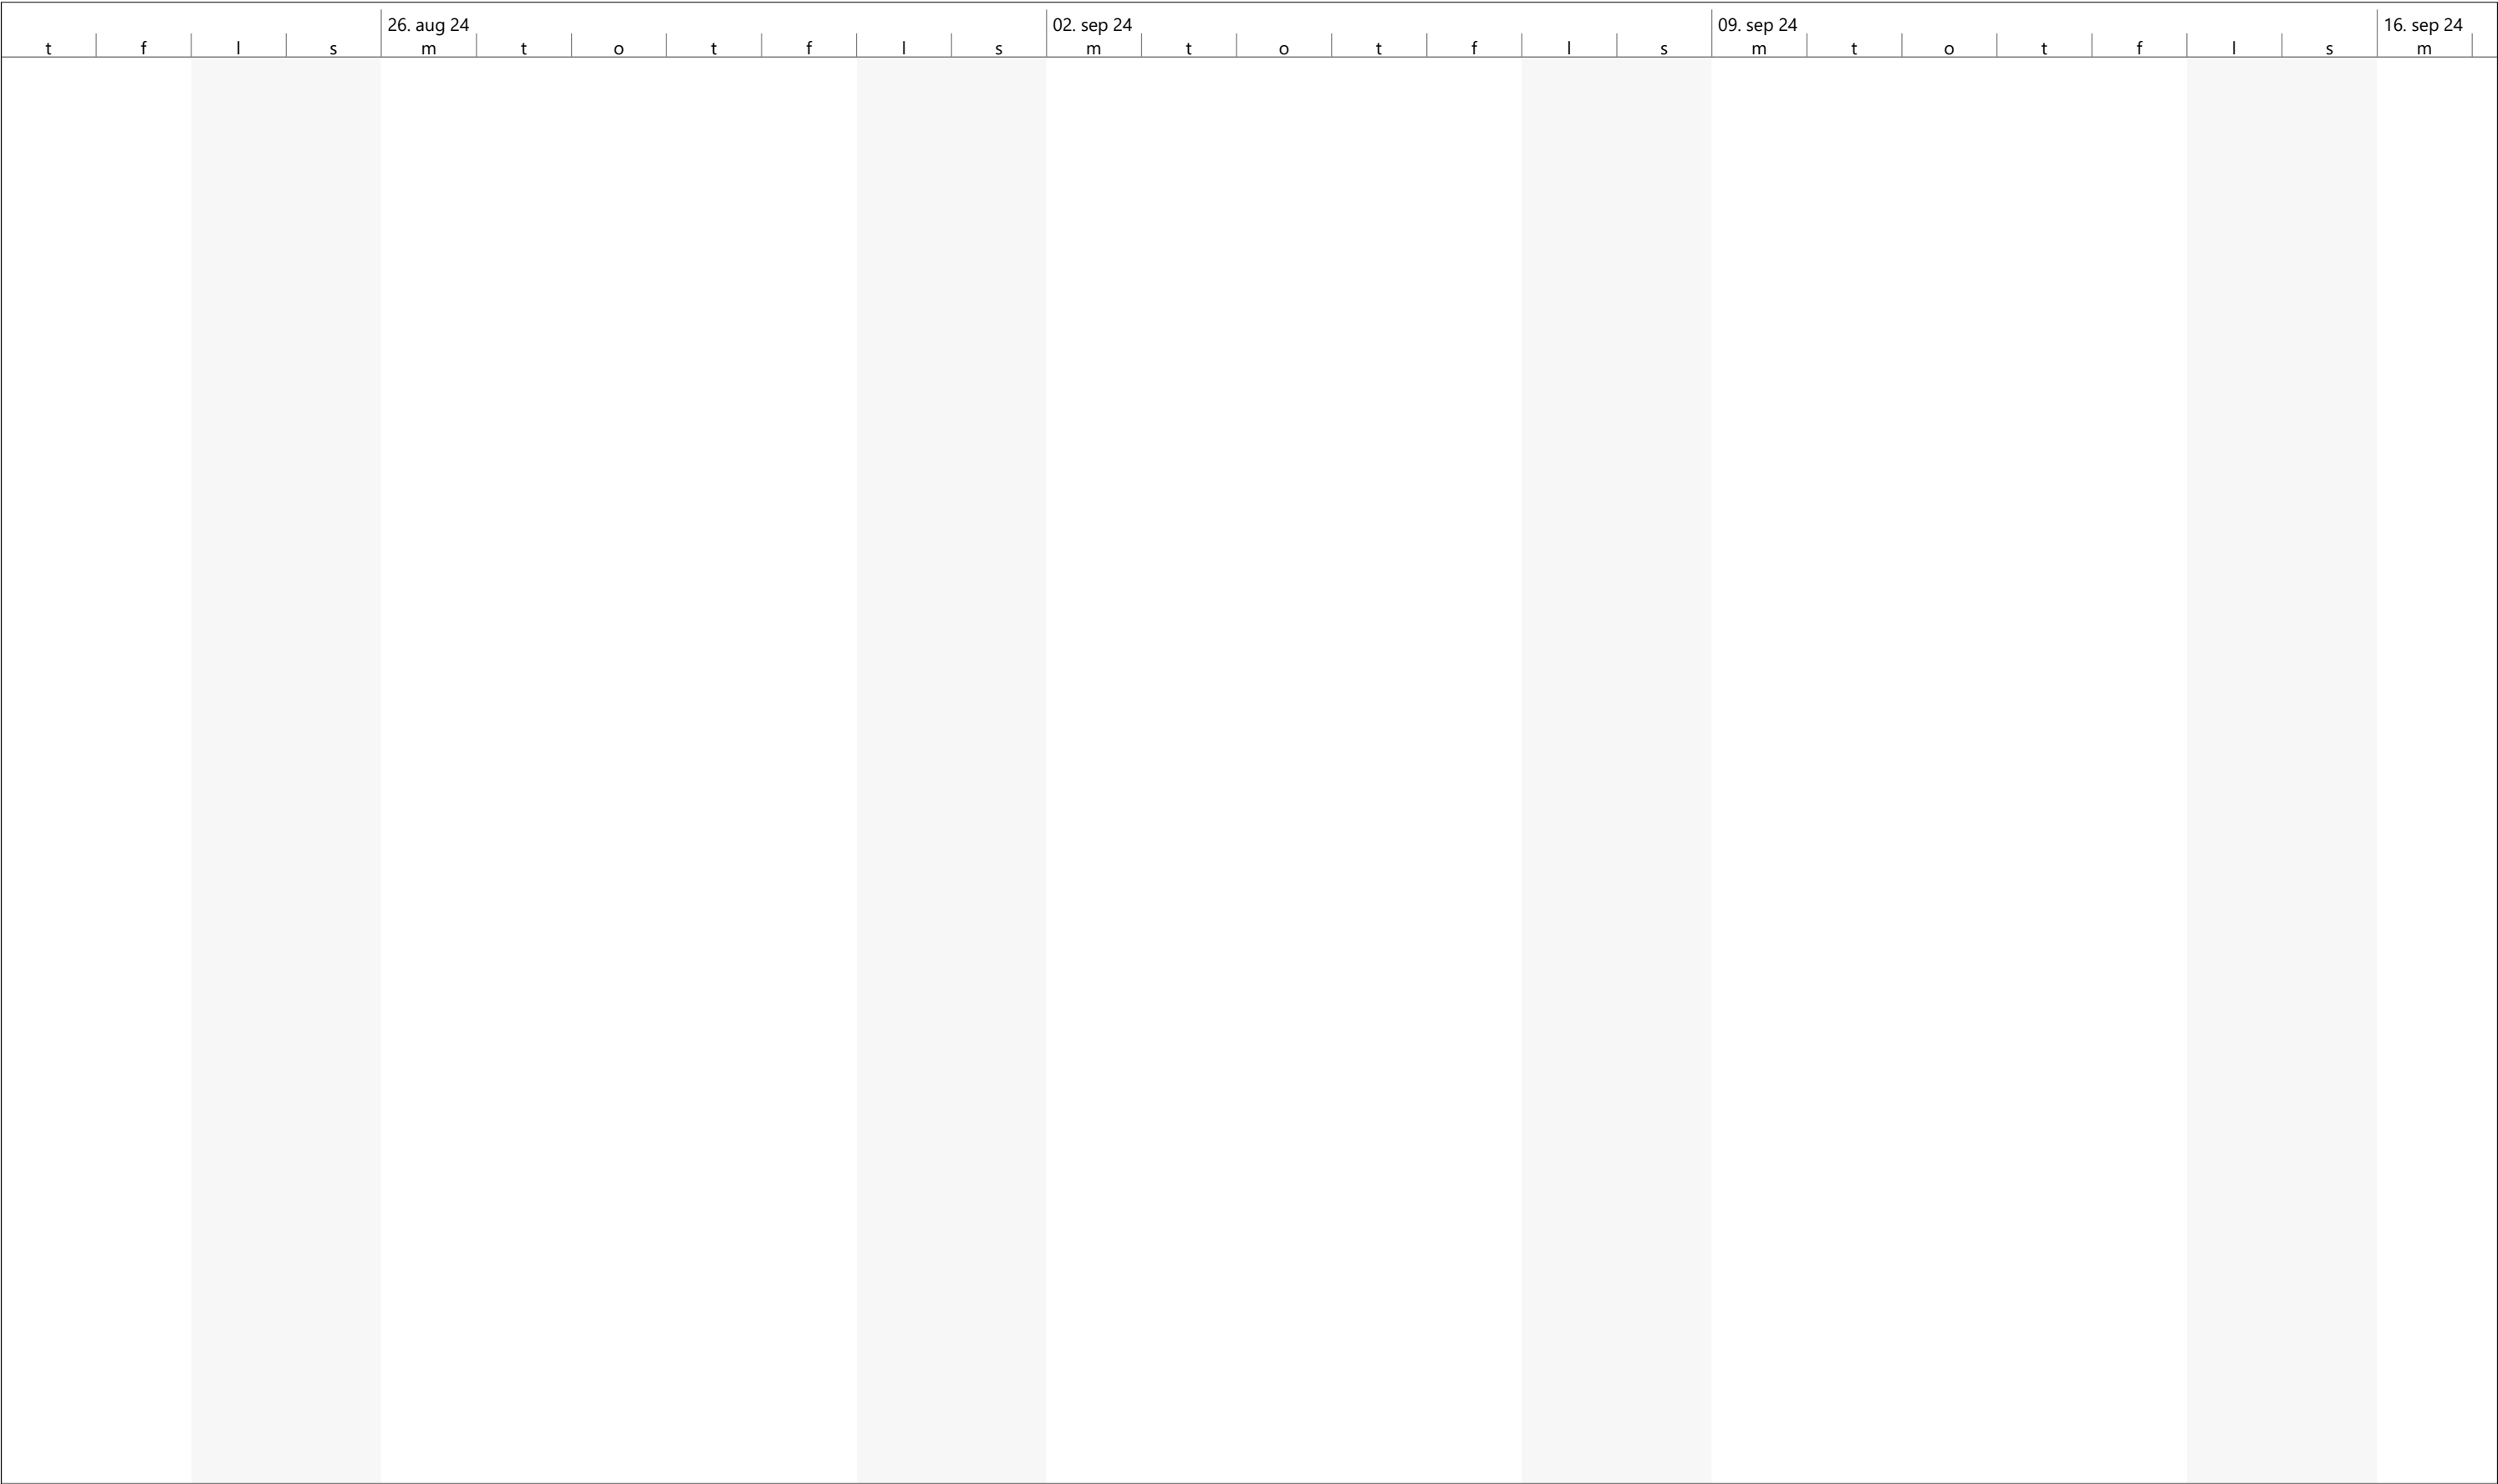


Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

t	f	l	s	26. aug 24	m	t	o	t	f	l	s	02. sep 24	m	t	o	t	f	l	s	09. sep 24	m	t	o	t	f	l	s	16. sep 24	m




Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

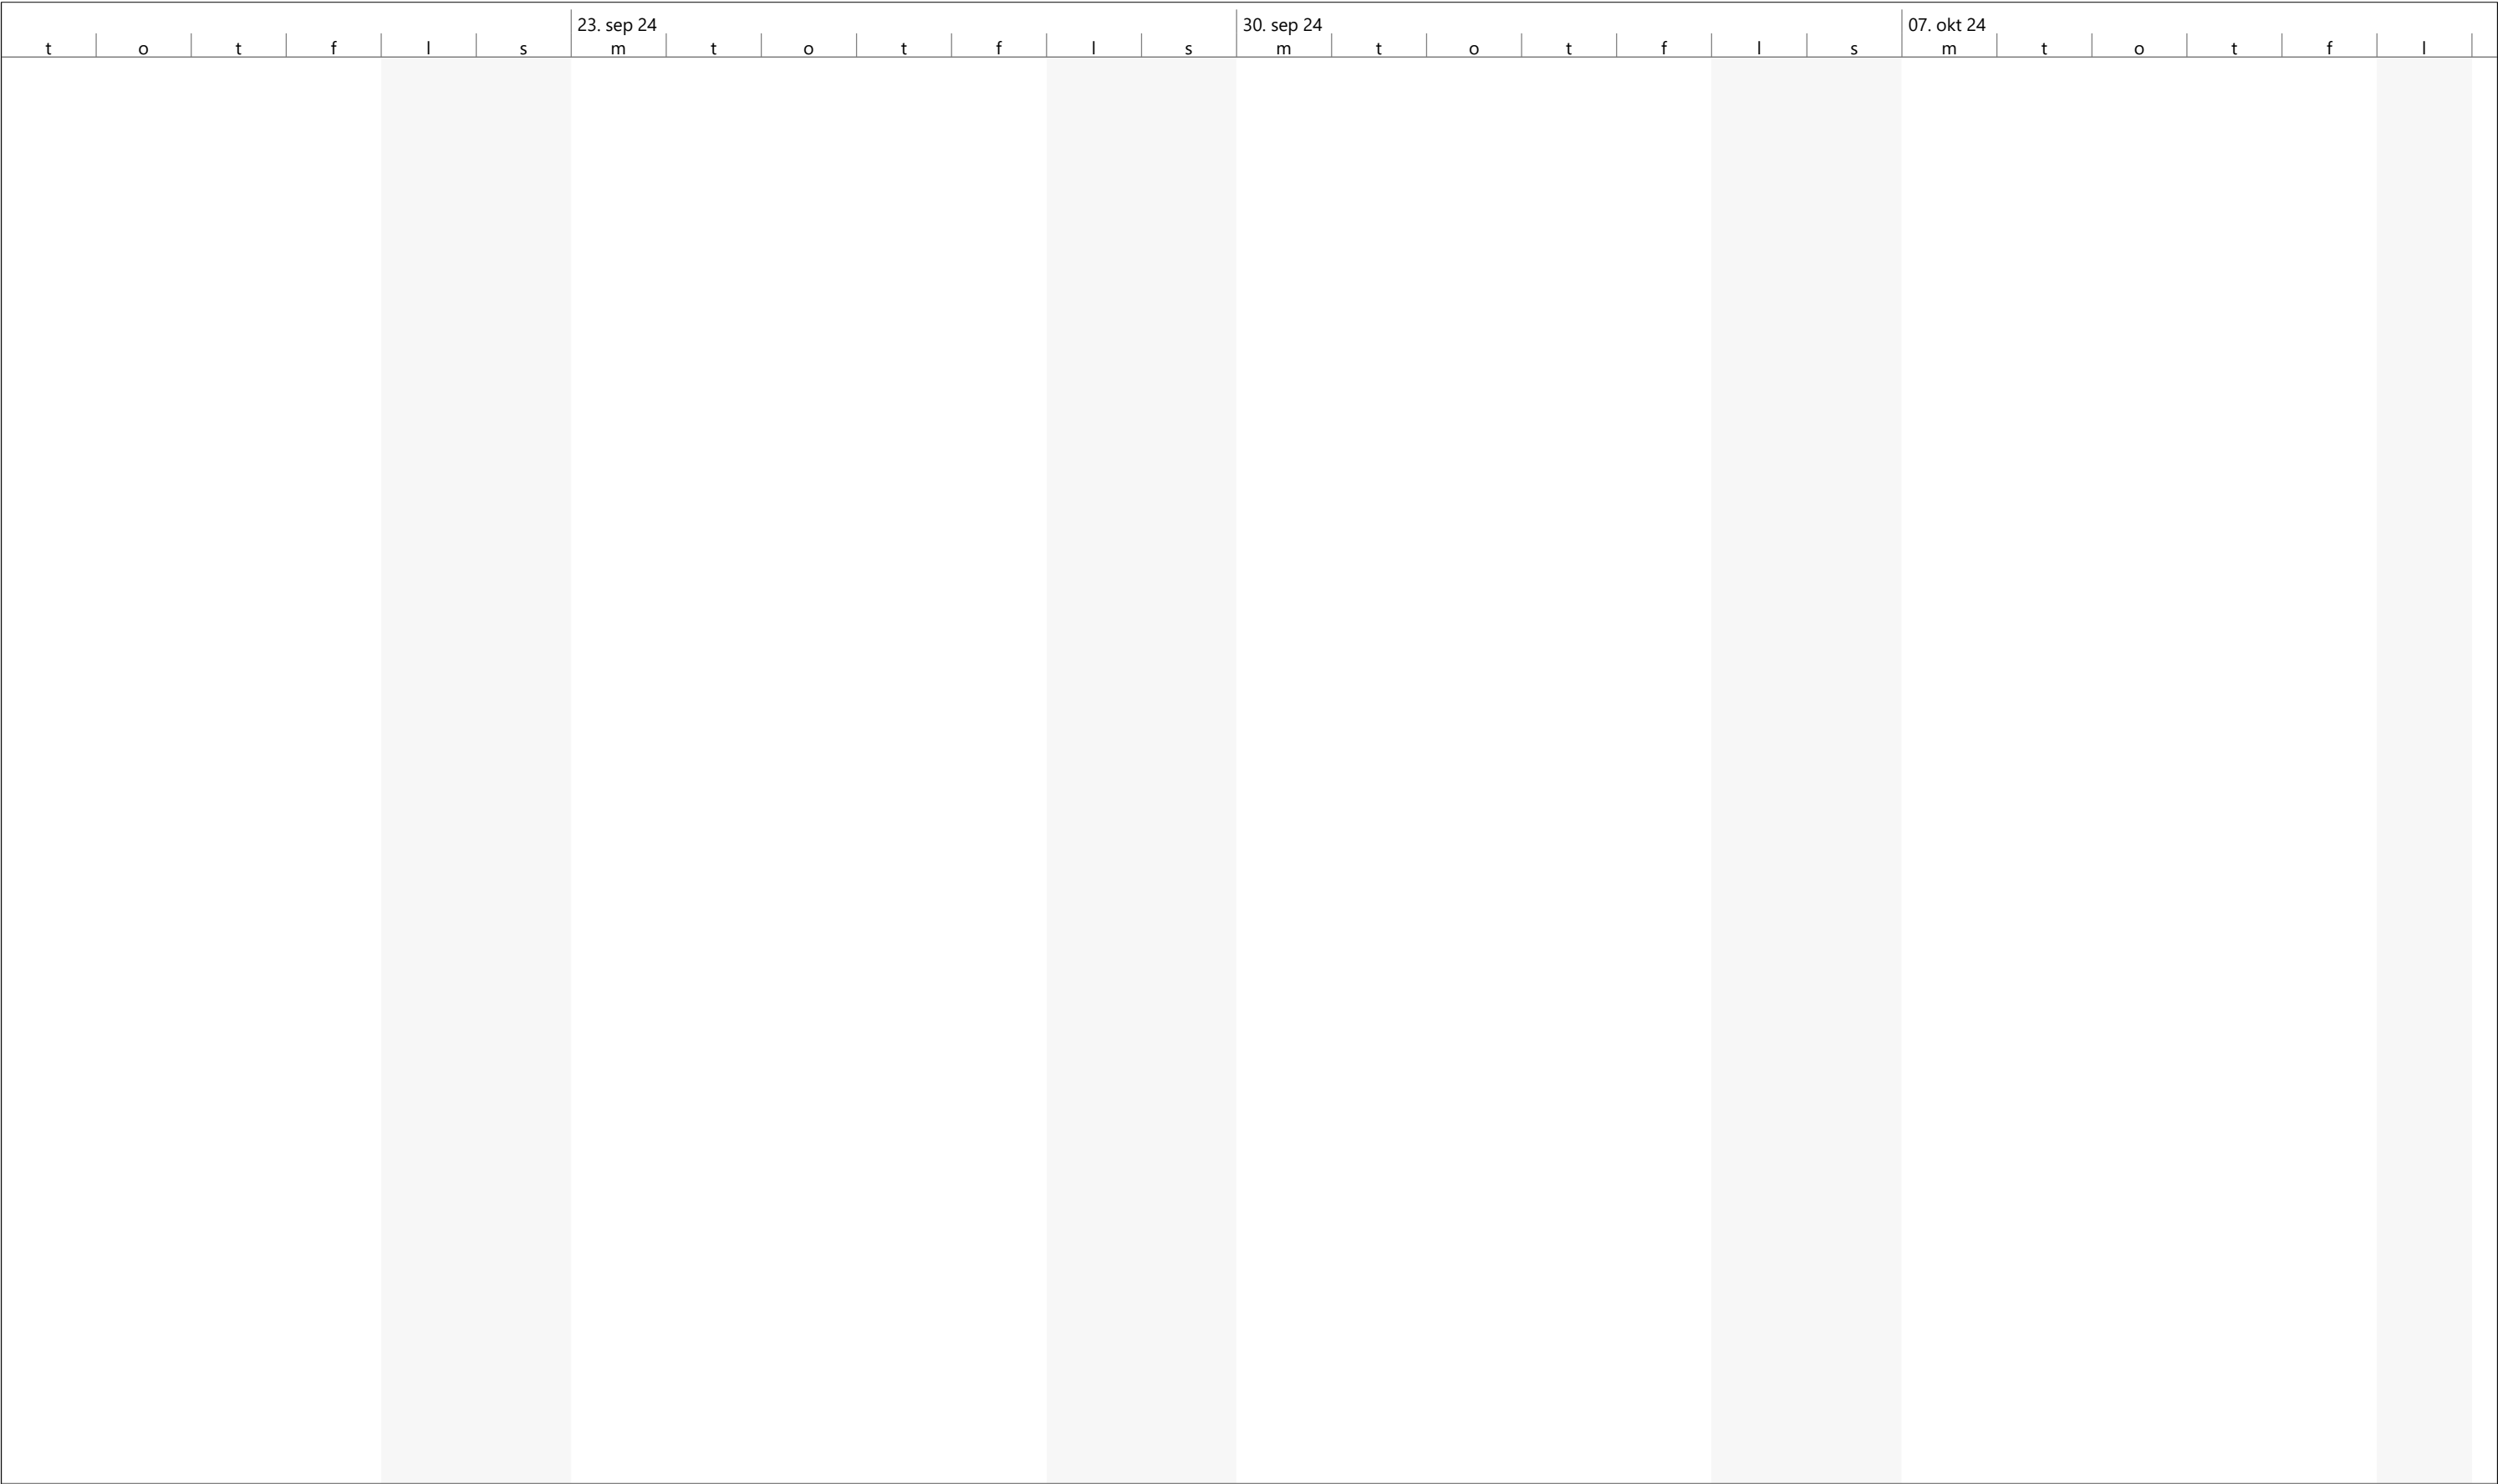

Dato: ti 26-05-26	Opgave	<div></div>	Projektoversigt	<div></div>	Manuel opgave	<div></div>	kun start	<div></div>	Deadline	<div></div>
	Opdeling	<div></div>	Inaktiv opgave	<div></div>	Kun varighed	<div></div>	Kun slutdato	<div></div>	Fremdrift	<div></div>
	Milepæl	<div></div>	Inaktiv milepæl	<div></div>	Manuel oversigtsopløftning	<div></div>	Eksterne opgaver	<div></div>	Manuel status	<div></div>
	Hovedopgave	<div></div>	Inaktiv oversigt	<div></div>	Manuel oversigt	<div></div>	Ekstern milepæl	<div></div>		



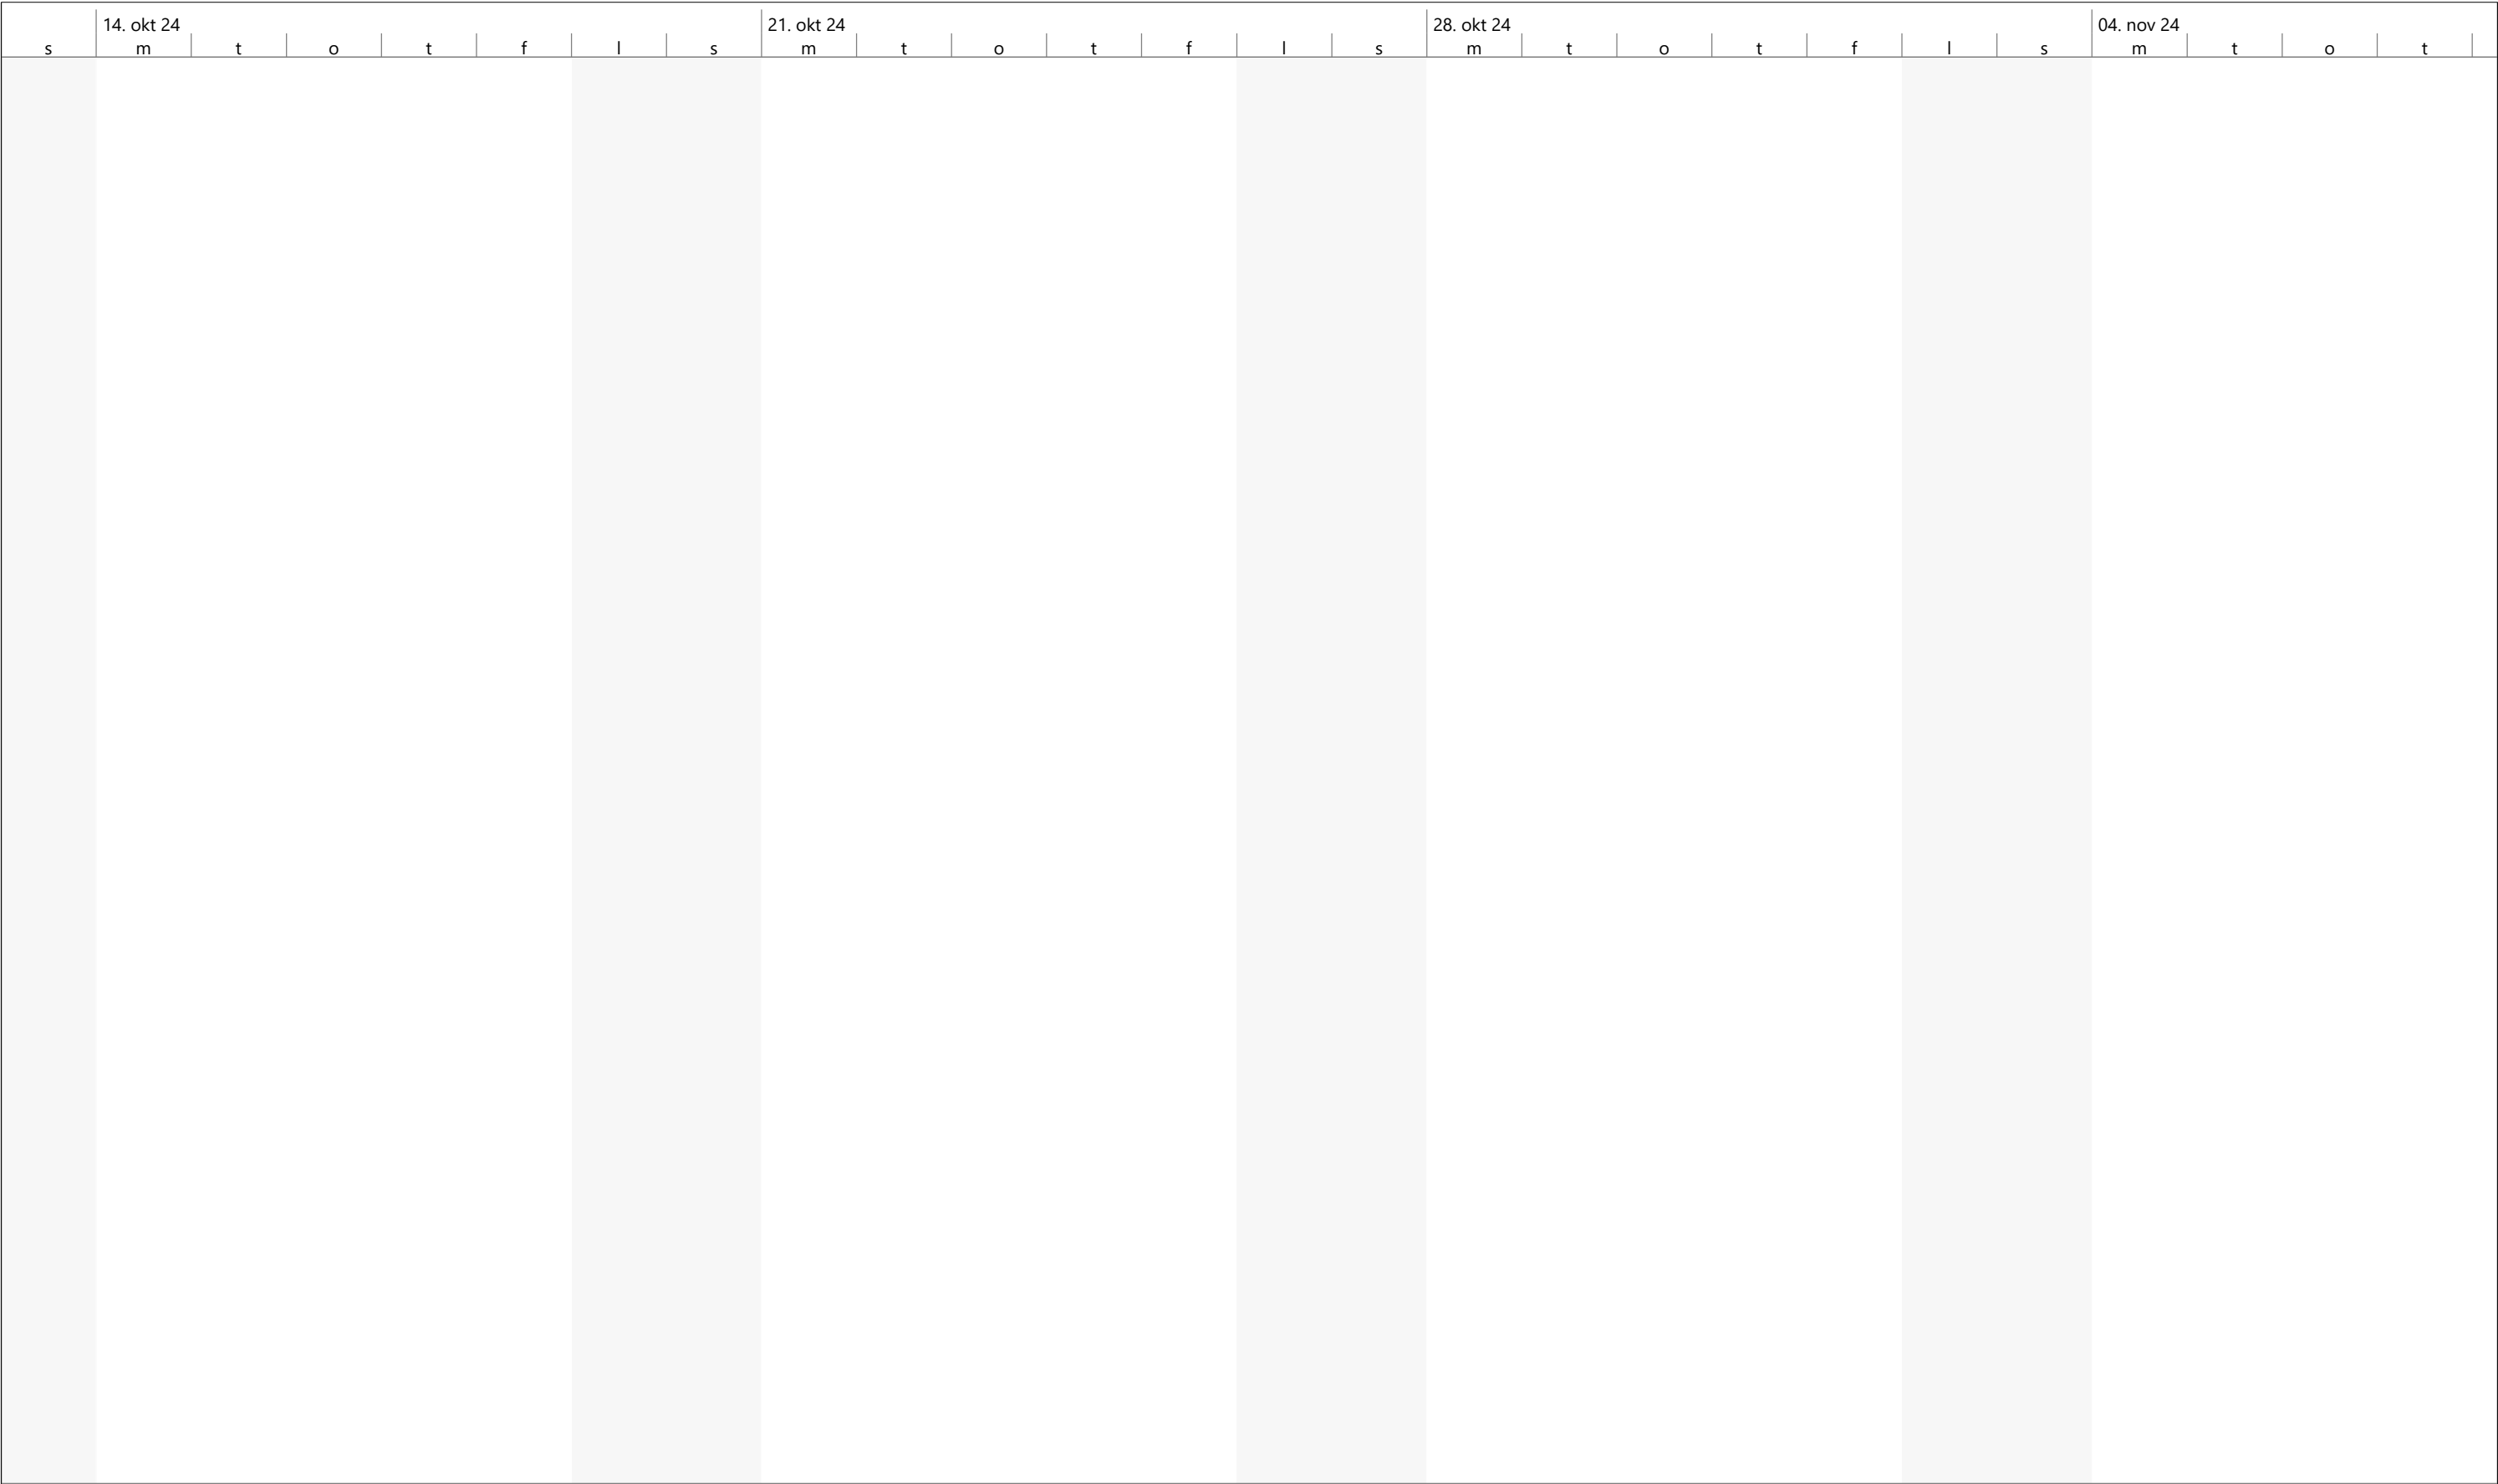

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

s	14. okt 24							21. okt 24							28. okt 24							04. nov 24								
	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



f

l

s

11. nov 24

m

t

o

t

f

l

s

18. nov 24

m

t

o

t

f

l

s

25. nov 24

m

t

o

t

f

l

s

02. dec 24

m

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 73



o

t

f

l

s

09. dec 24

m

t

o

t

f

l

s

16. dec 24

m

t

o

t

f

l

s

23. dec 24

m

t

o

t

f

l

s

30

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl


Deadline

Fremdrift

Manuel status


Side 75




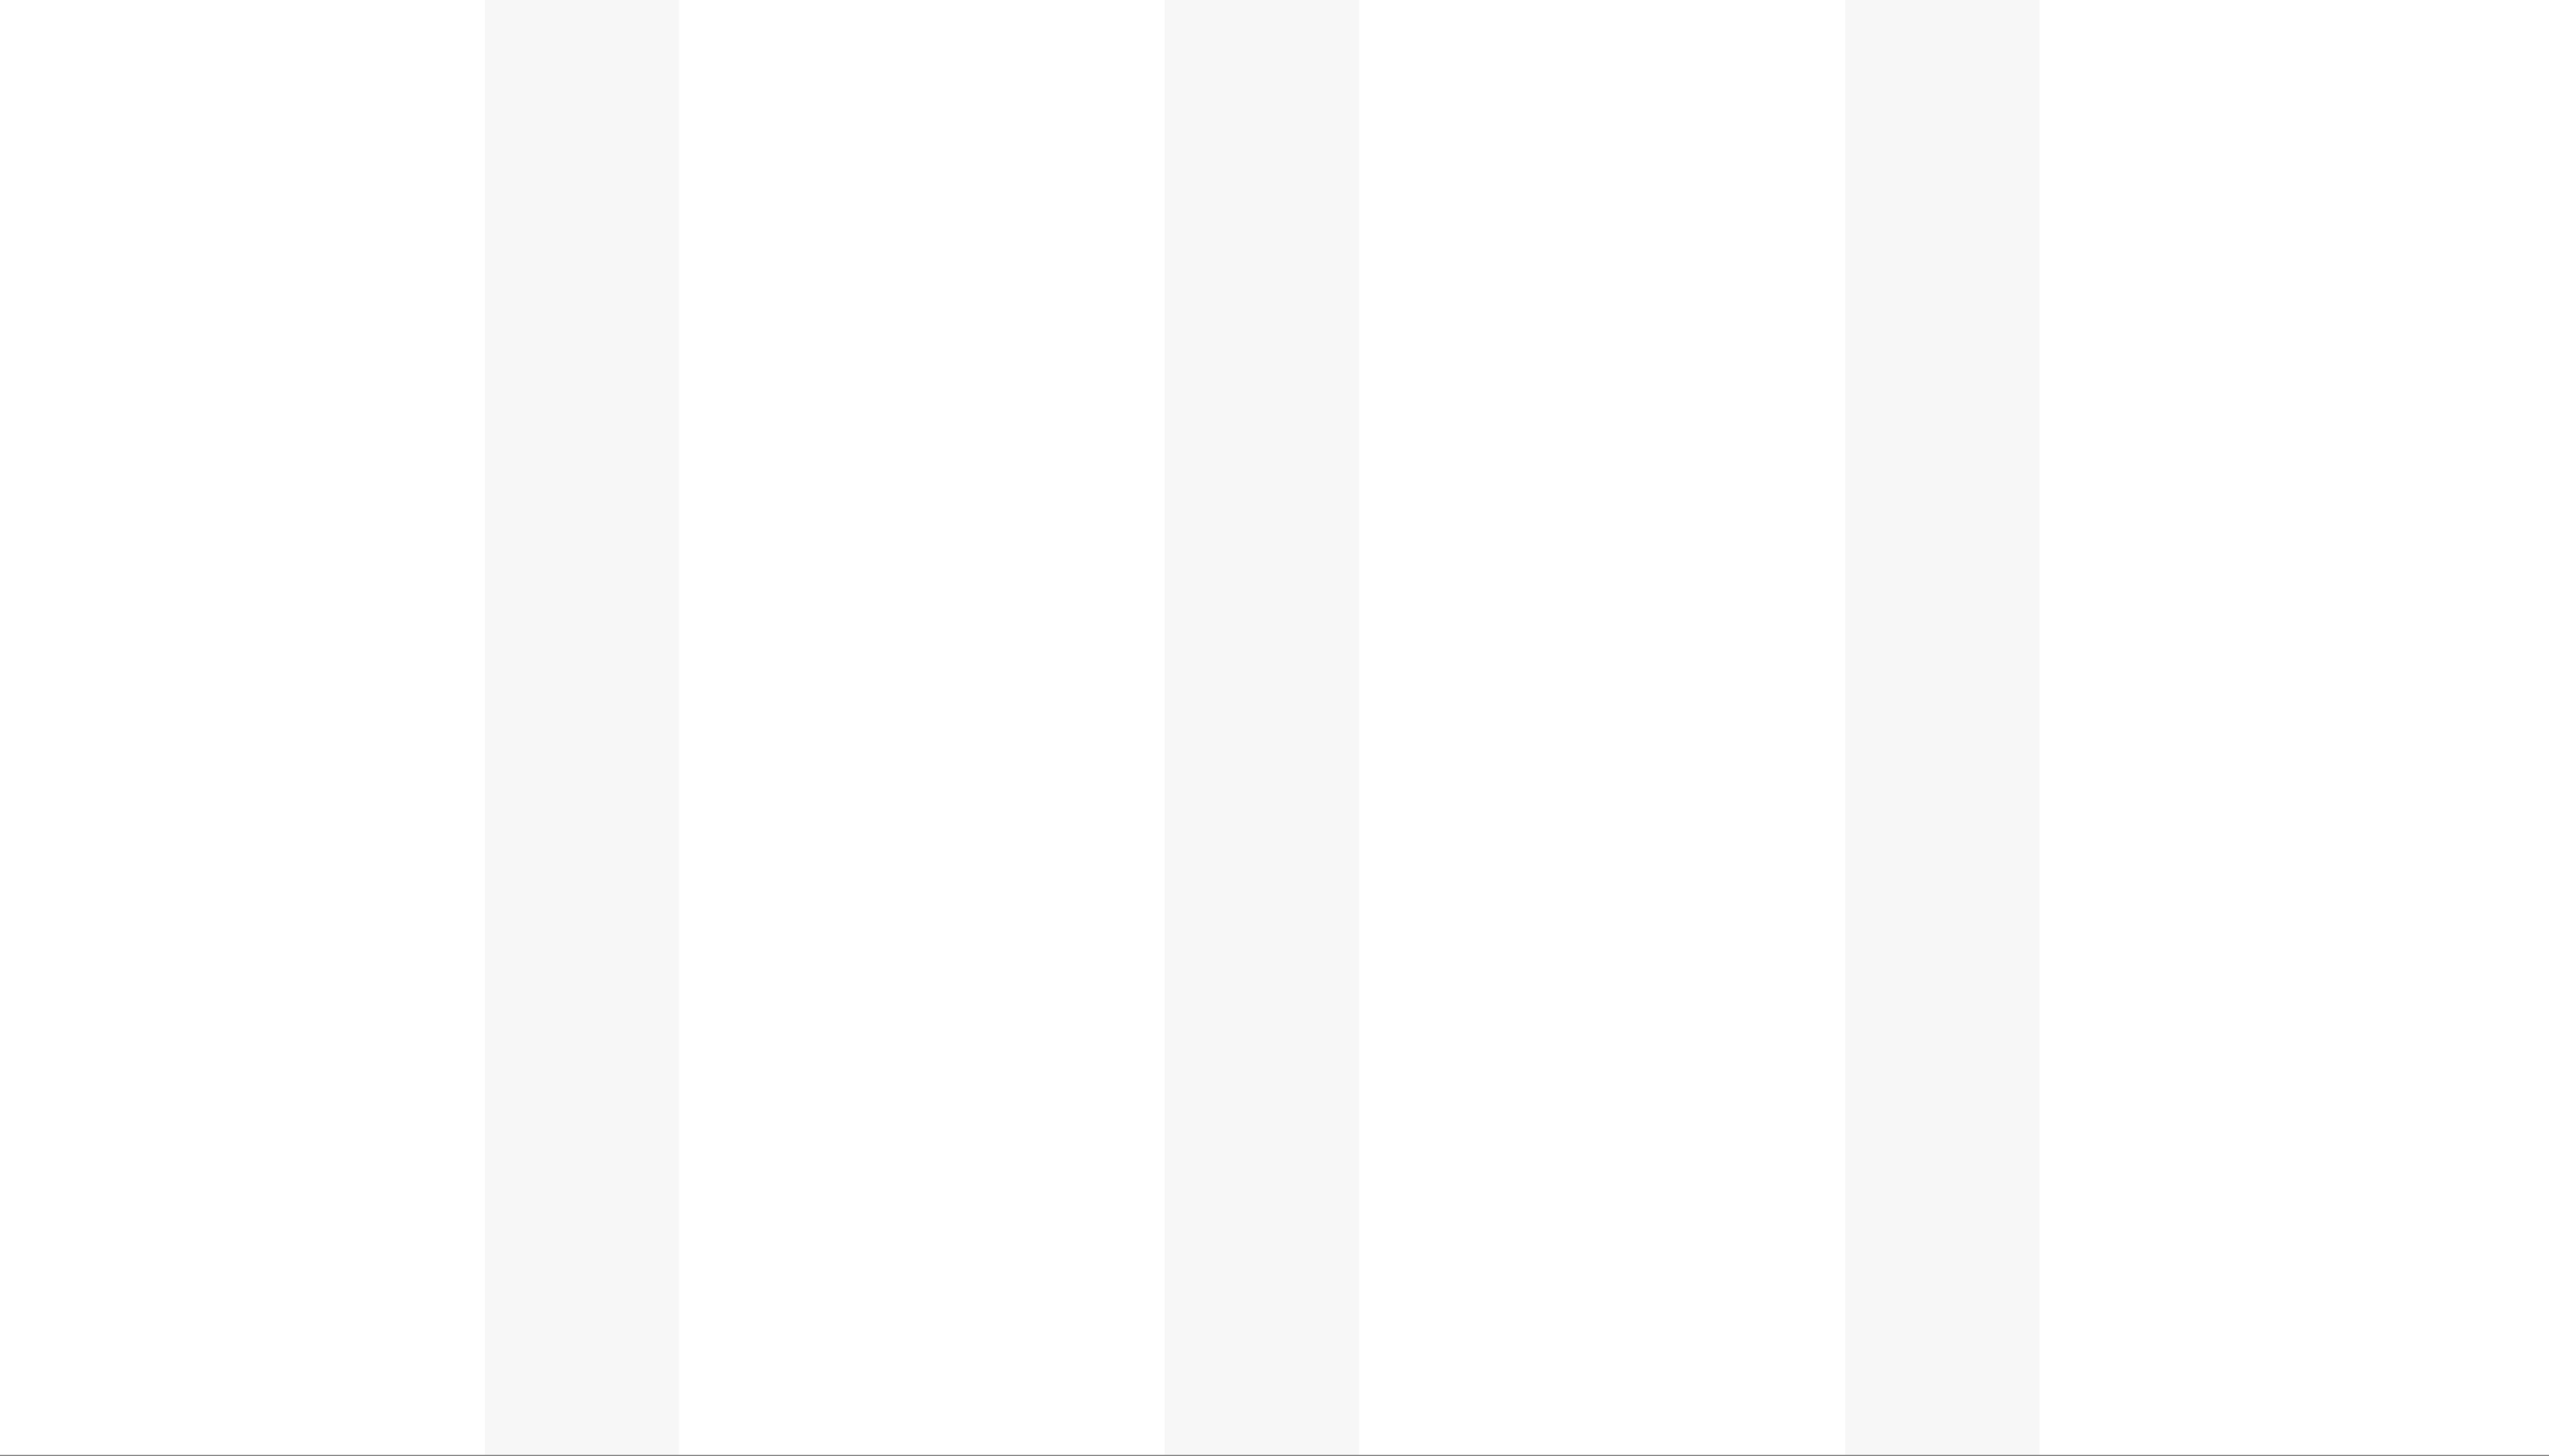





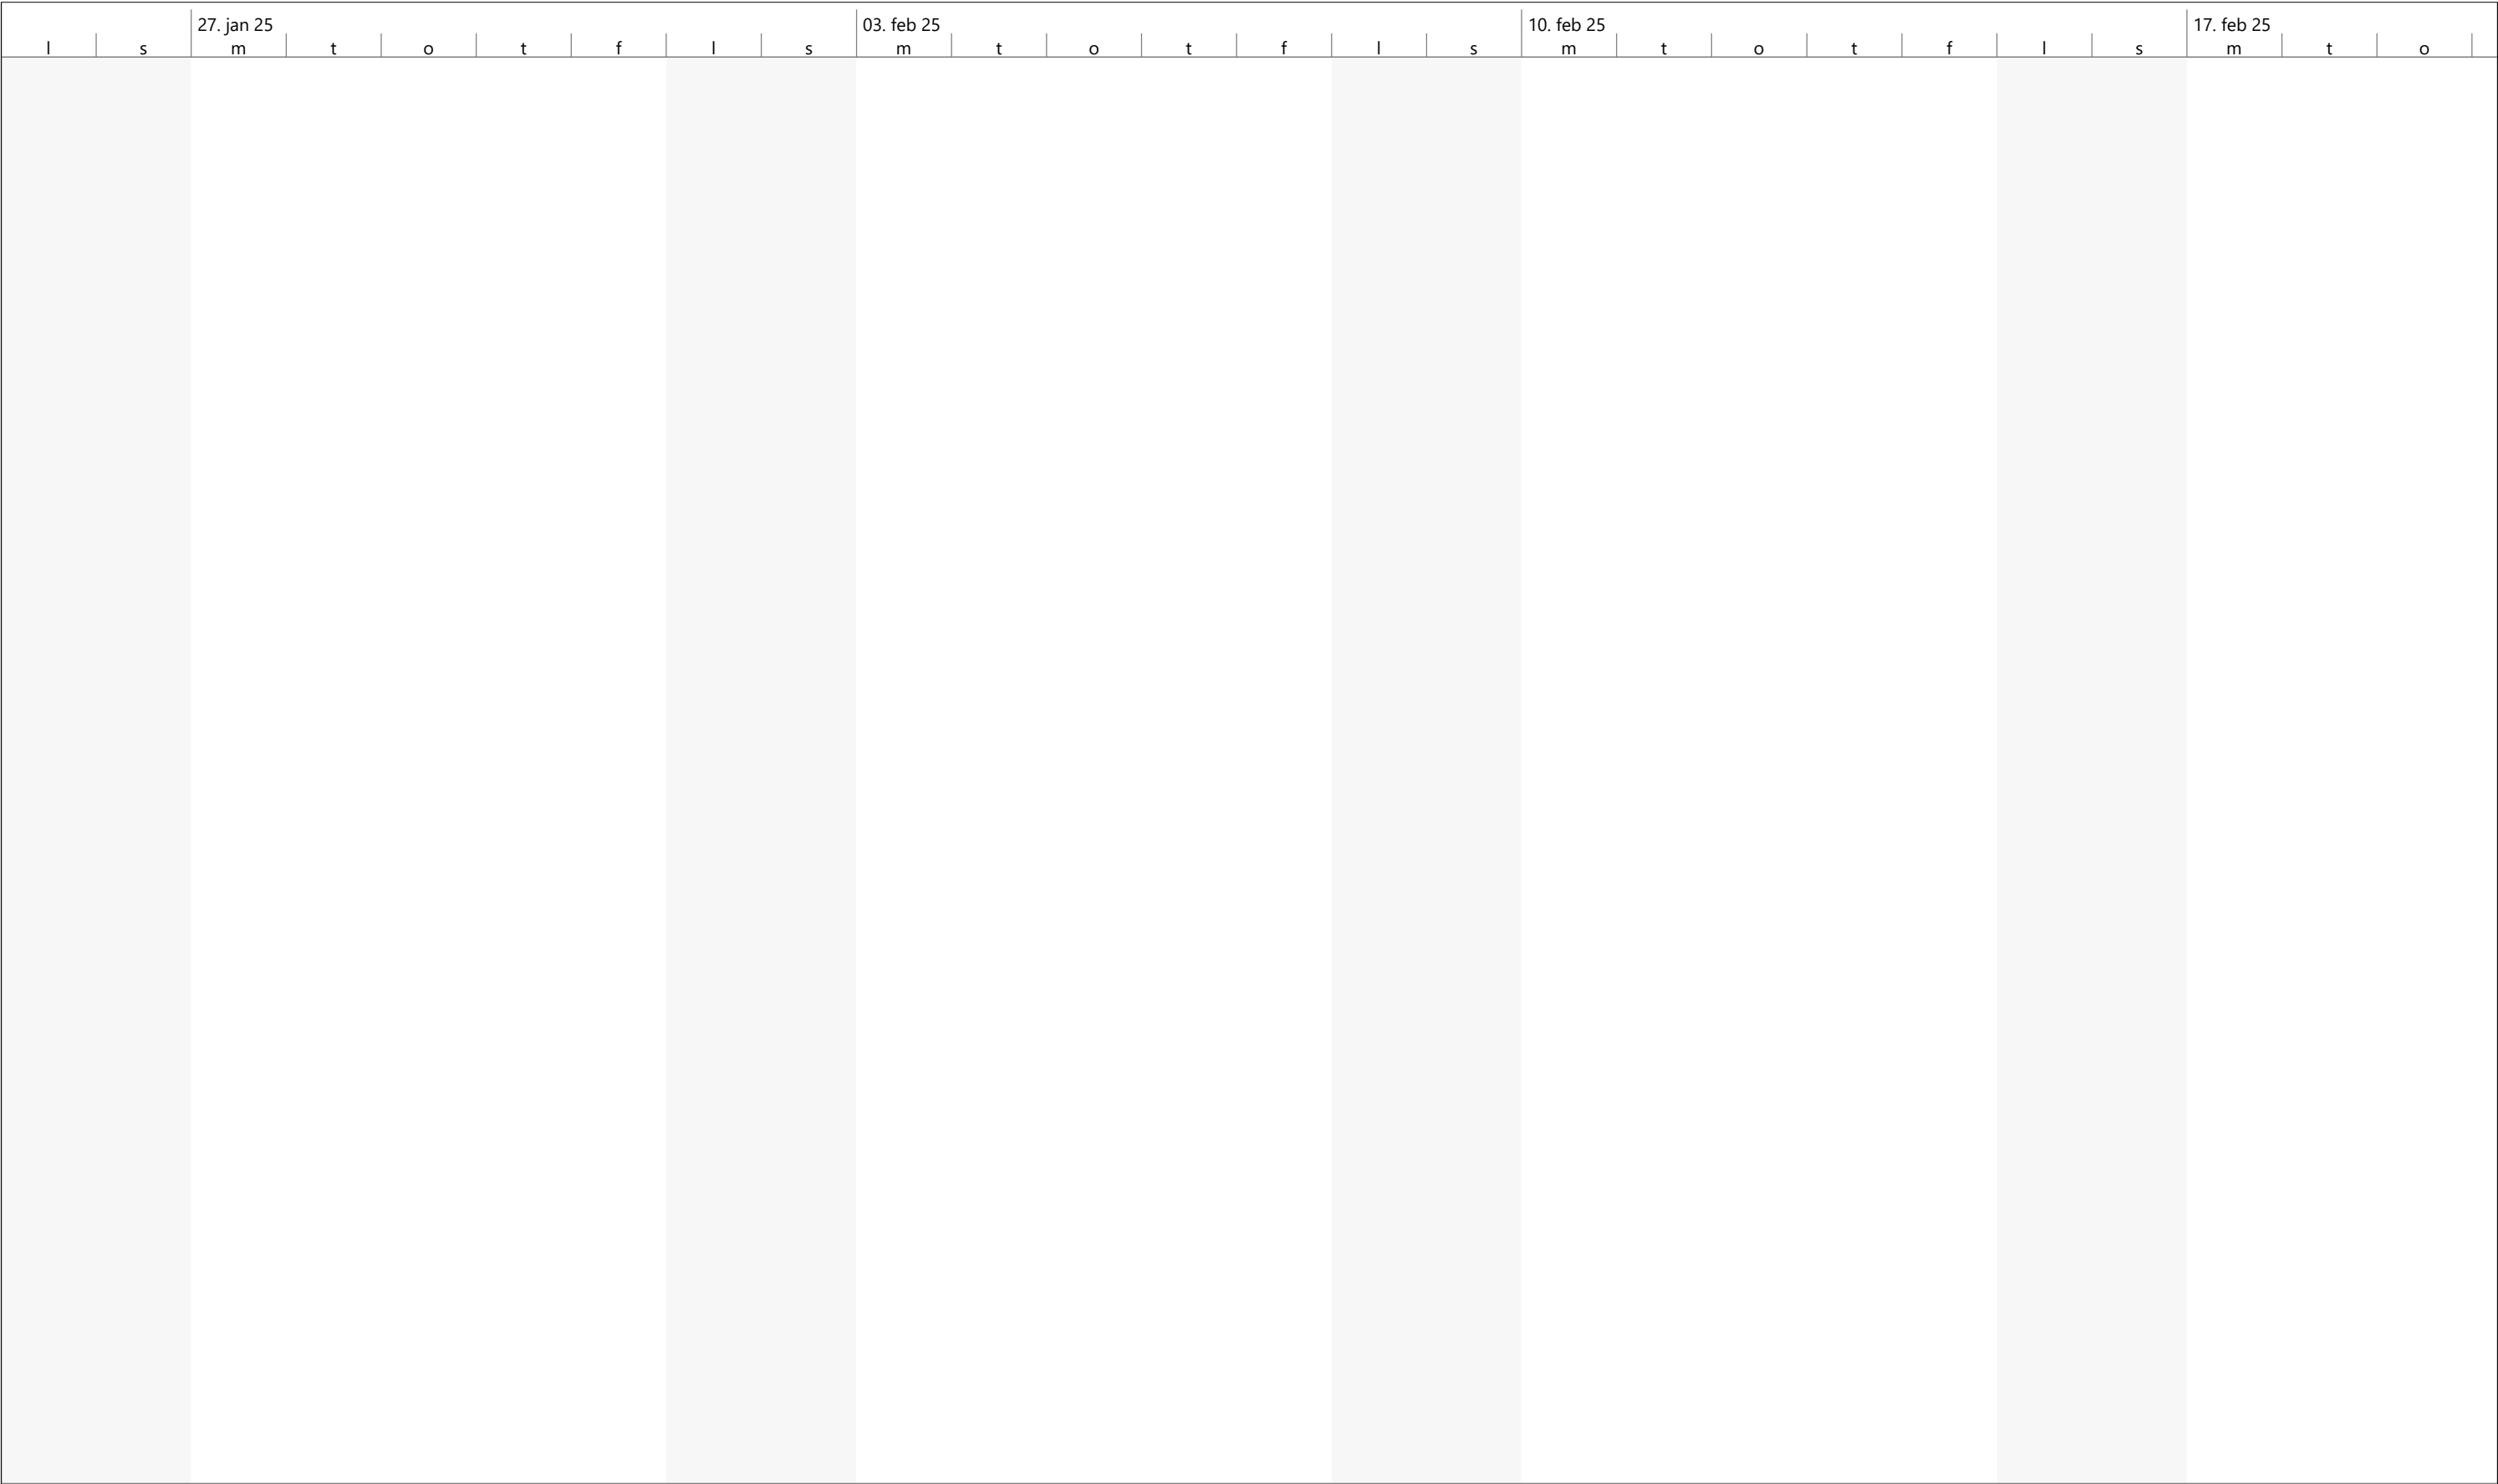













Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			






Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





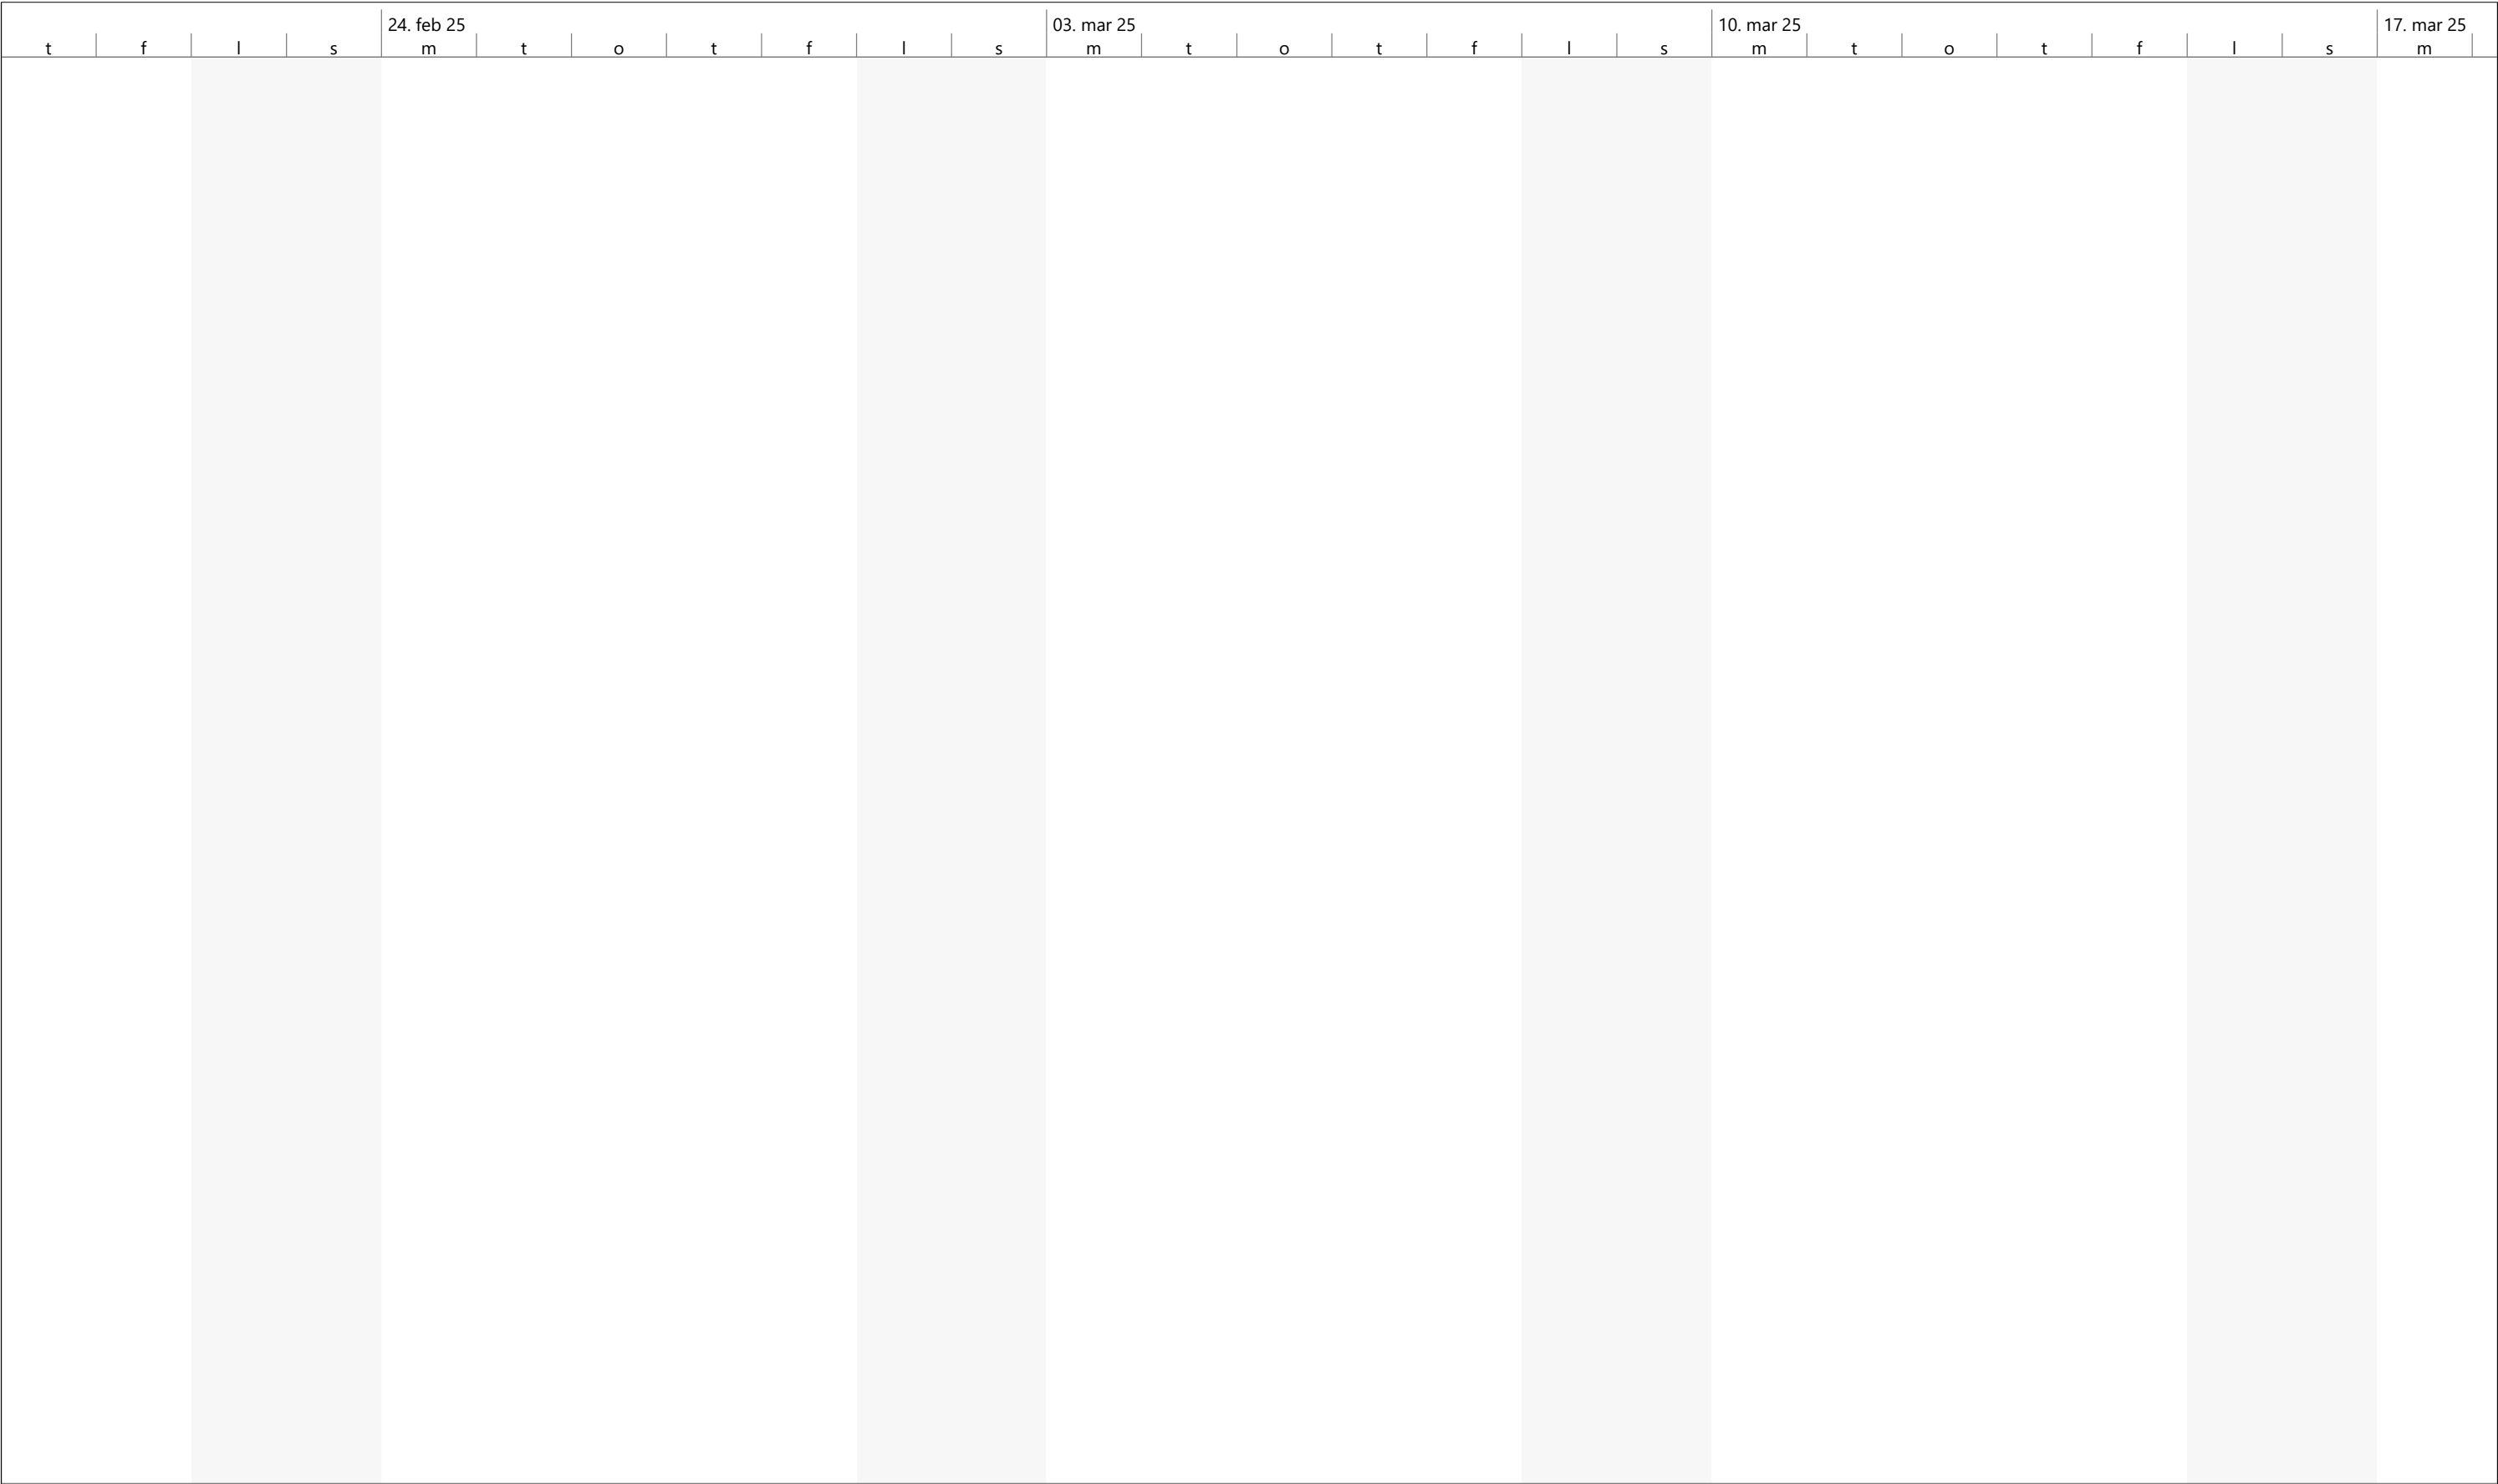

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



t

o

t

f

l

s

24. mar 25

m

t

o

t

f

l

s

31. mar 25

m

t

o

t

f

l

s

07. apr 25

m

t

o

t

f

l

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

◆

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 83

t	o	t	f	l	s	24. mar 25	m	t	o	t	f	l	s	31. mar 25	m	t	o	t	f	l	s	07. apr 25	m	t	o	t	f	l



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

s

14. apr 25

m

t

o

t

f

l

s

21. apr 25

m

t

o

t

f

l

s

28. apr 25

m

t

o

t

f

l

s

05. maj 25

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

[

]

◆

Deadline


Fremdrift

Manuel status

↓

Side 85



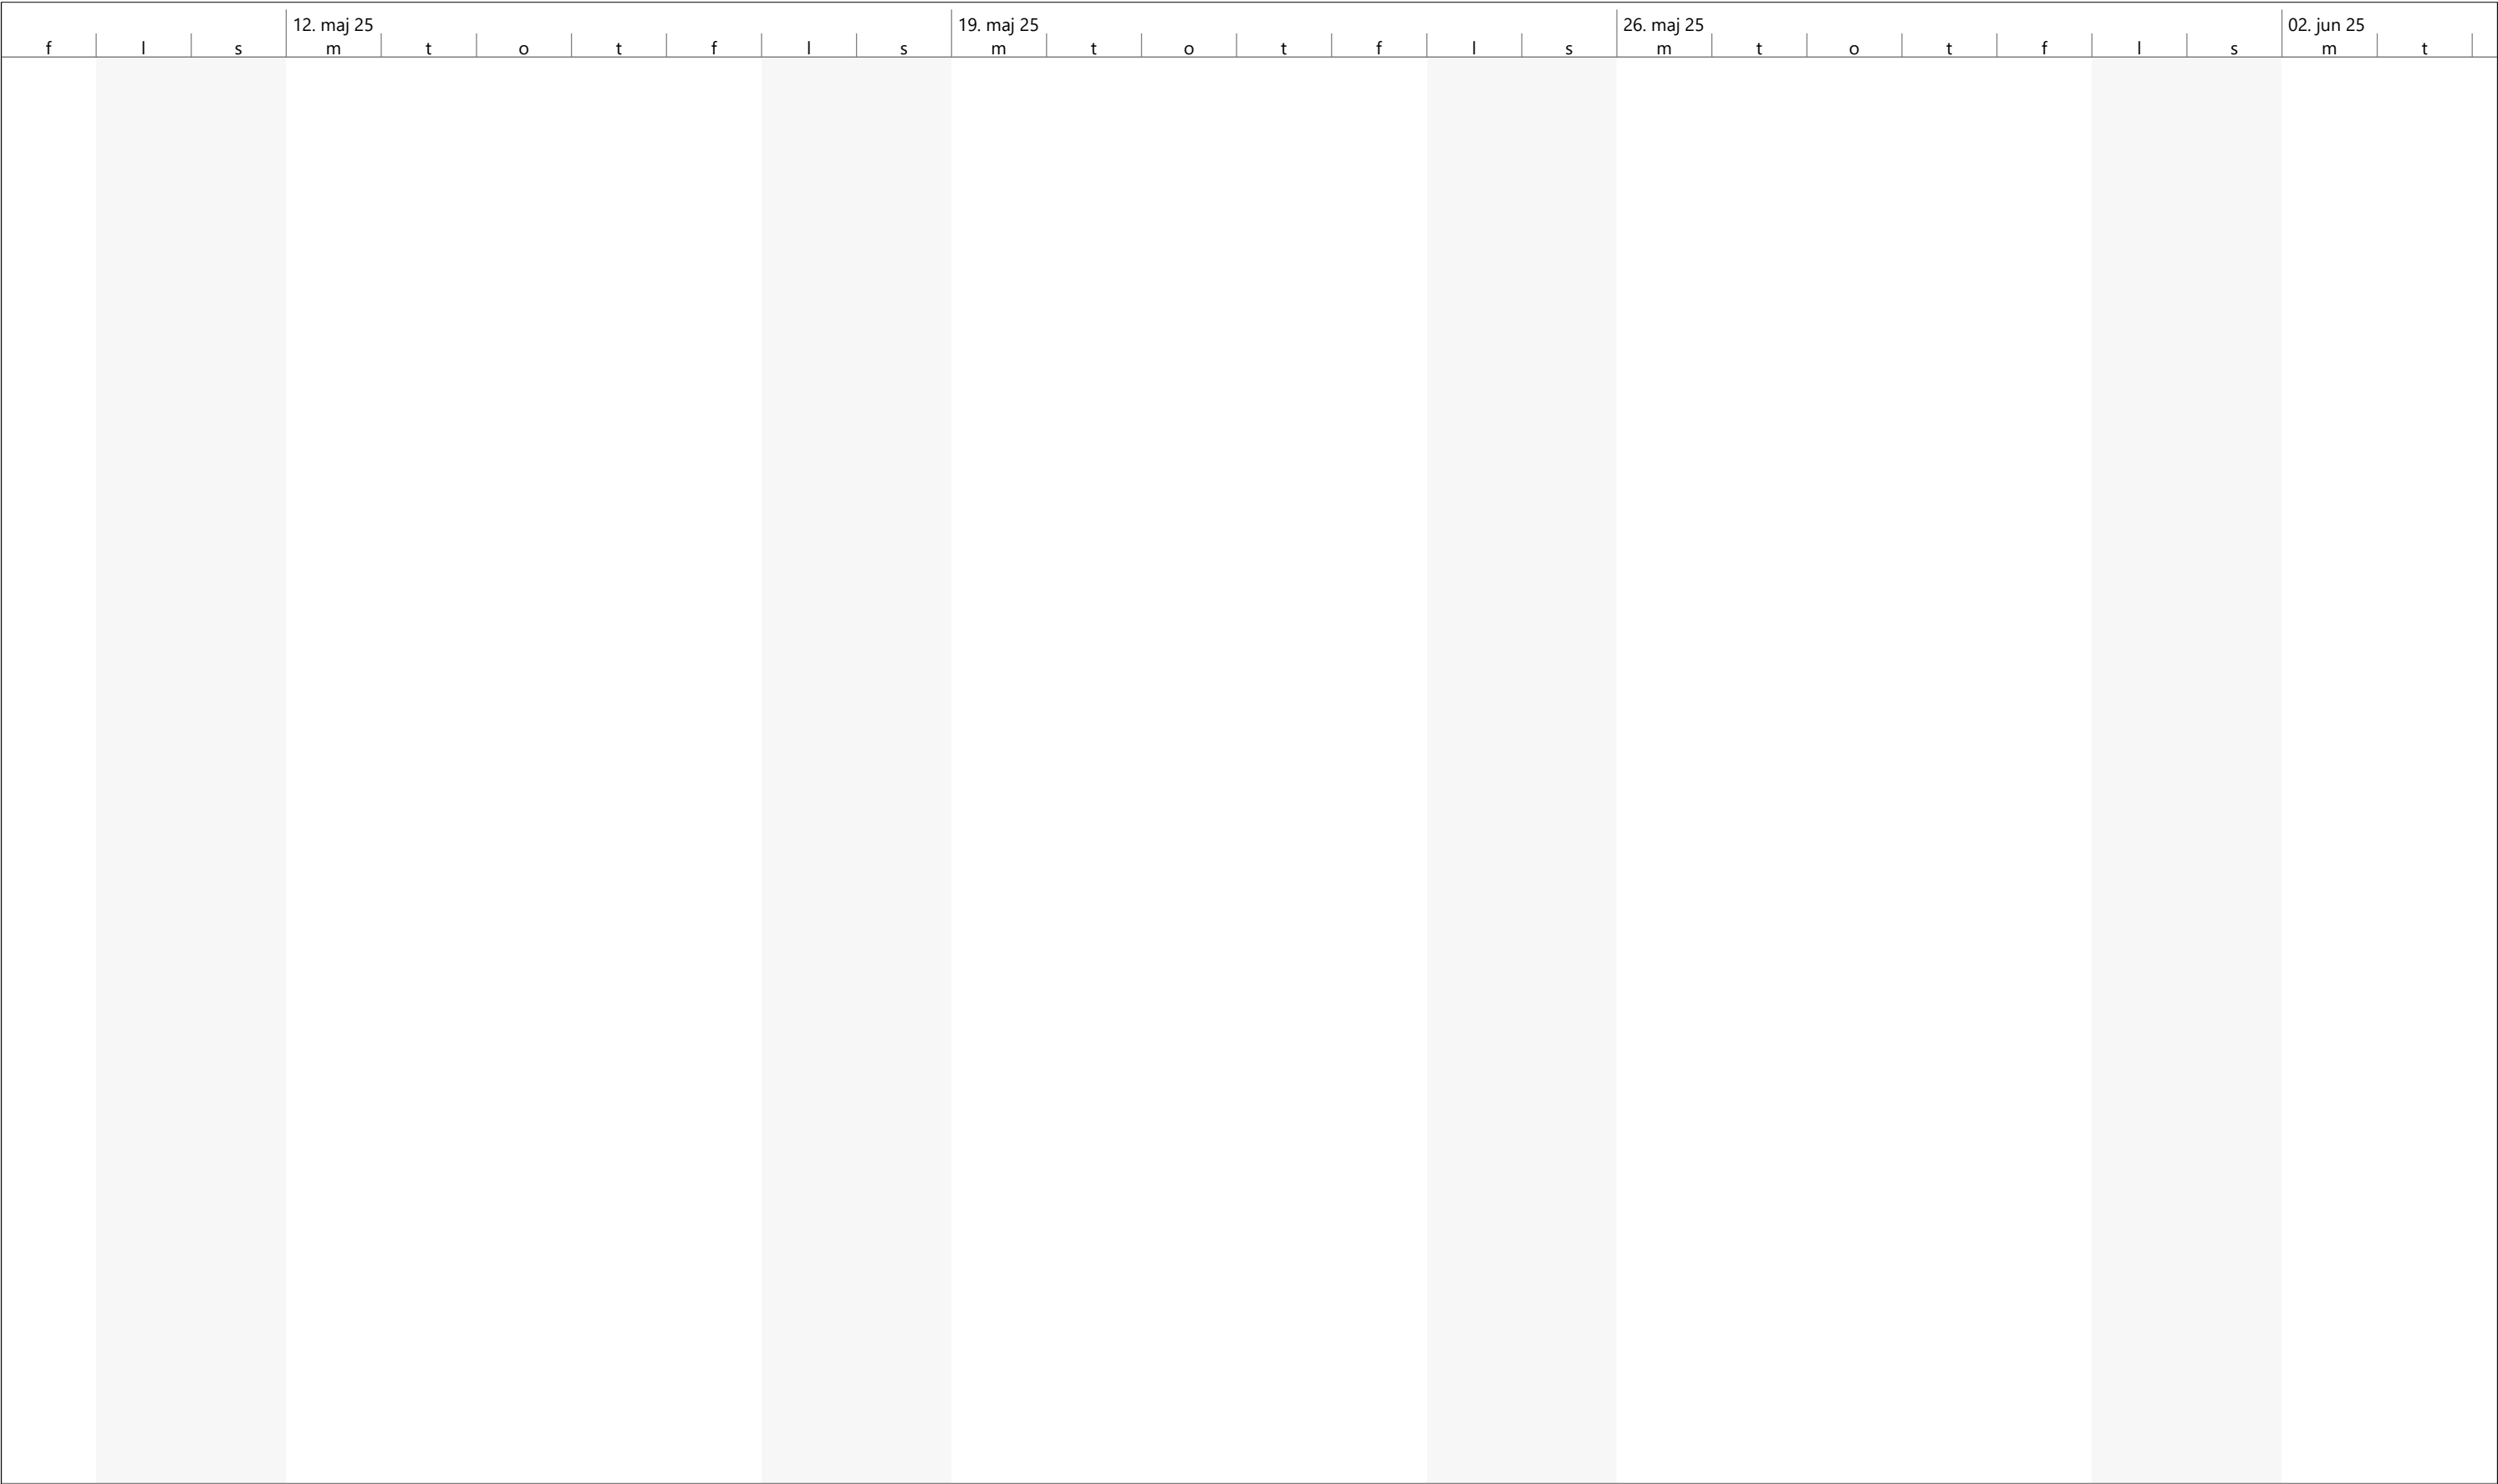


Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





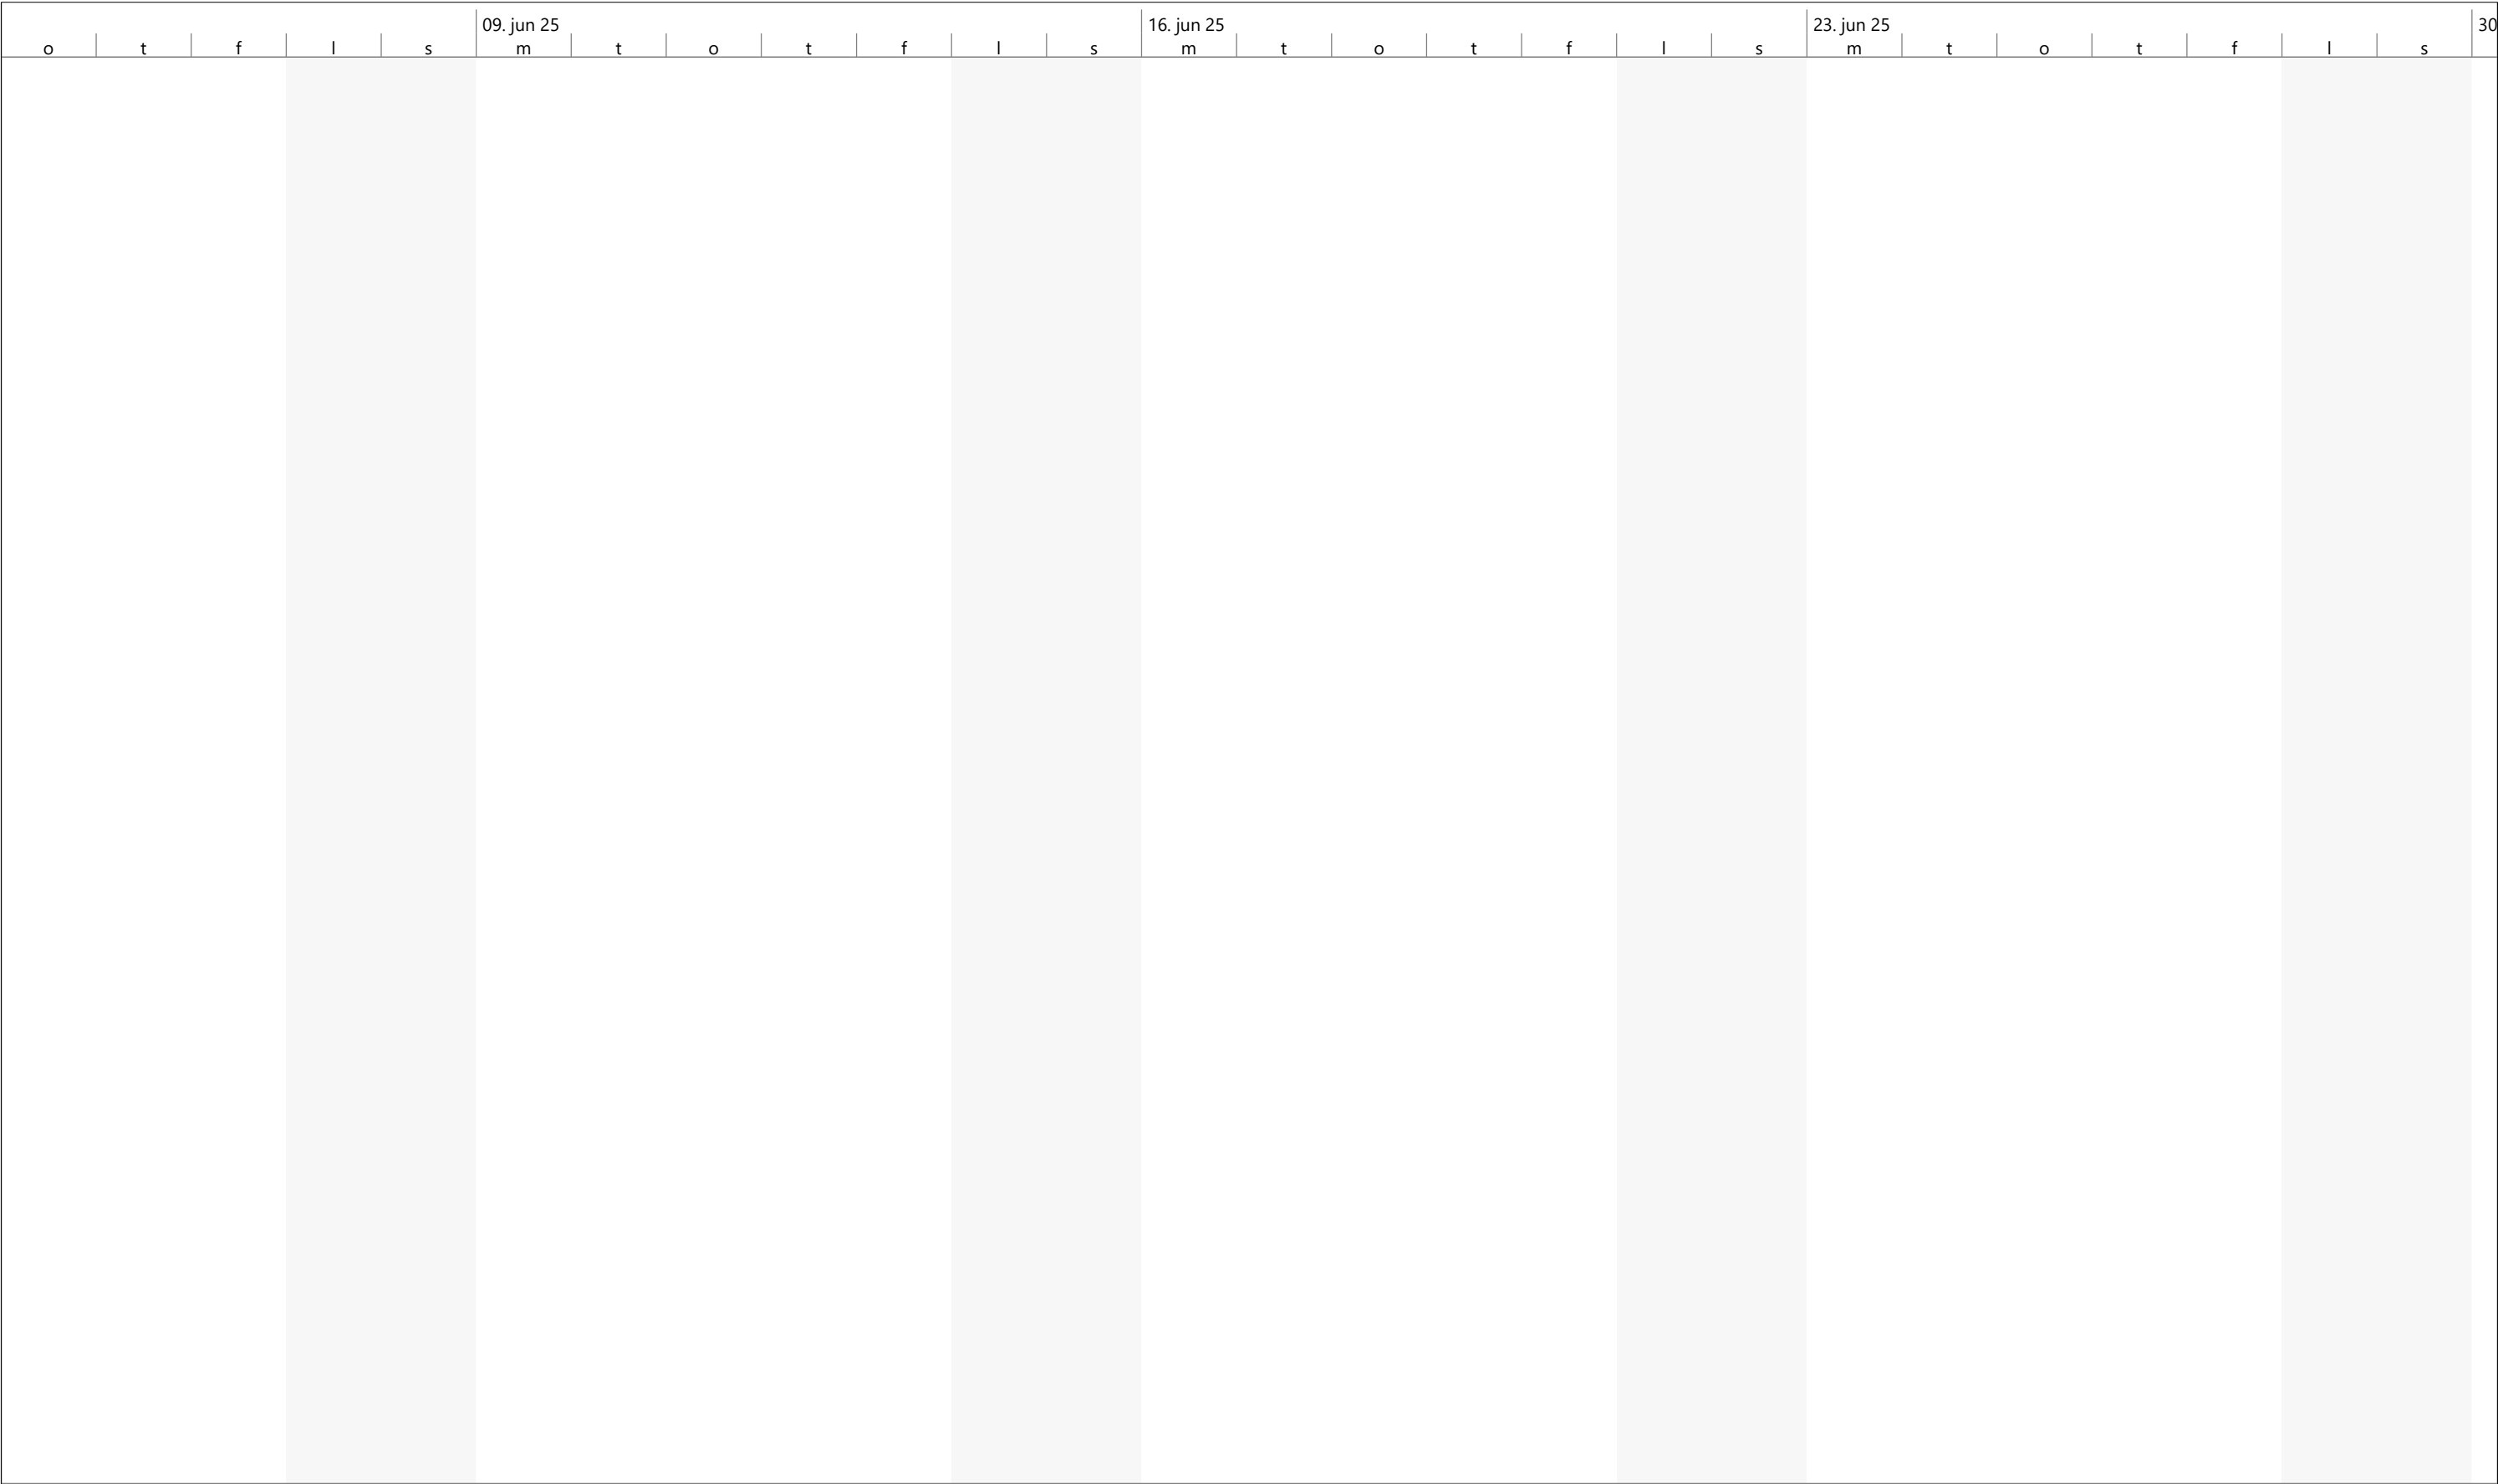

Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



30. jun 25

m

t

o

t

f

l

s

07. jul 25

m

t

o

t

f

l

s

14. jul 25

m

t

o

t

f

l

s

21. jul 25

m

t

o

t

f

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl


Deadline










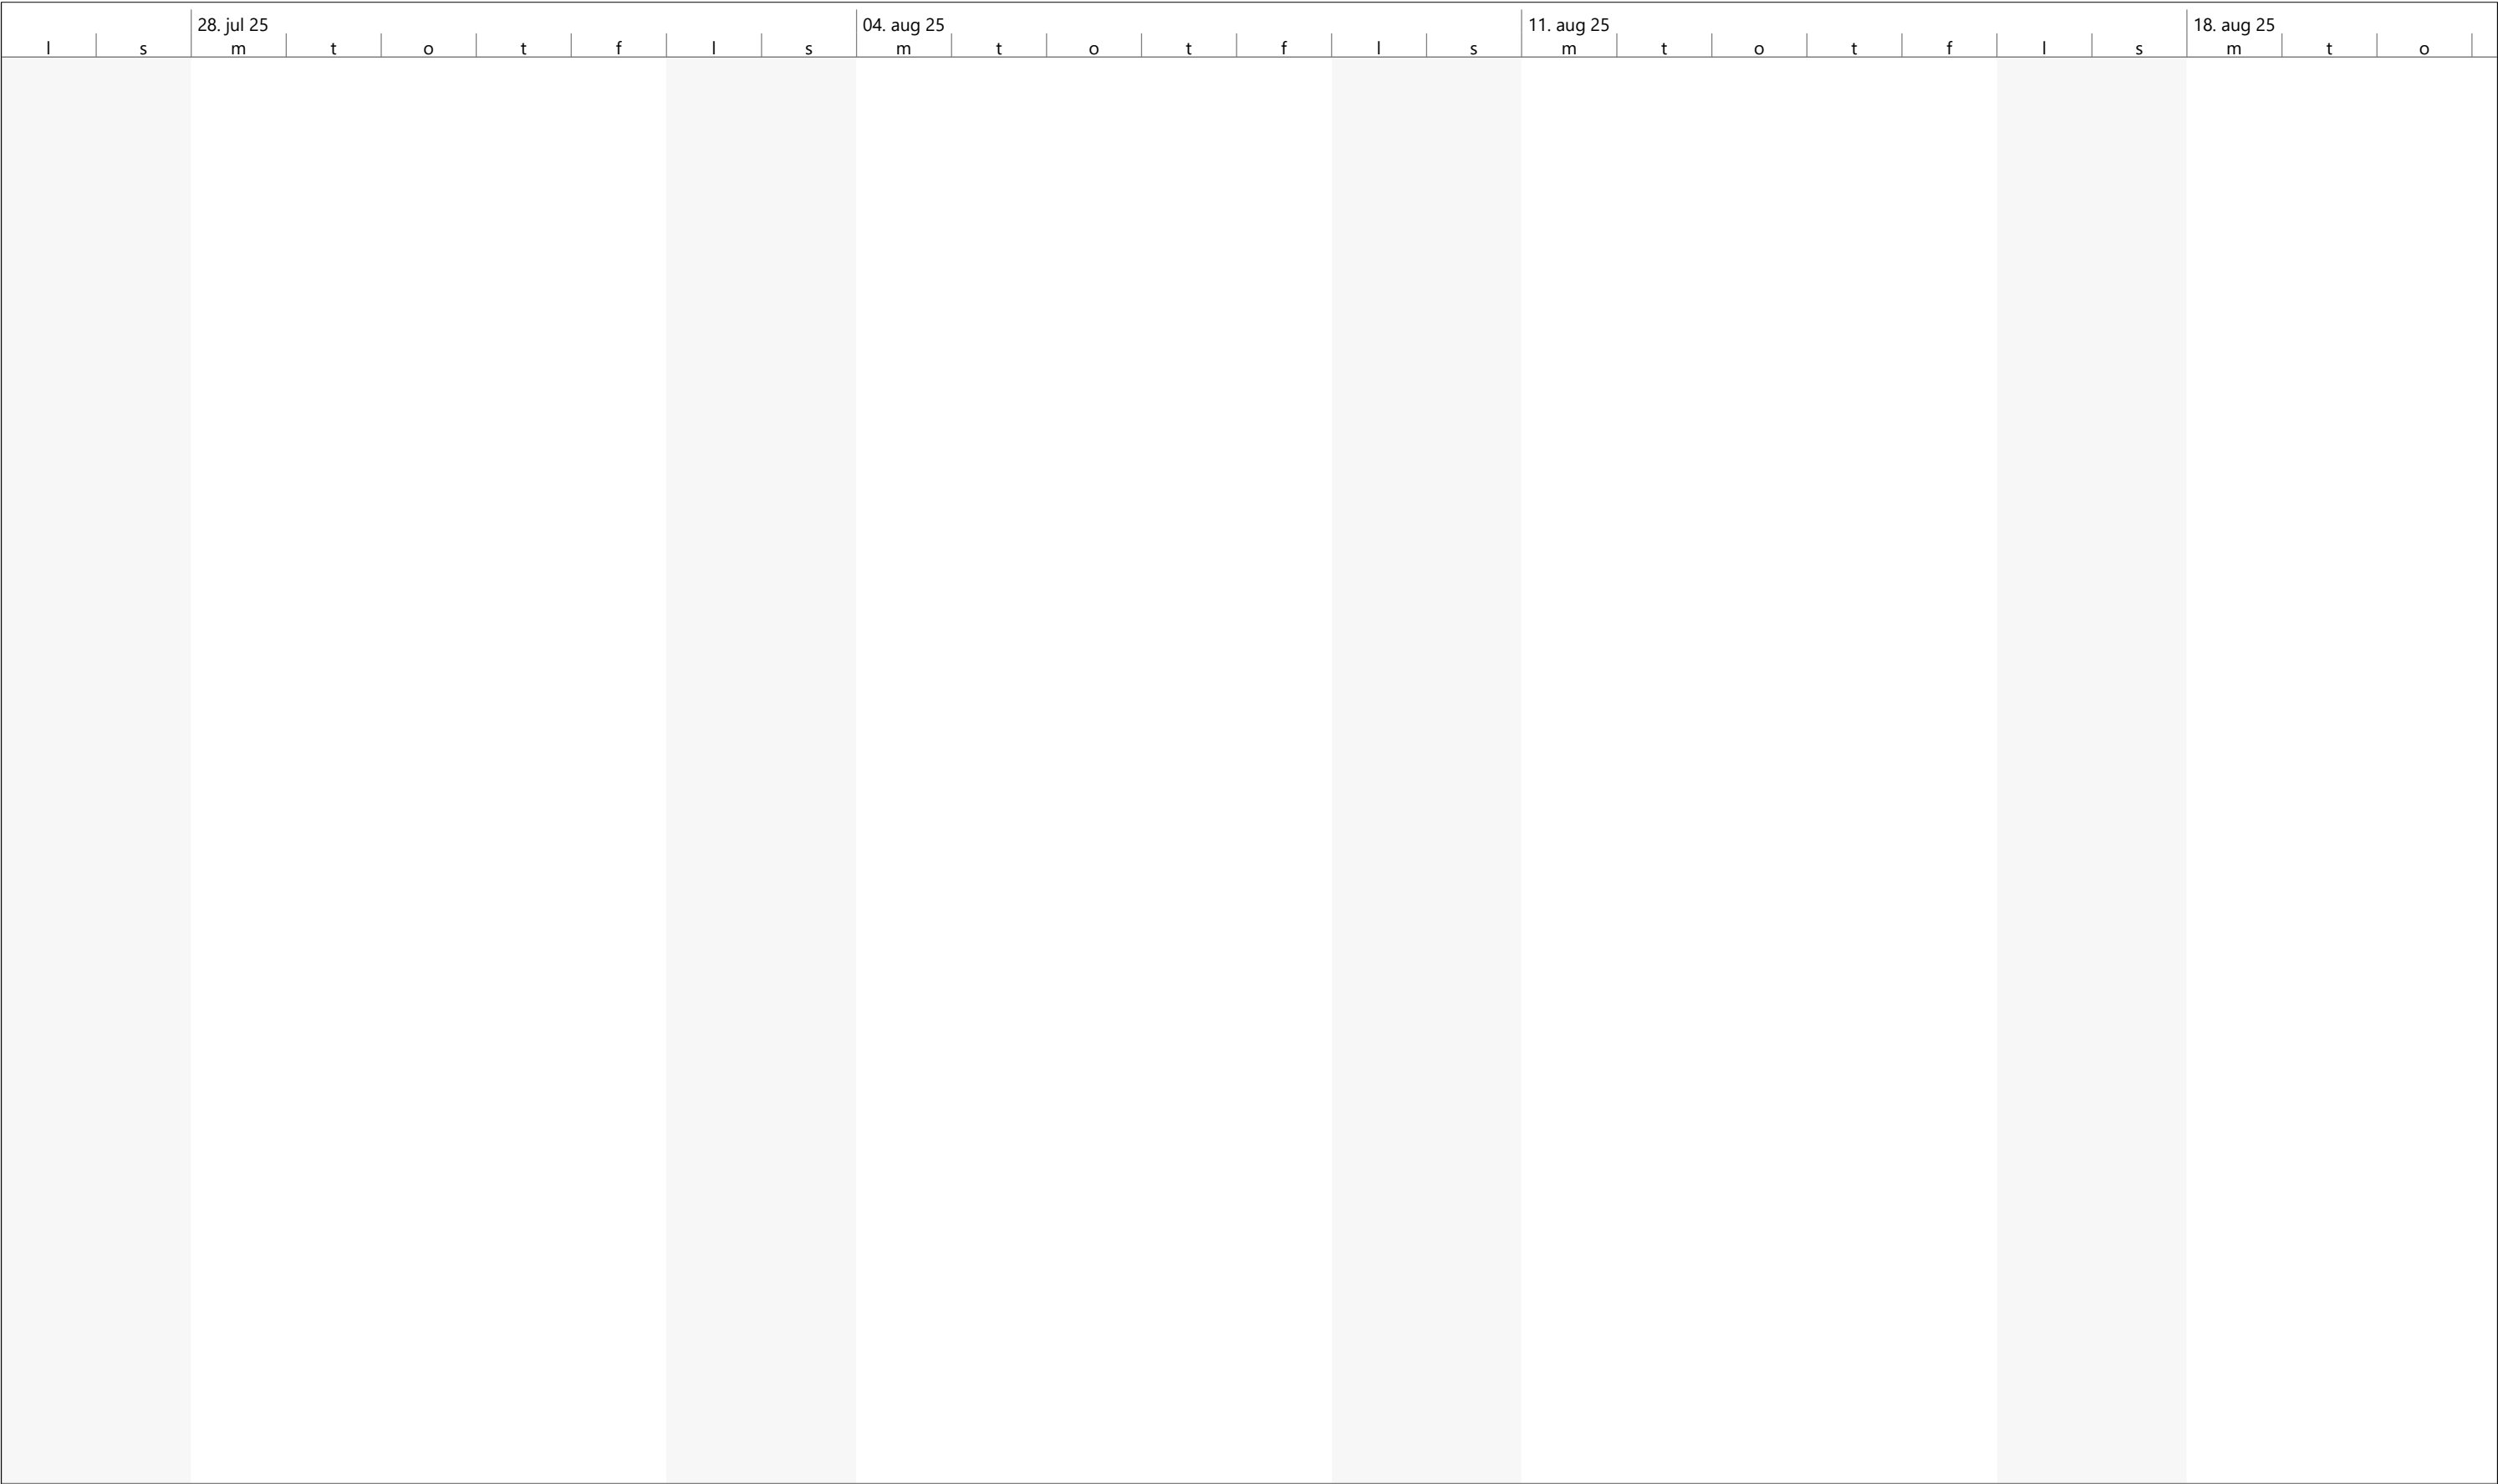









Fremdrift

Manuel status

Side 91






Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

l	s	28. jul 25	m	t	o	t	f	l	s	04. aug 25	m	t	o	t	f	l	s	11. aug 25	m	t	o	t	f	l	s	18. aug 25	m	t	o



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

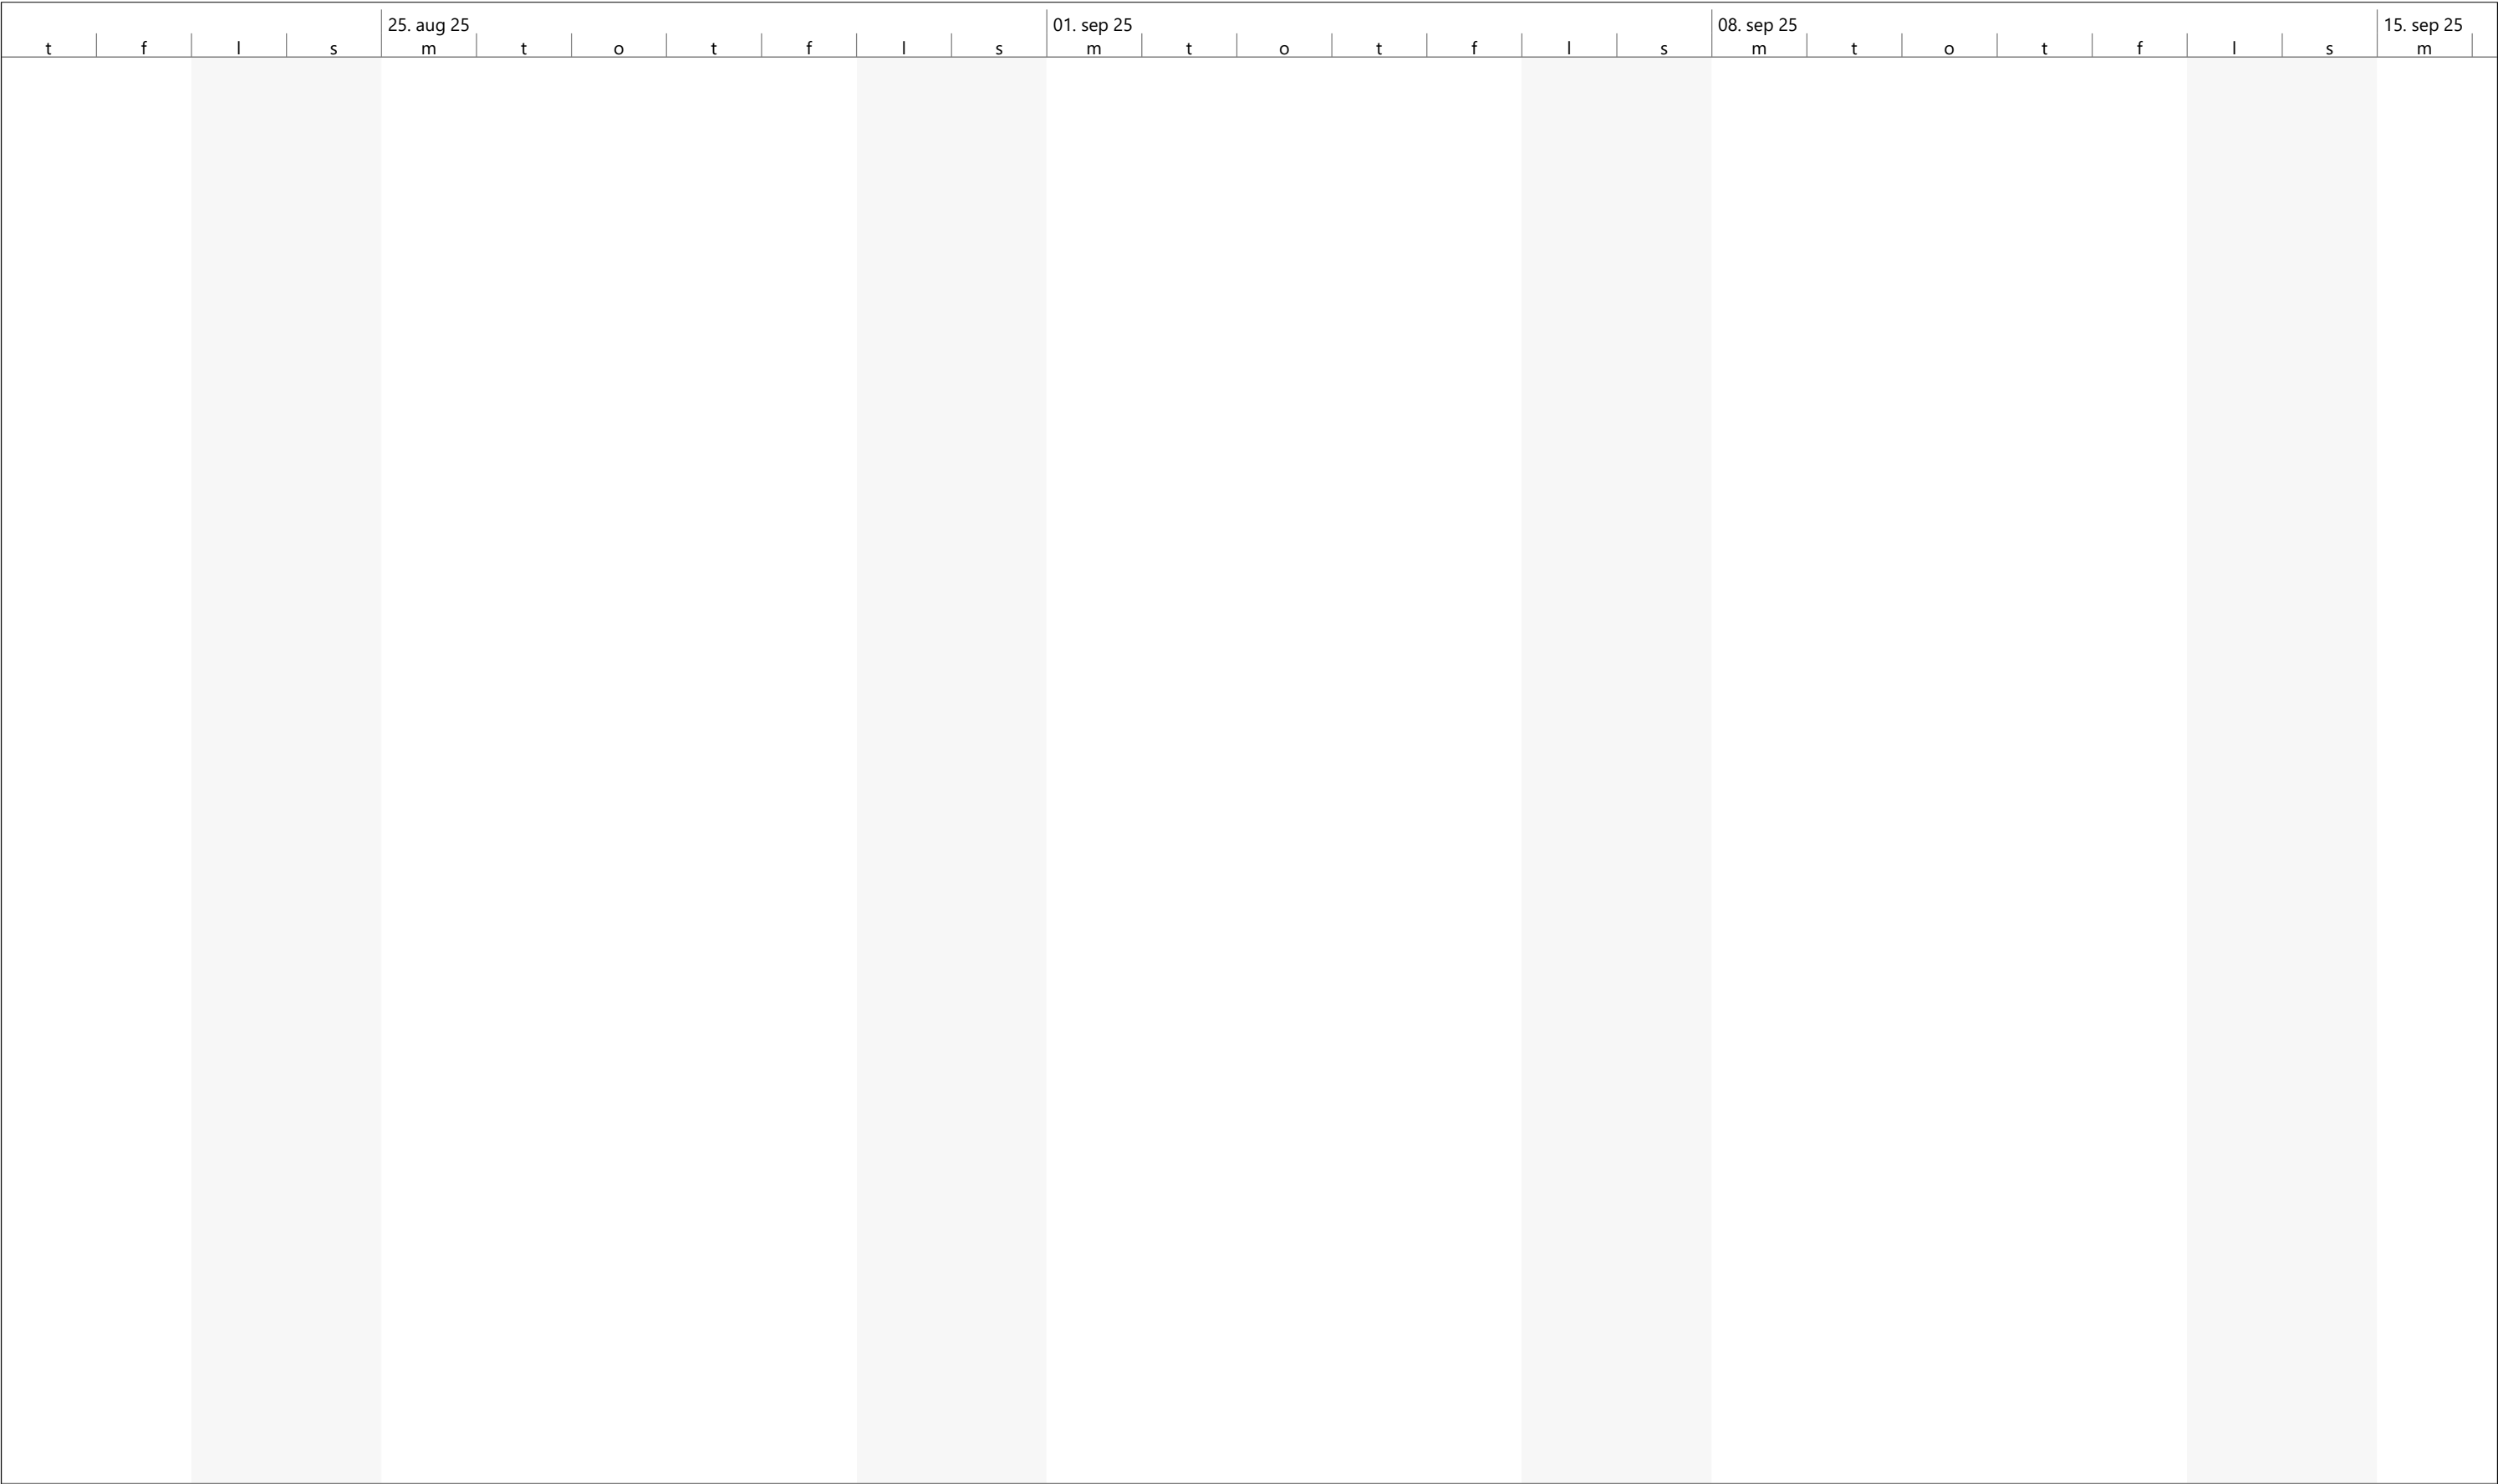

Dato: ti 26-05-26


Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			










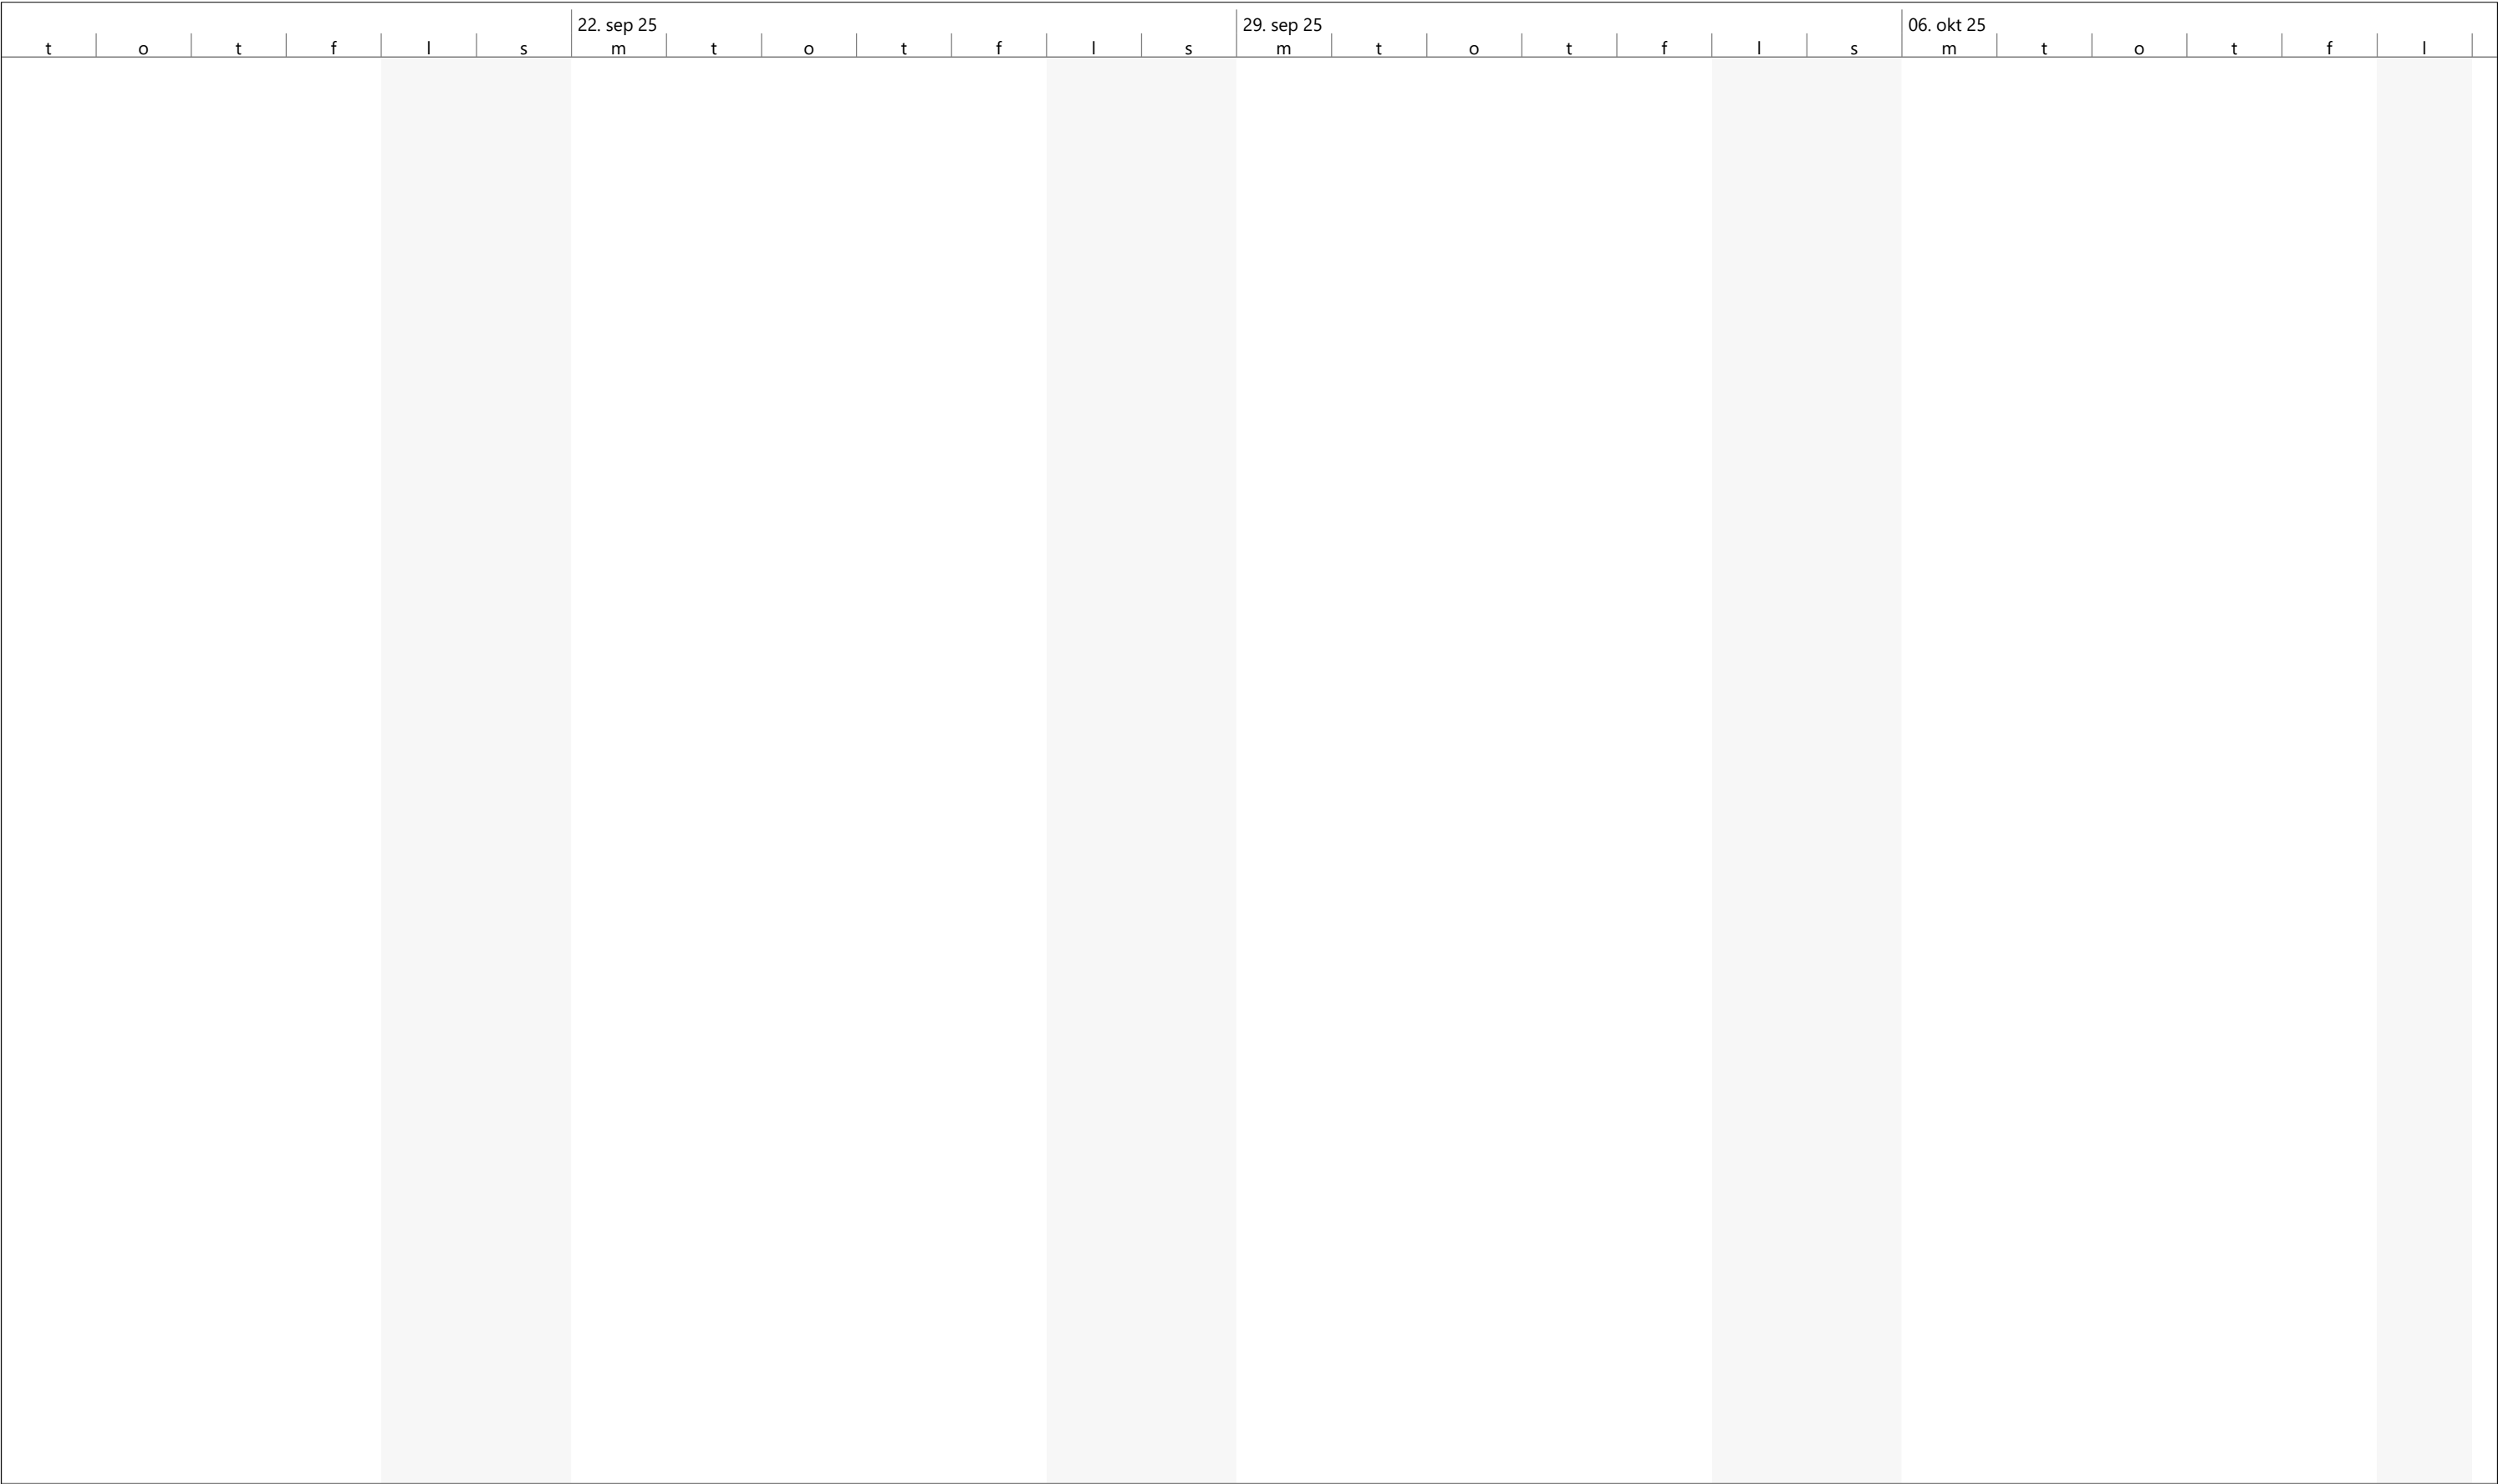









t	f	l	s	25. aug 25 m	t	o	t	f	l	s	01. sep 25 m	t	o	t	f	l	s	08. sep 25 m	t	o	t	f	l	s	15. sep 25 m



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

t	o	t	f	l	s	22. sep 25 m	t	o	t	f	l	s	29. sep 25 m	t	o	t	f	l	s	06. okt 25 m	t	o	t	f	l



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

s

13. okt 25

m

t

o

t

f

l

s

20. okt 25

m

t

o

t

f

l

s

27. okt 25

m

t

o

t

f

l

s

03. nov 25

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 99

s	13. okt 25							20. okt 25							27. okt 25							03. nov 25								
	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

f

l

s

10. nov 25

m

t

o

t

f

l

s

17. nov 25

m

t

o

t

f

l

s

24. nov 25

m

t

o

t

f

l

s

01. dec 25

m

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 101



o

t

f

l

s

08. dec 25

m

t

o

t

f

l

s

15. dec 25

m

t

o

t

f

l

s

22. dec 25

m

t

o

t

f

l

s

29

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status


Side 103

o	t	f	l	s	08. dec 25	m	t	o	t	f	l	s	15. dec 25	m	t	o	t	f	l	s	22. dec 25	m	t	o	t	f	l	s	29



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



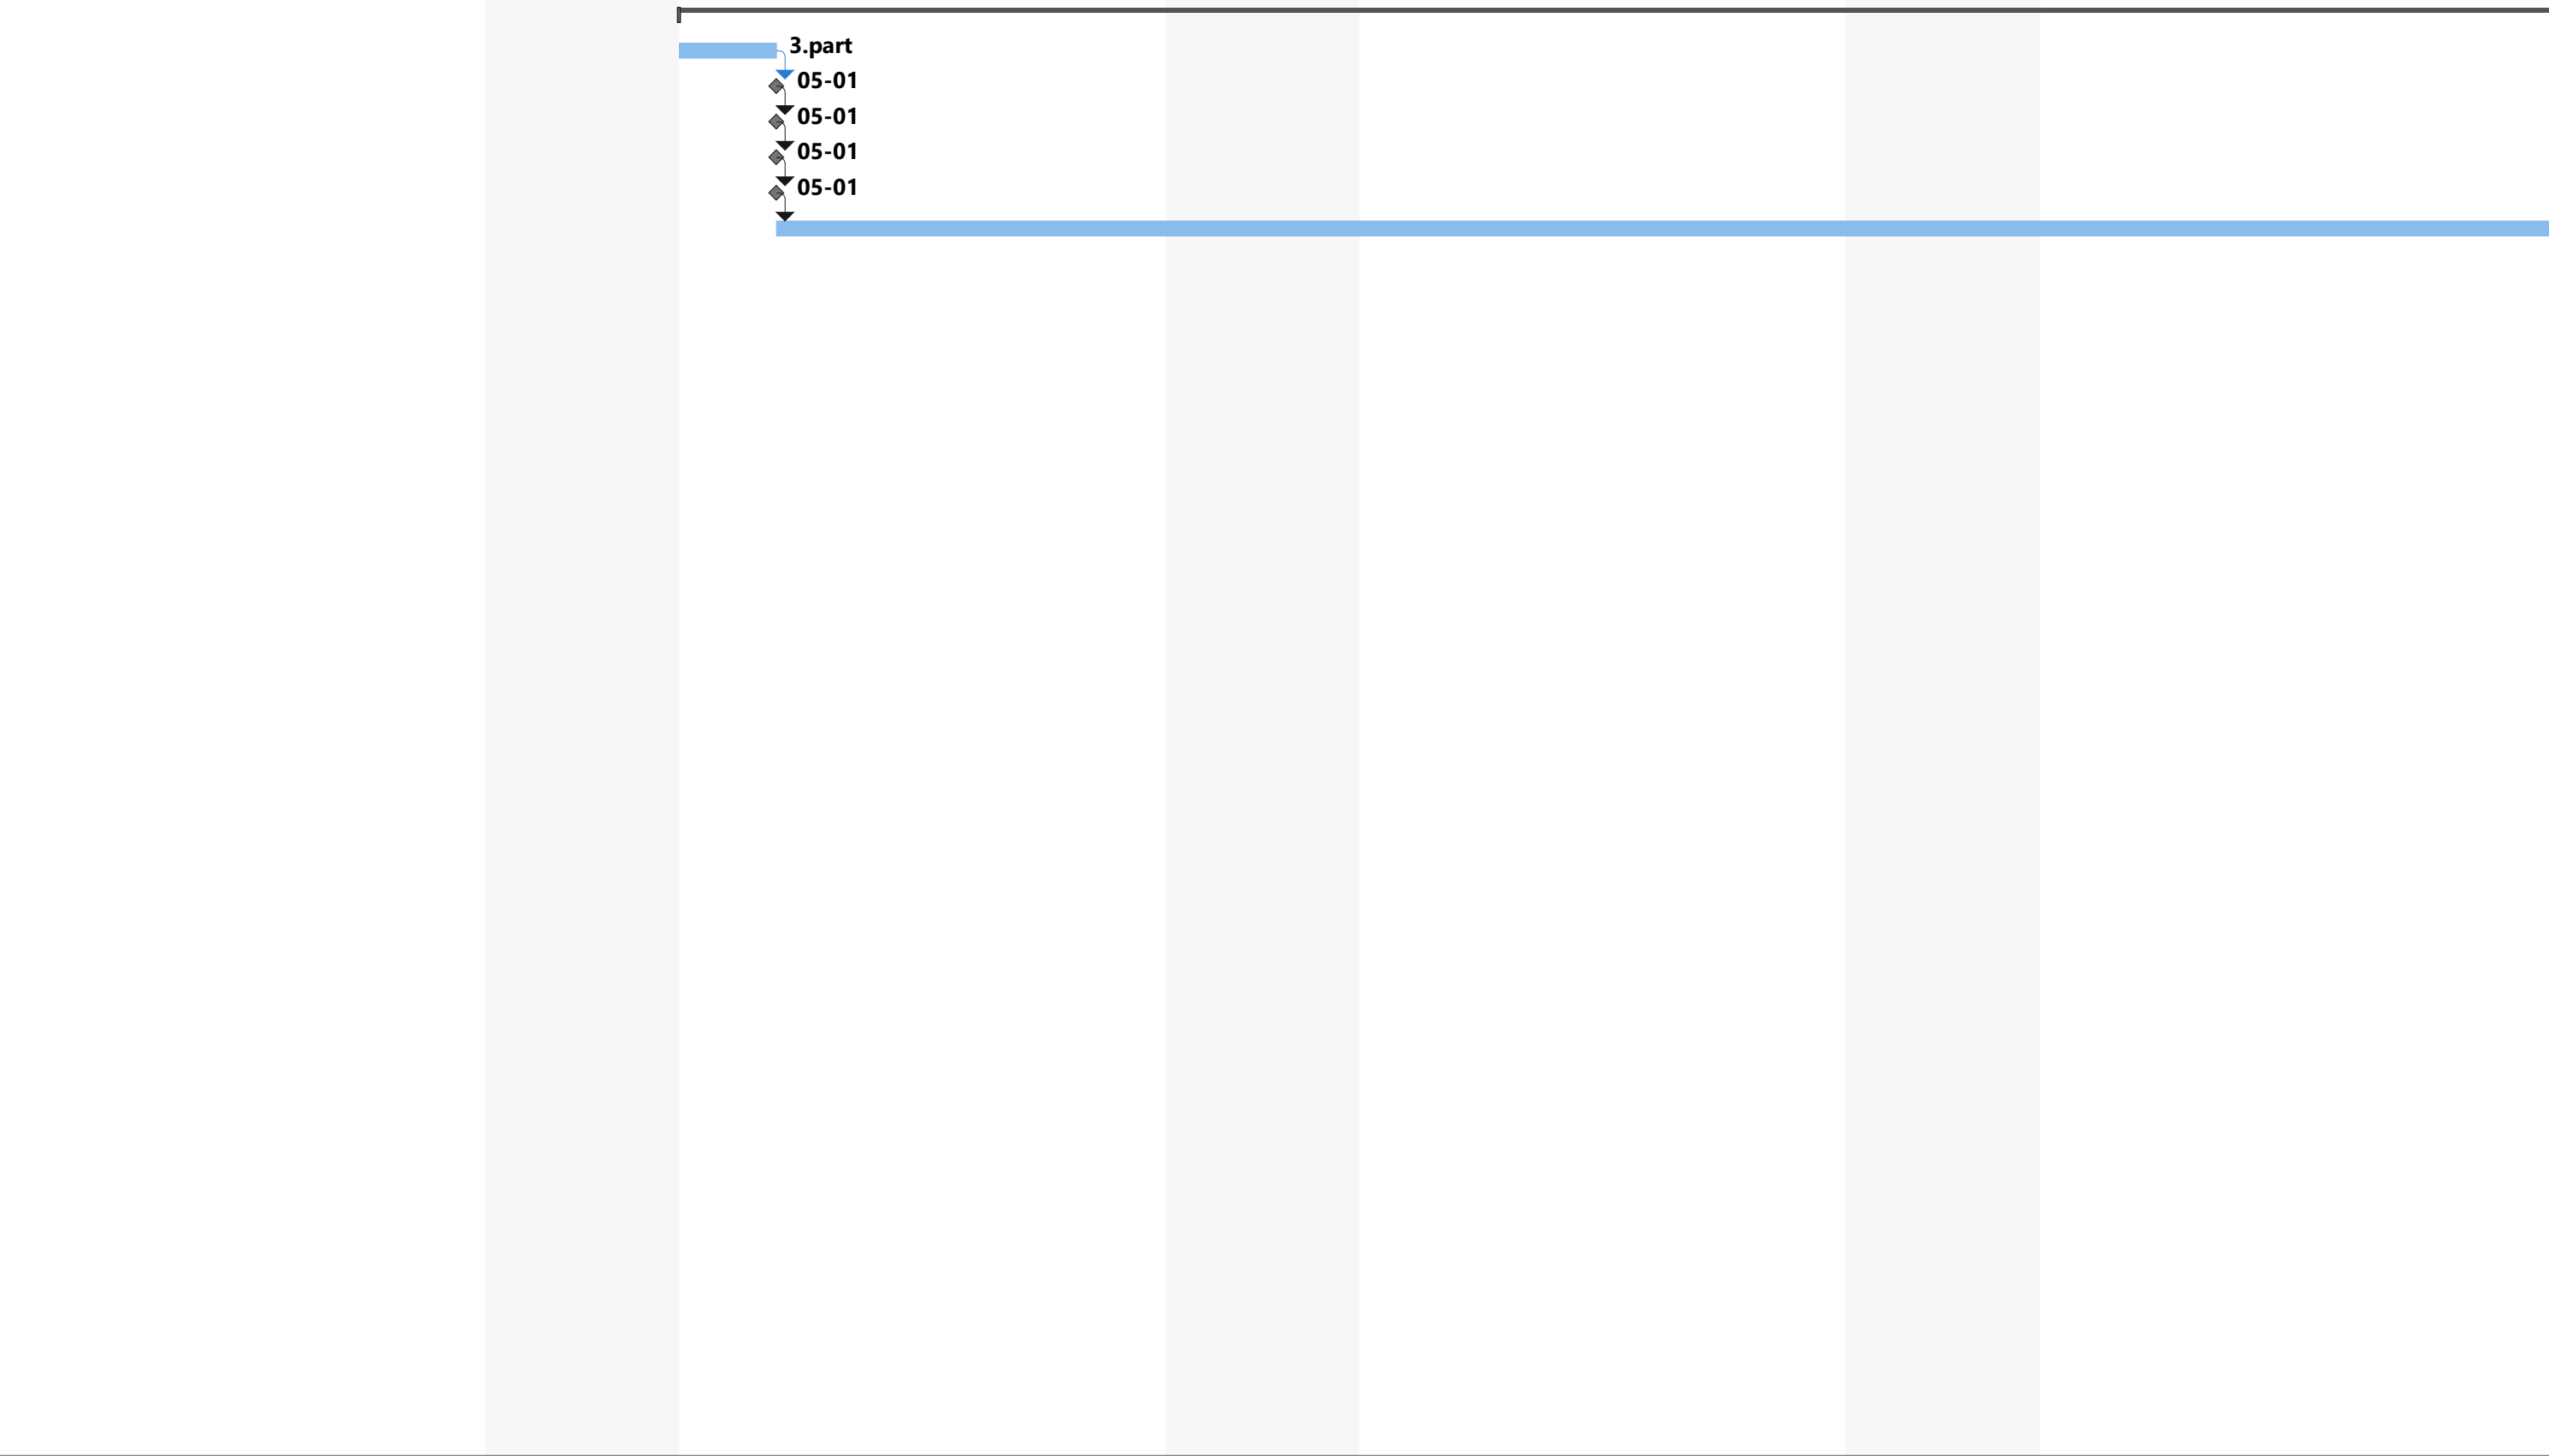

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

29. dec 25

m

t

o

t

f

l

s

05. jan 26

m

t

o

t

f

l

s

12. jan 26

m

t

o

t

f

l

s

19. jan 26

m

t

o

t

f

l

s

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver


Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status


Side 106

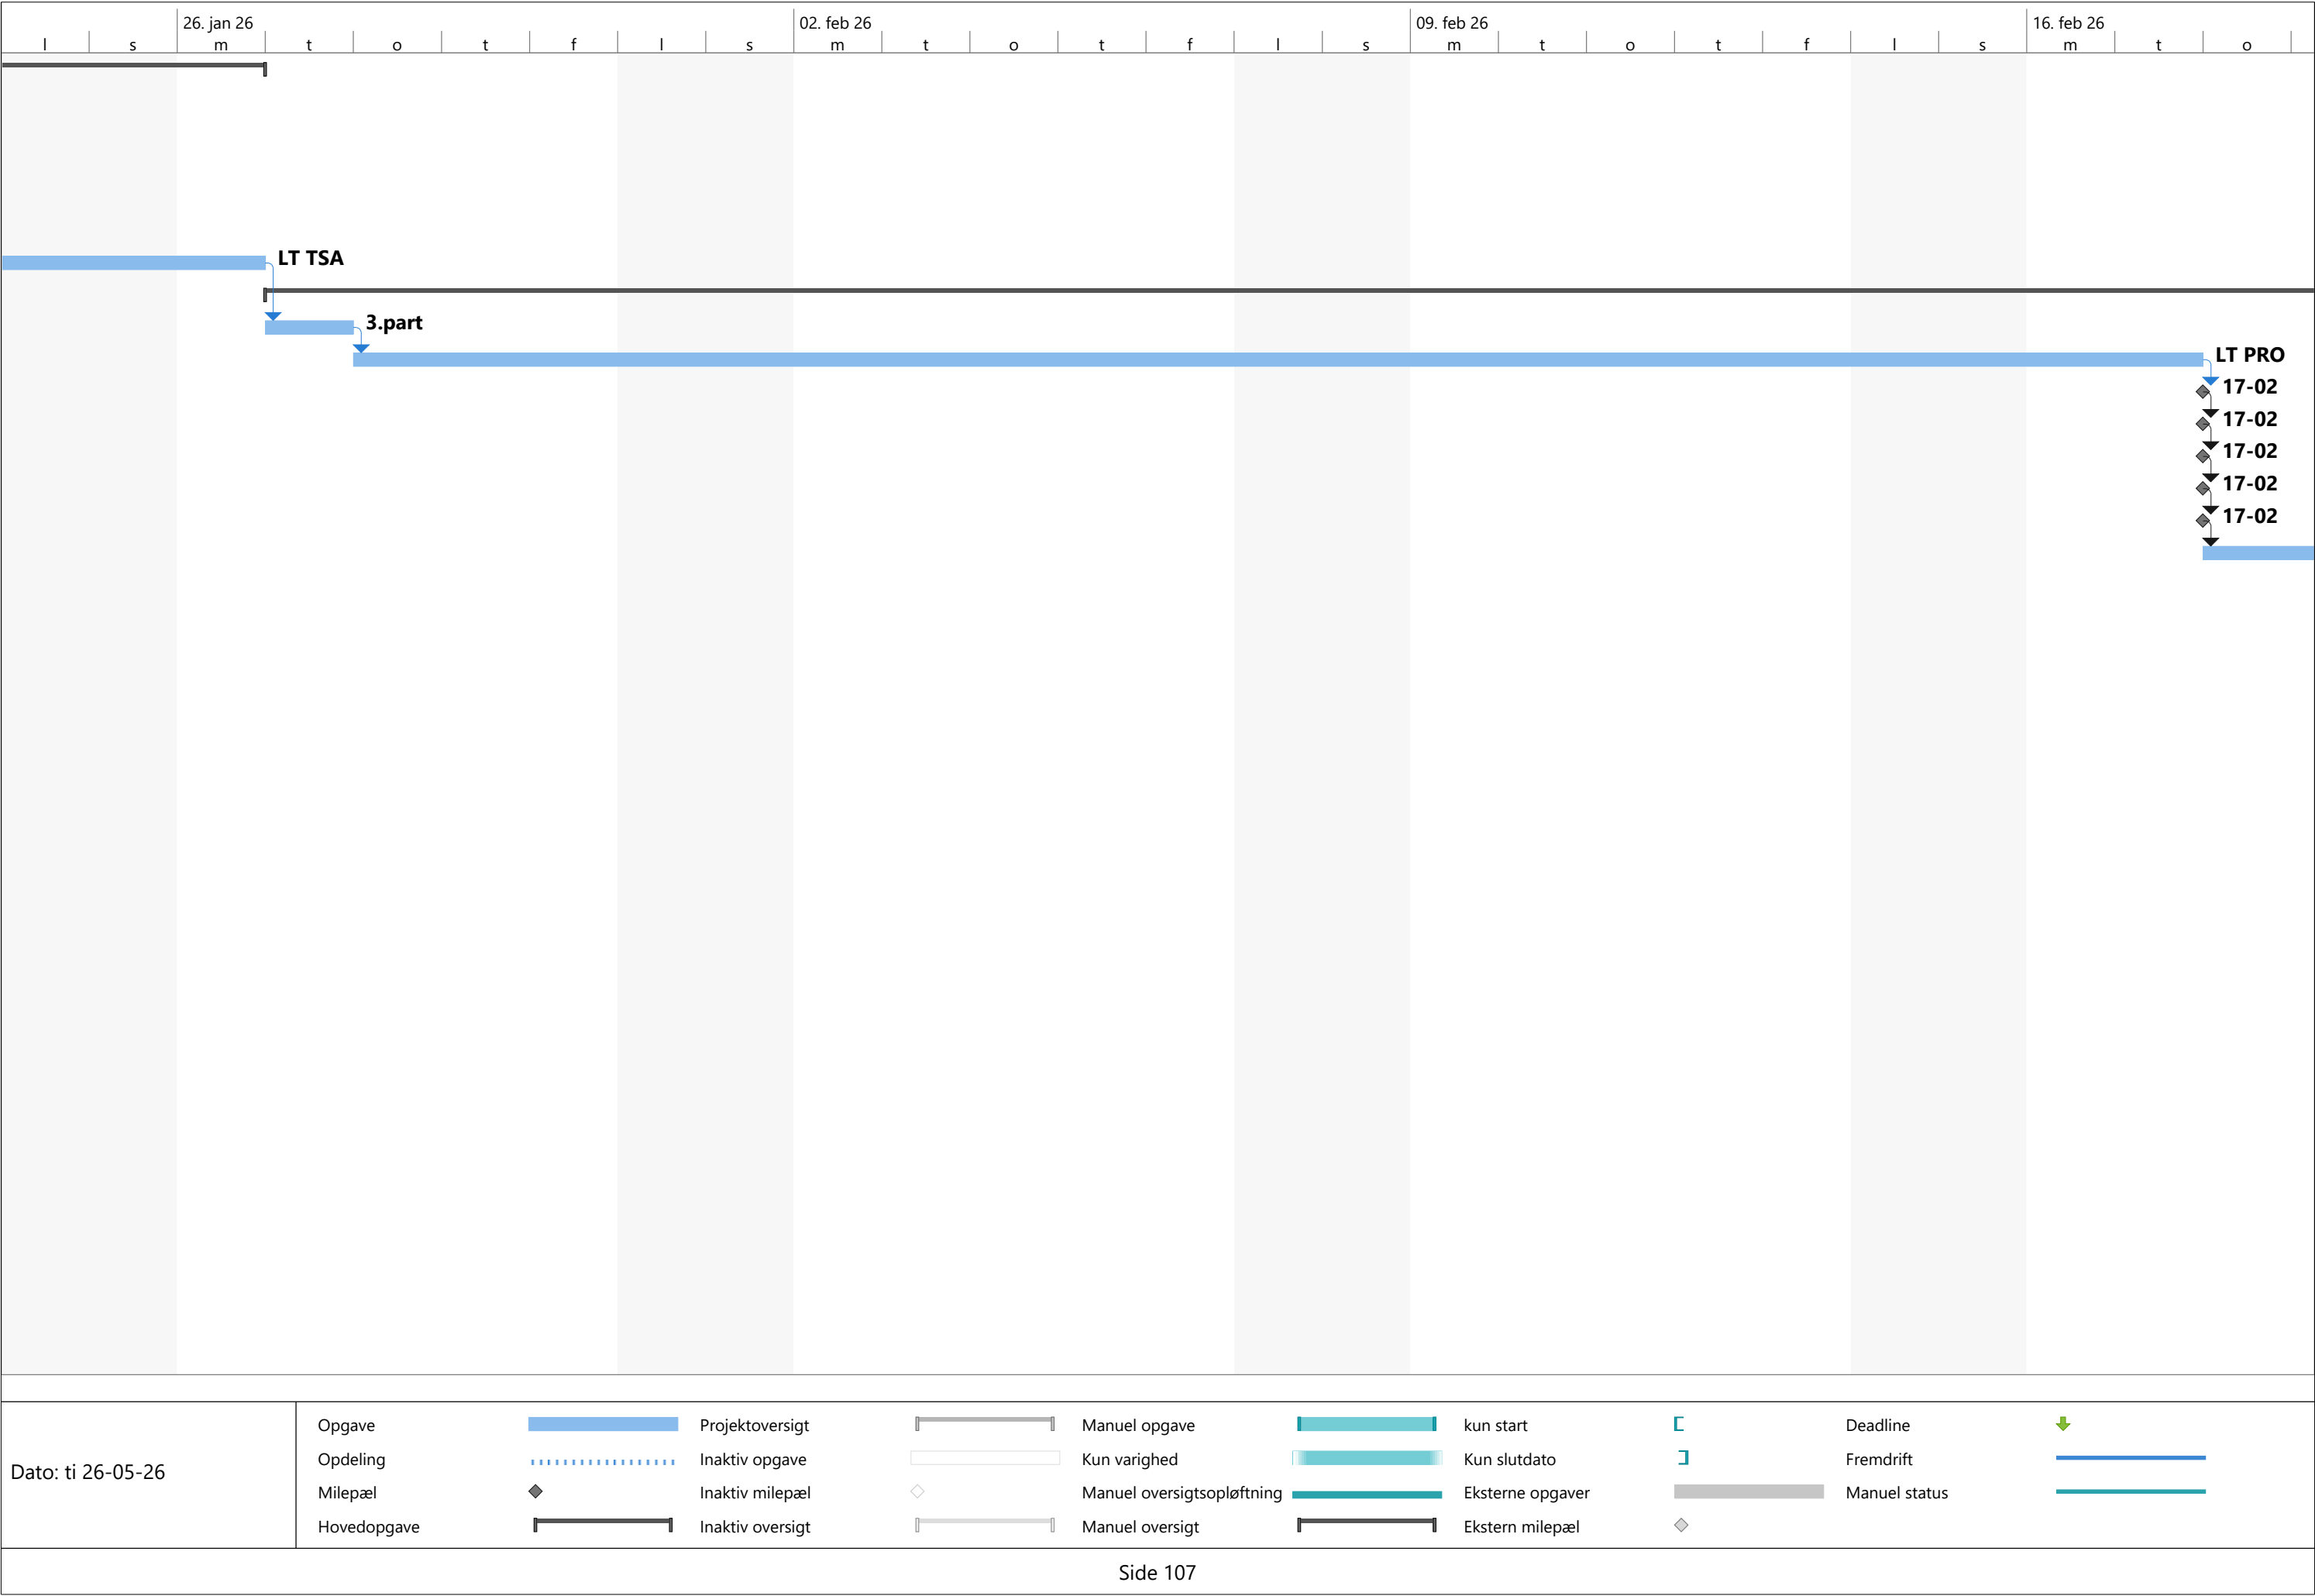








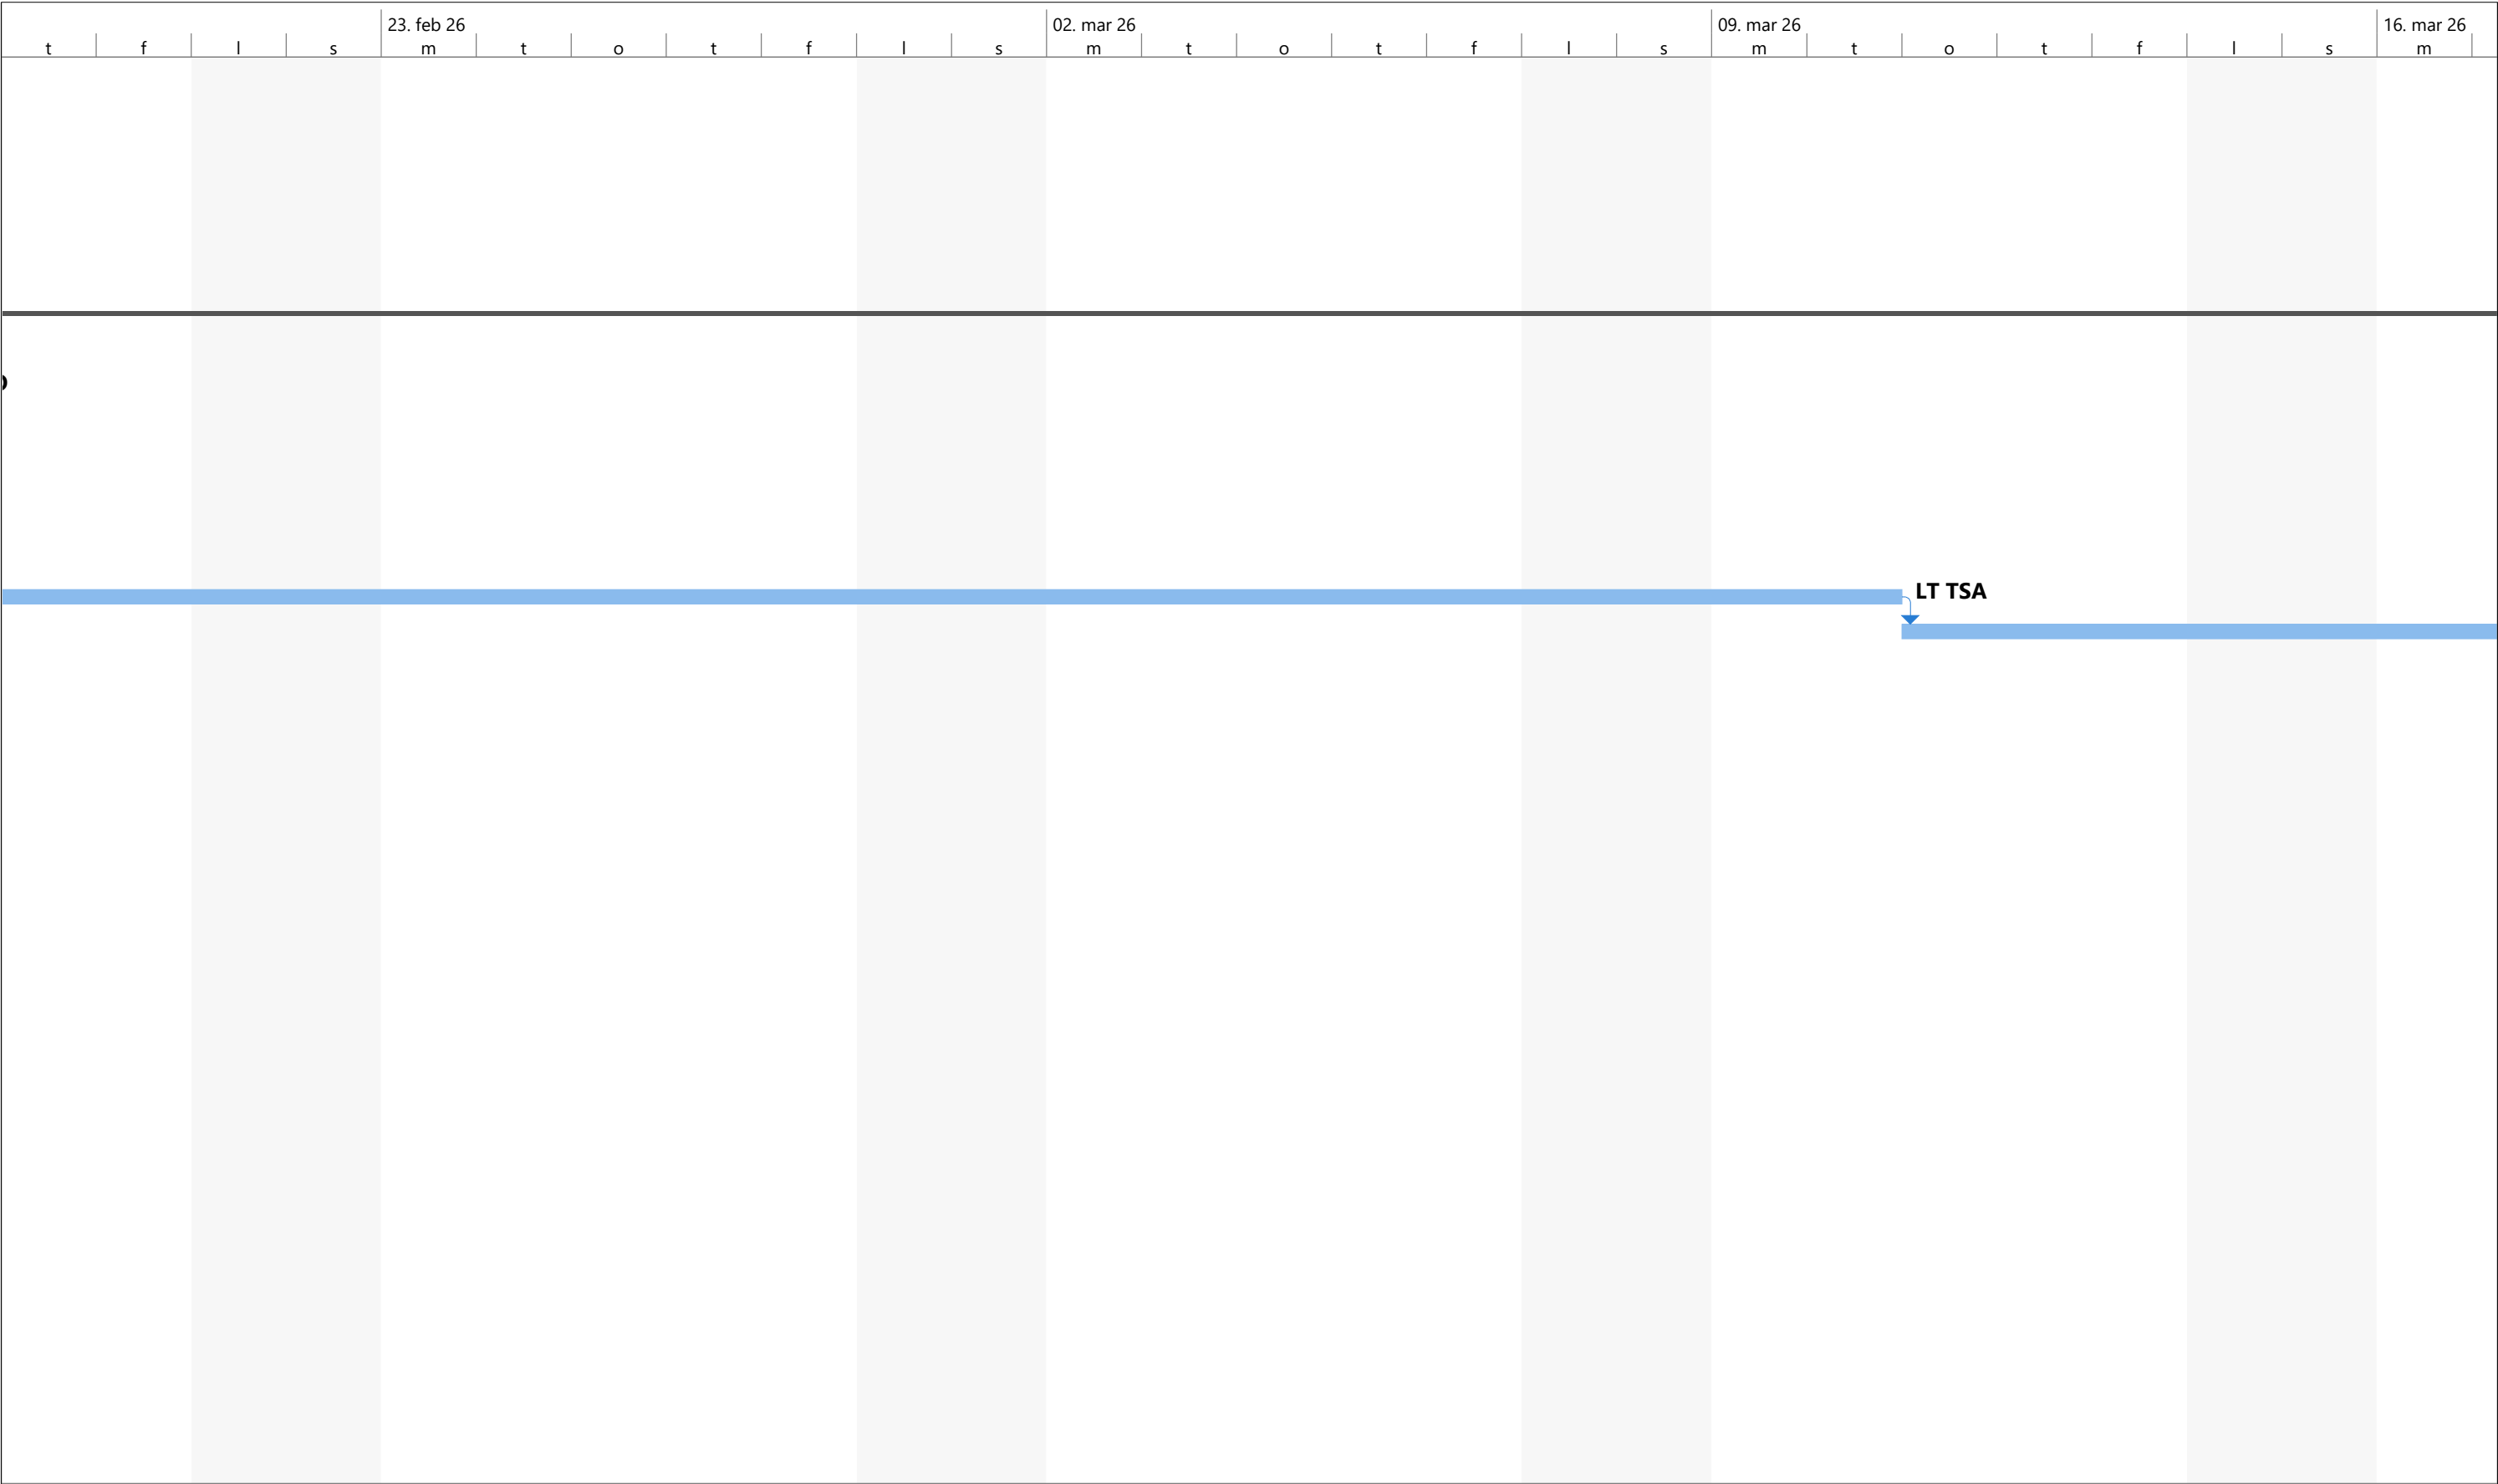











l	s	26. jan 26						l	s	02. feb 26						l	s	09. feb 26						l	s	16. feb 26			
m	t	o	t	f			m	t	o	t	f			m	t	o	t	f			m	t	o						




Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



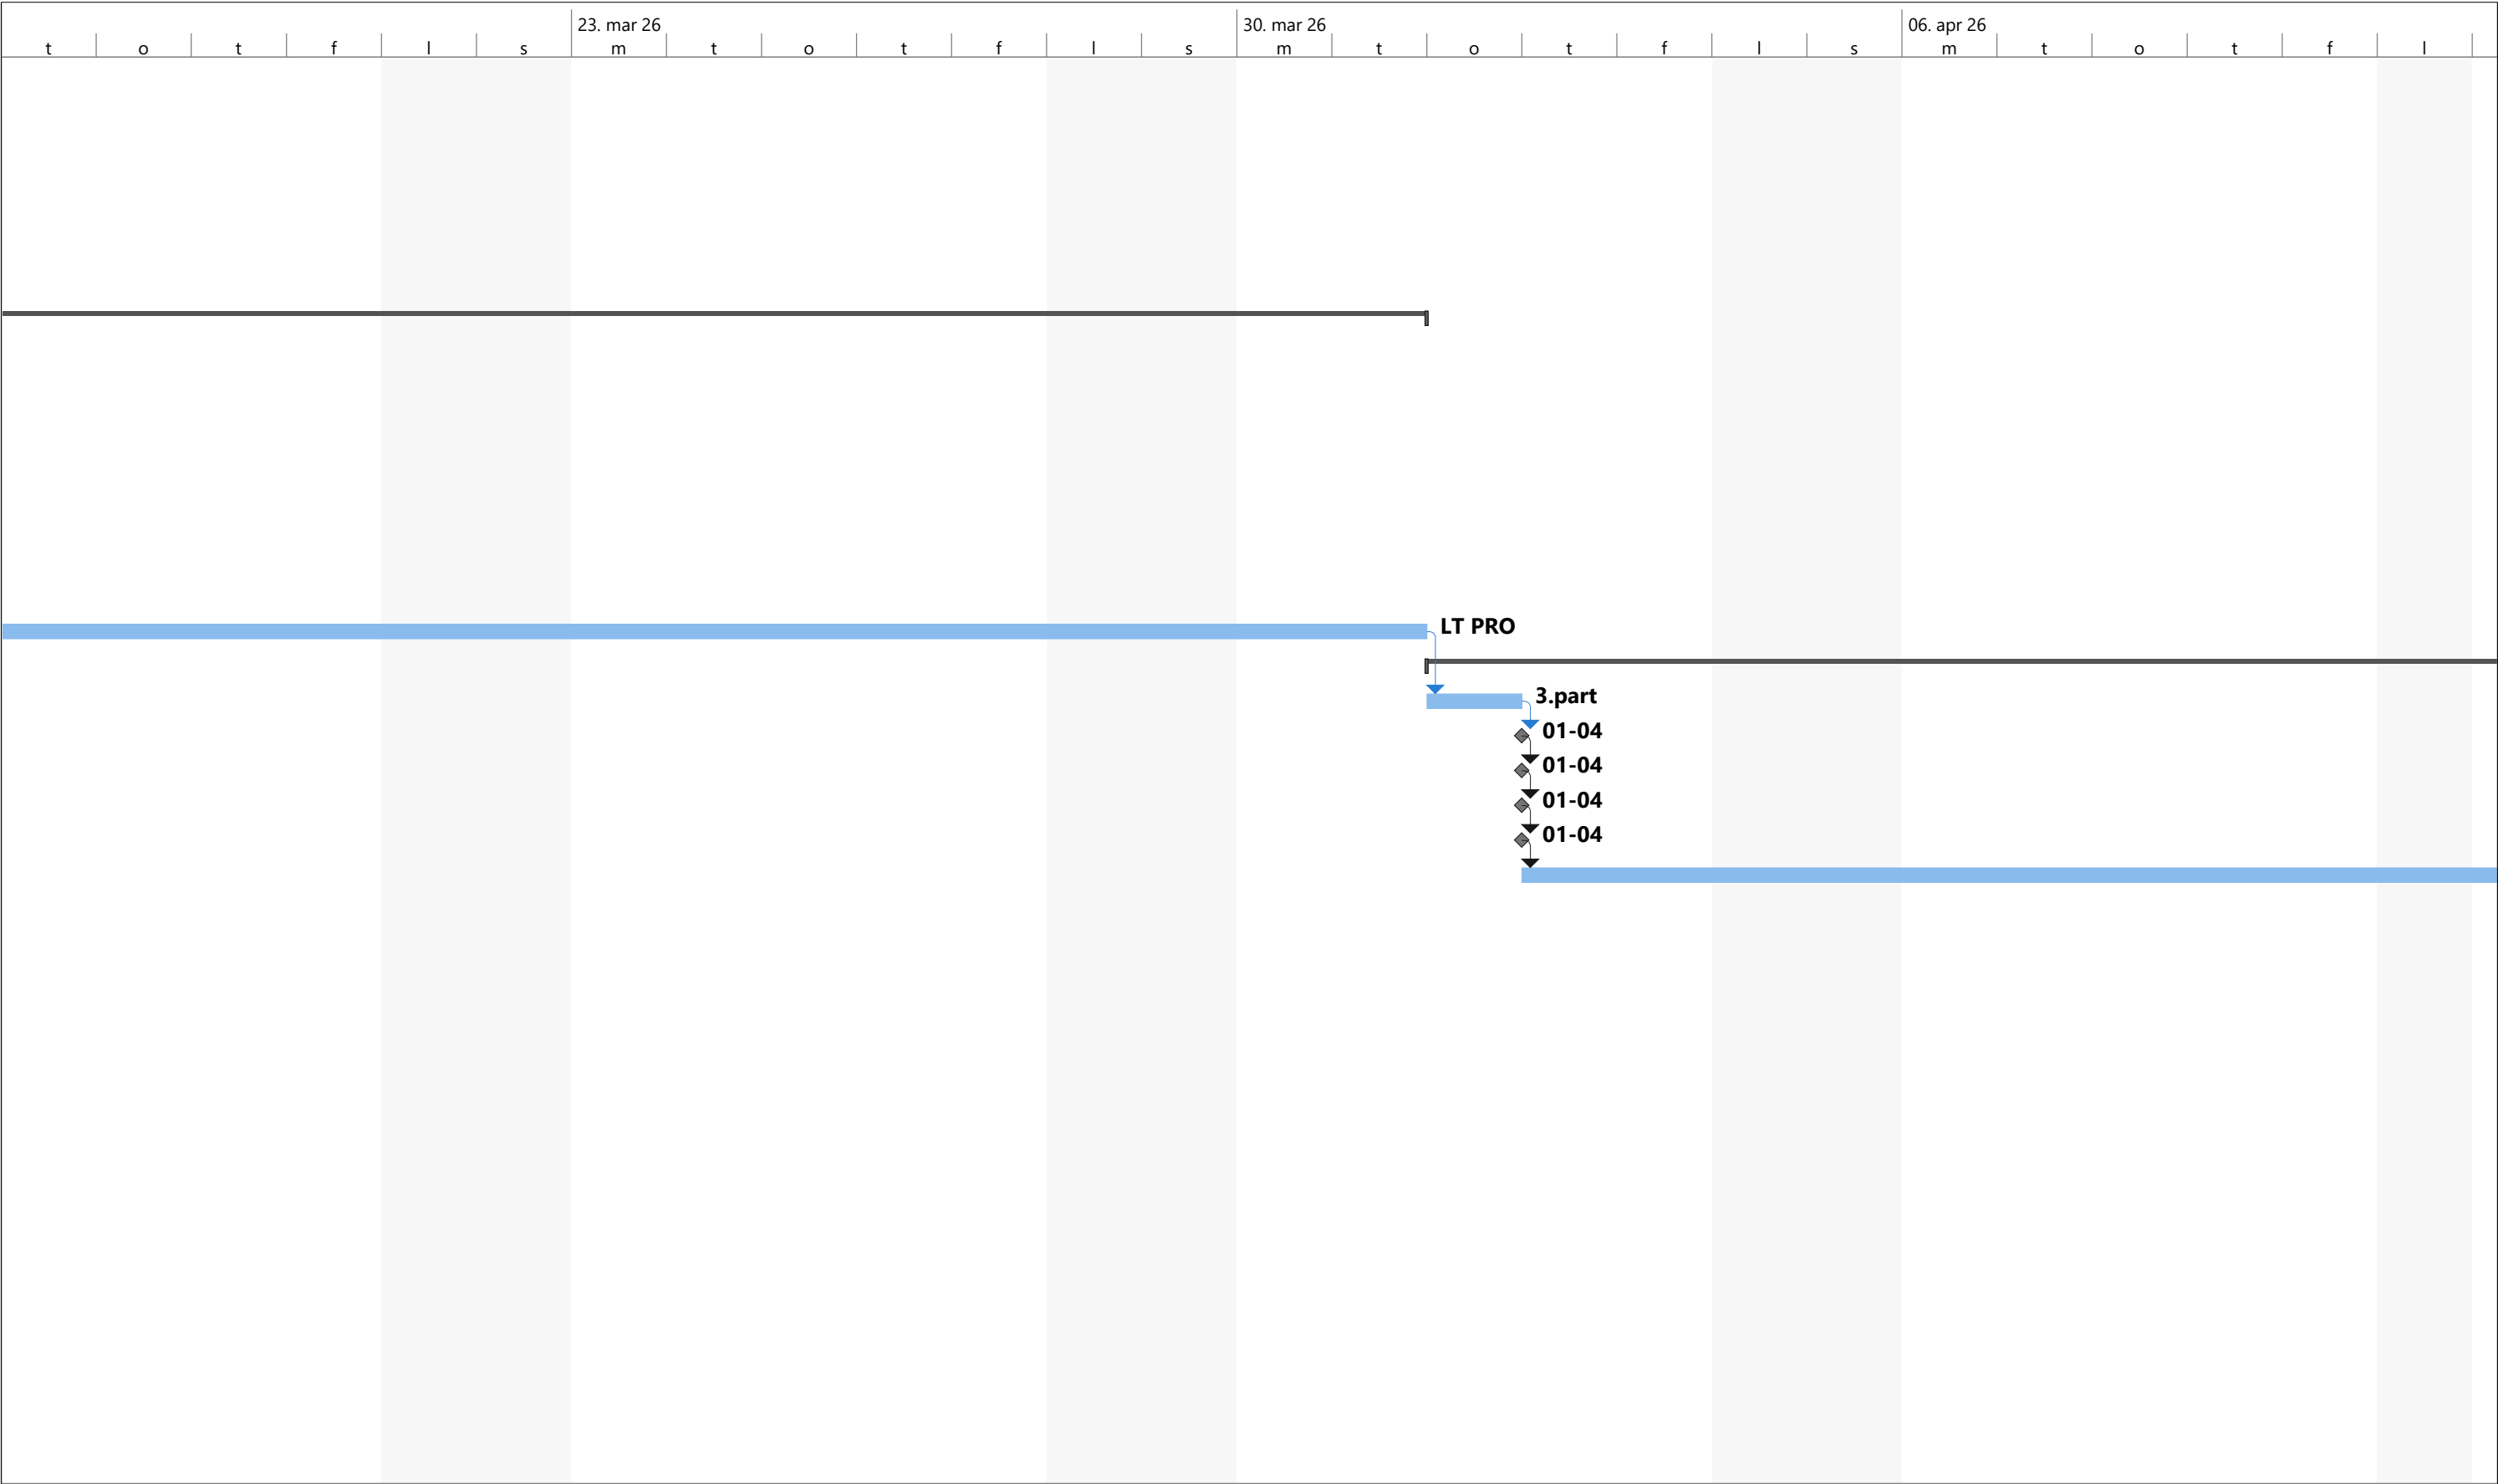

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

t	o	t	f	l	s	23. mar 26	m	t	o	t	f	l	s	30. mar 26	m	t	o	t	f	l	s	06. apr 26	m	t	o	t	f	l



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			





s	13. apr 26							20. apr 26							27. apr 26							04. maj 26								
	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	f	l	s	m	t		o	t	




Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			




f	l	s	11. maj 26	m	t	o	t	f	l	s	18. maj 26	m	t	o	t	f	l	s	25. maj 26	m	t	o	t	f	l	s	01. jun 26	m	t	





Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

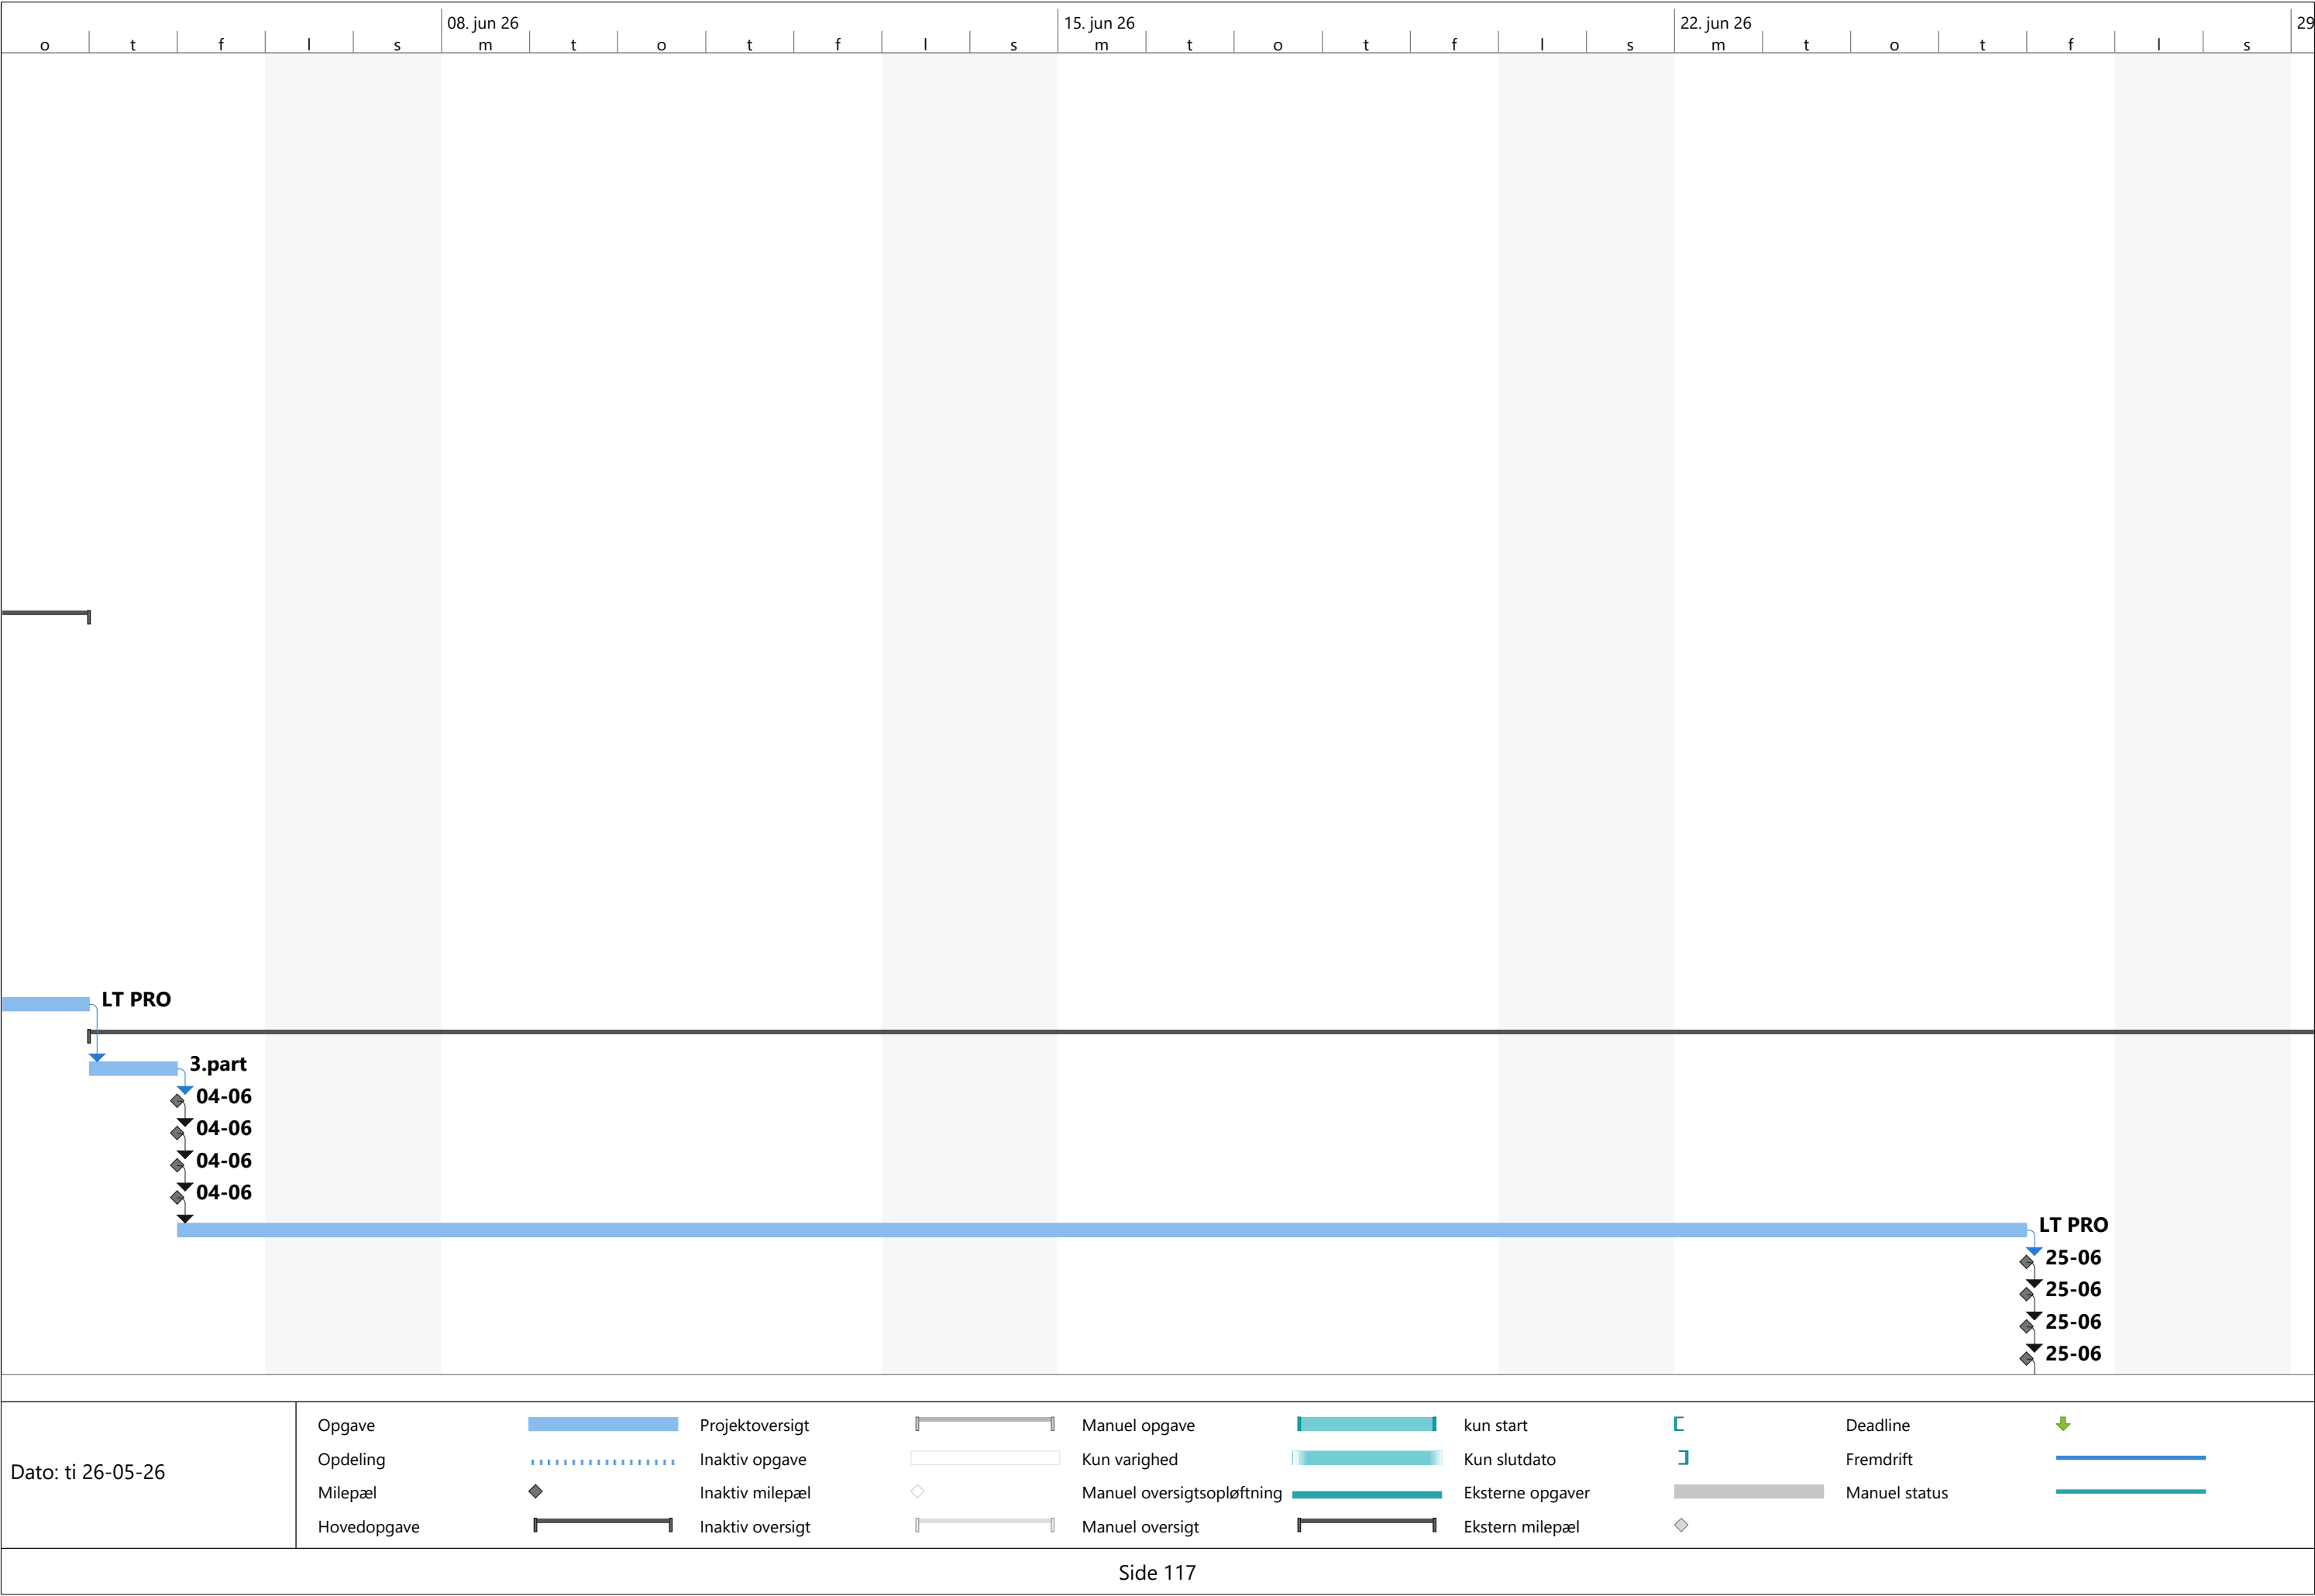

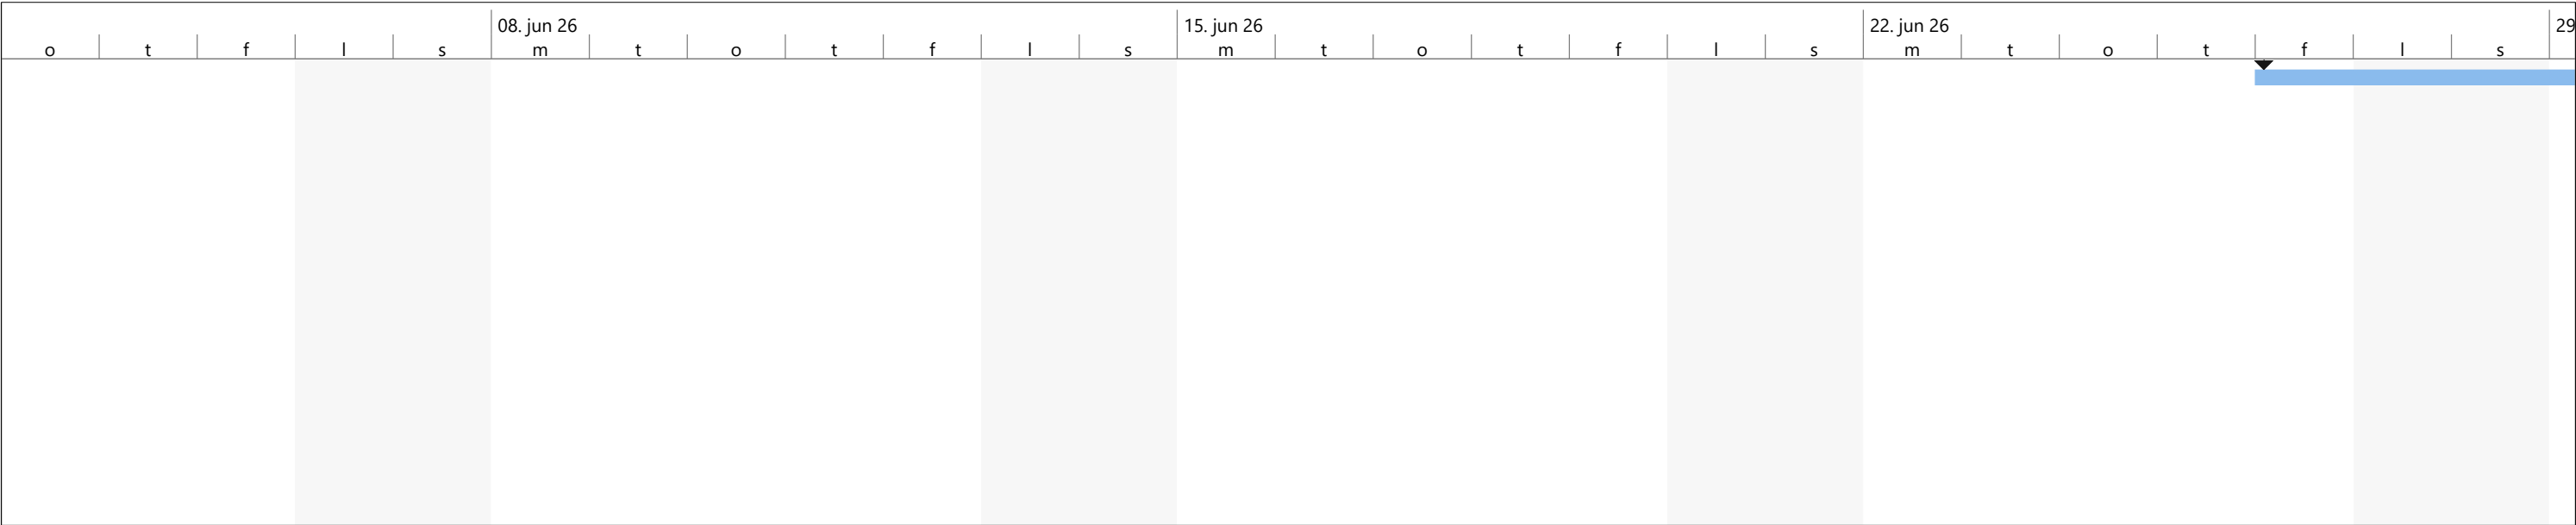

Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

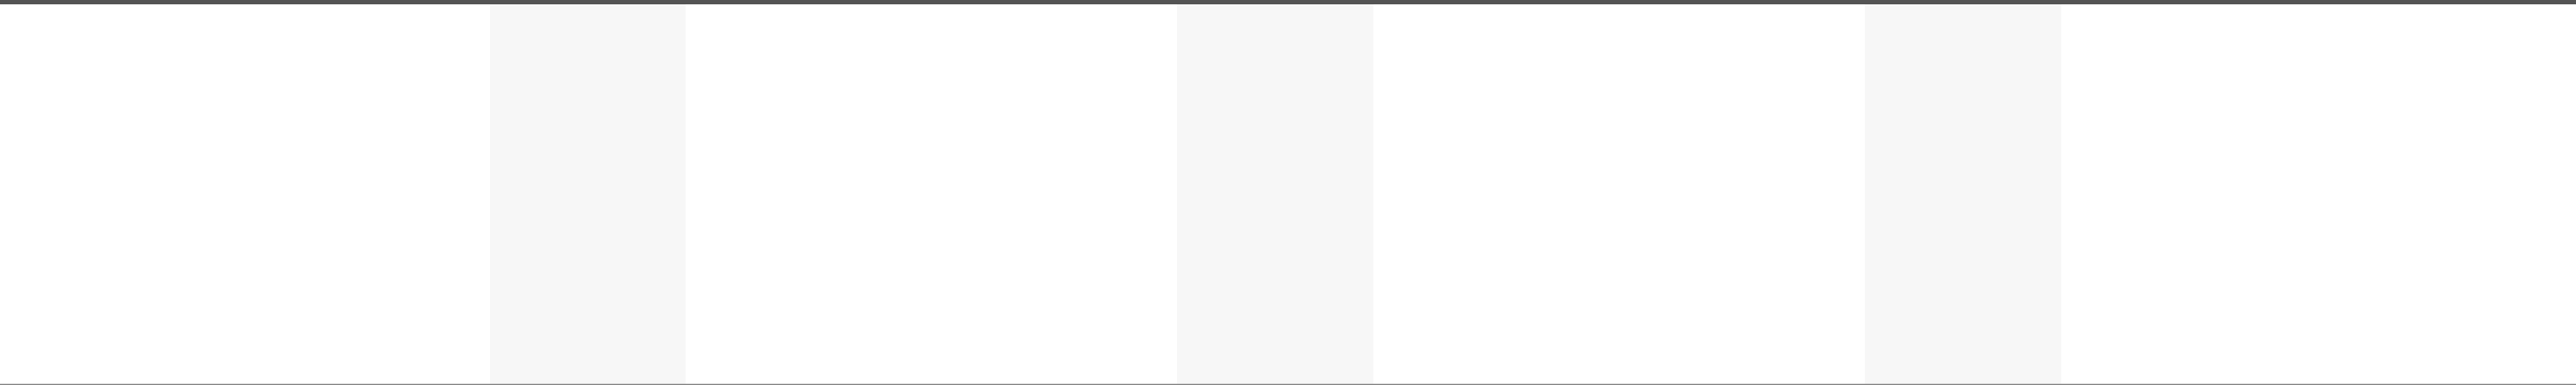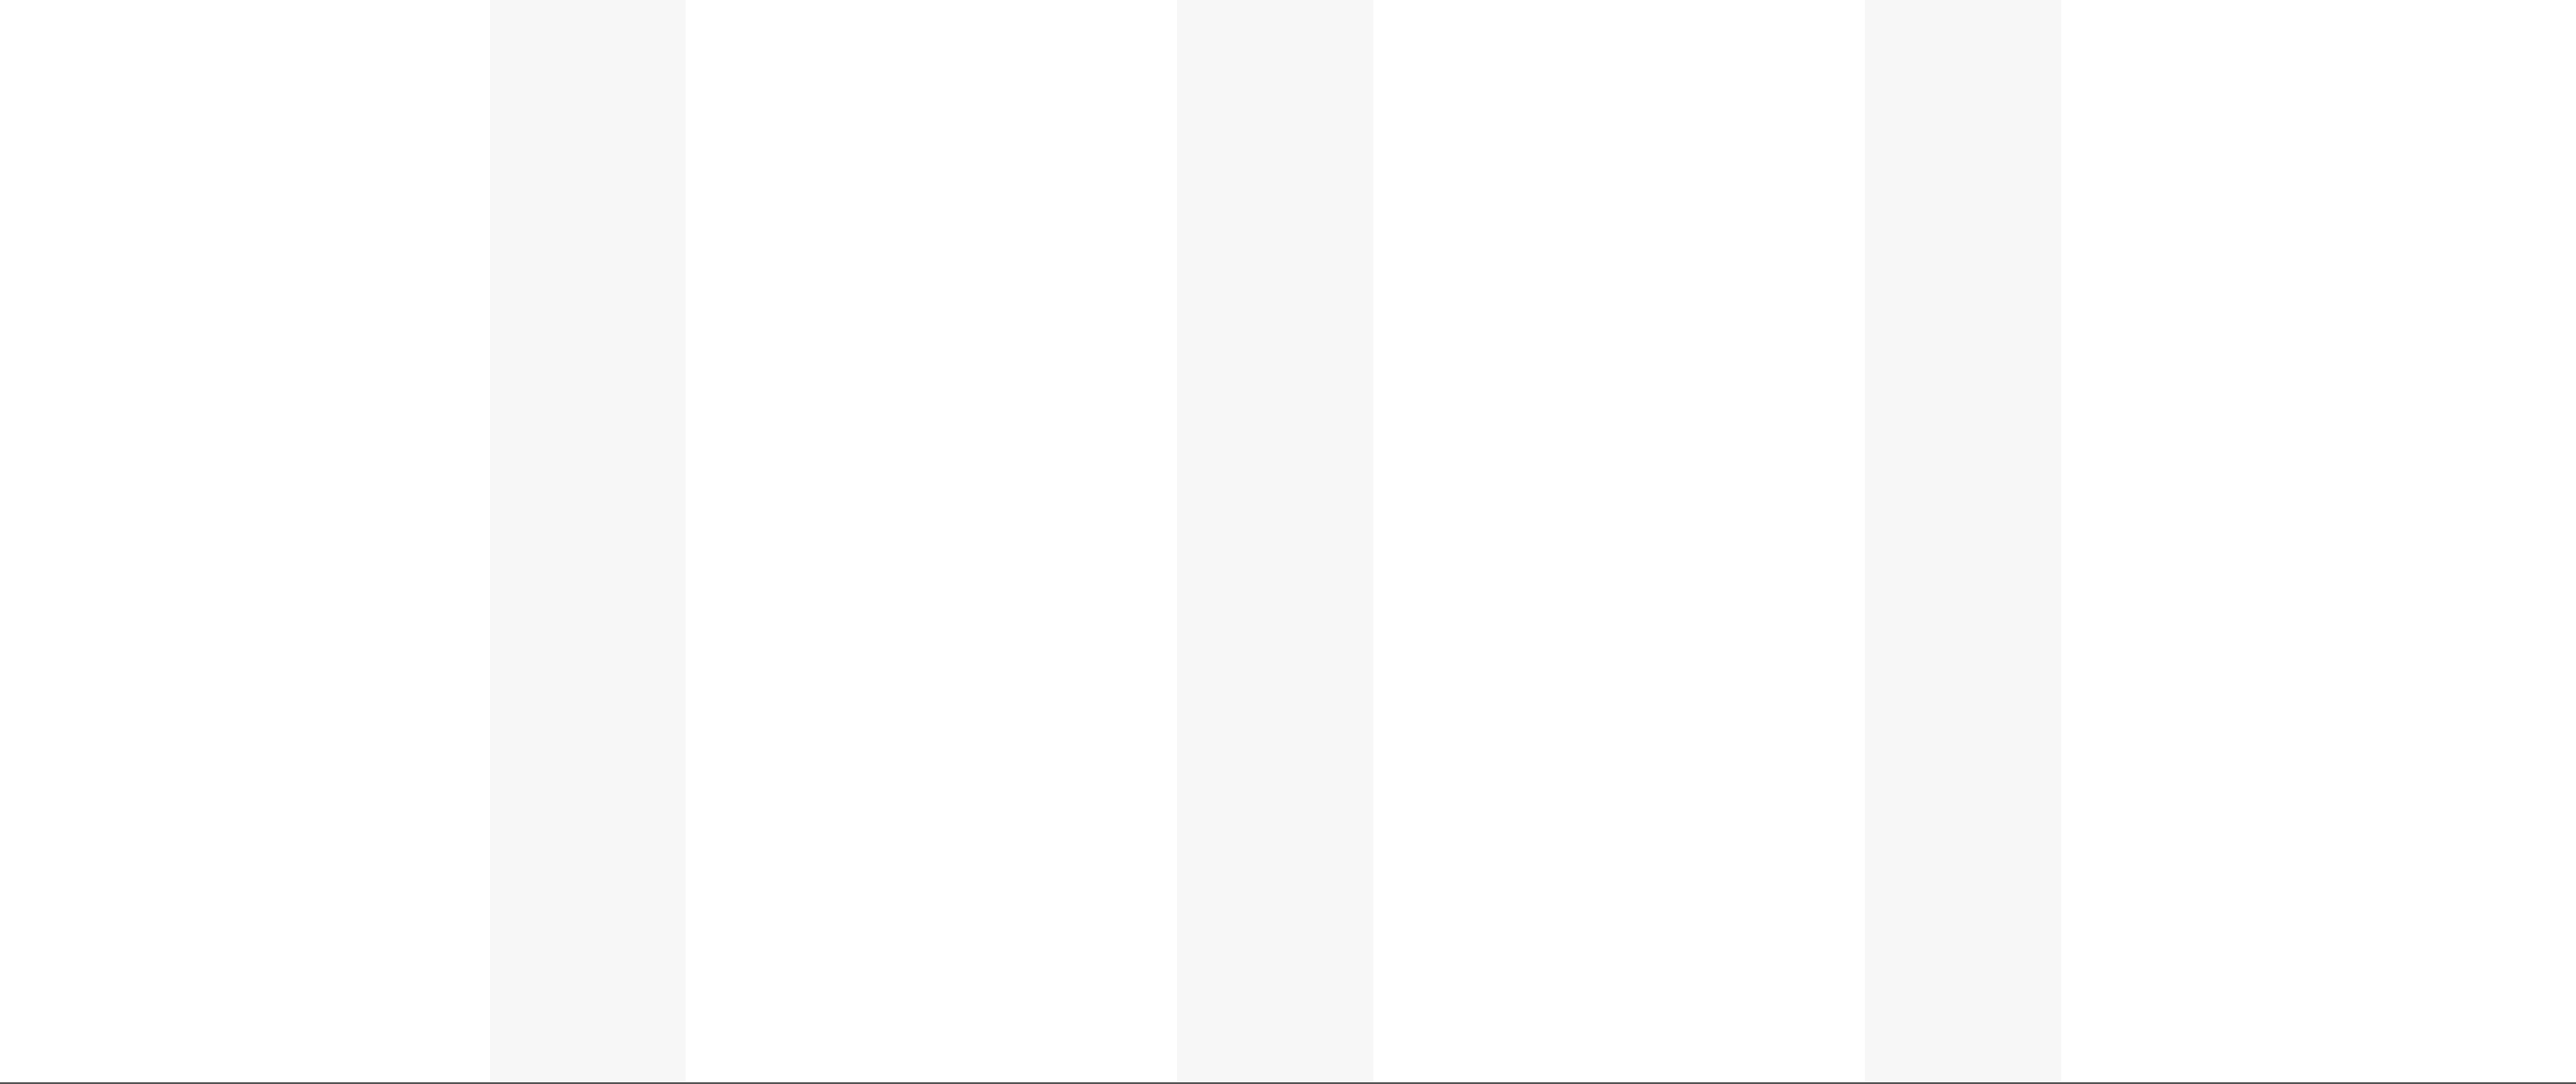


Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			








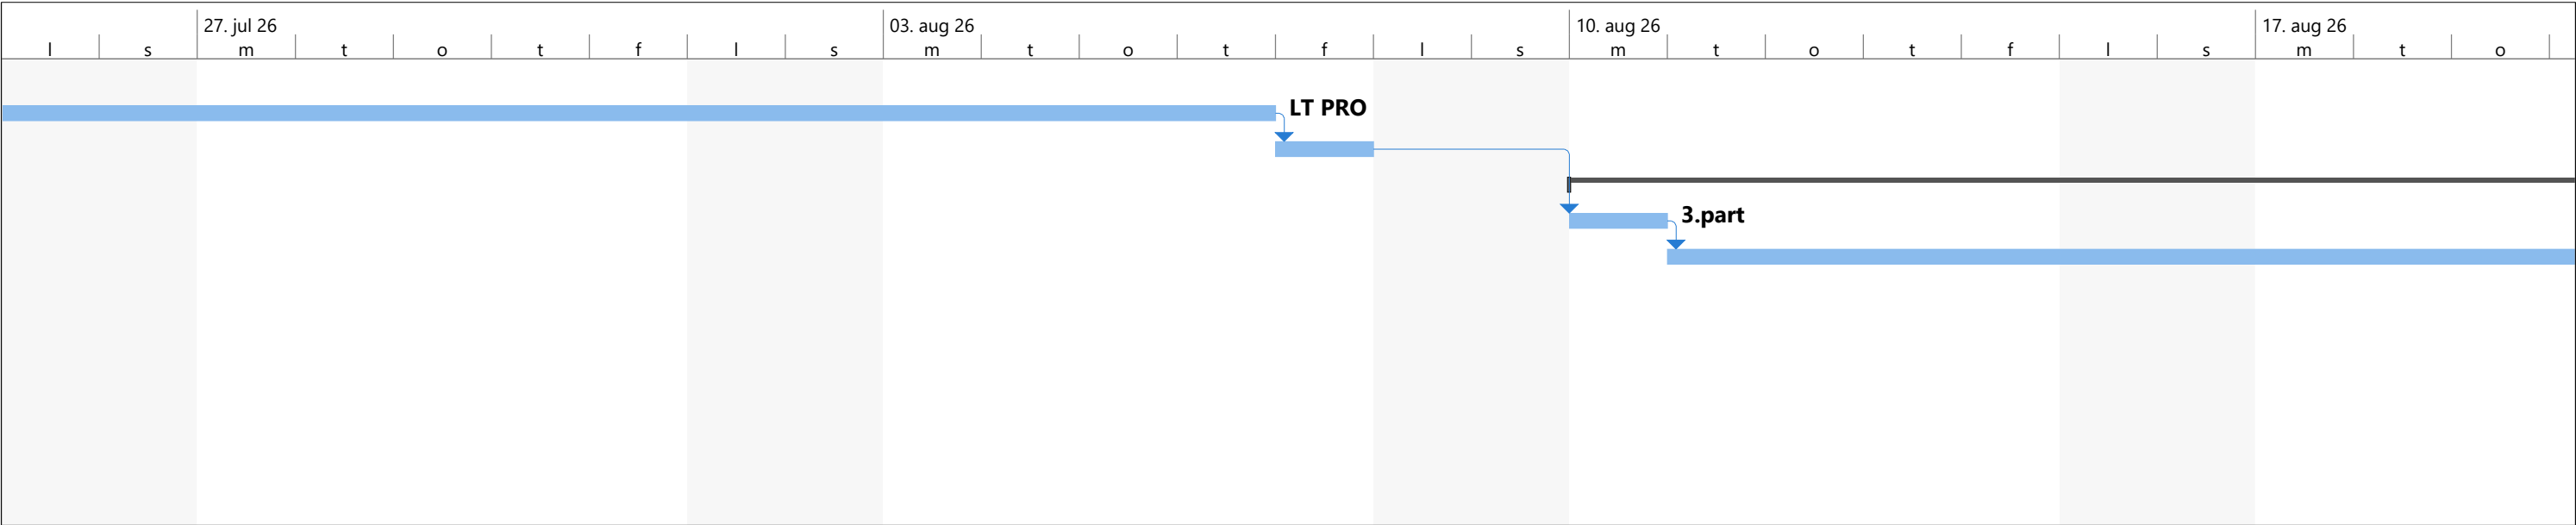




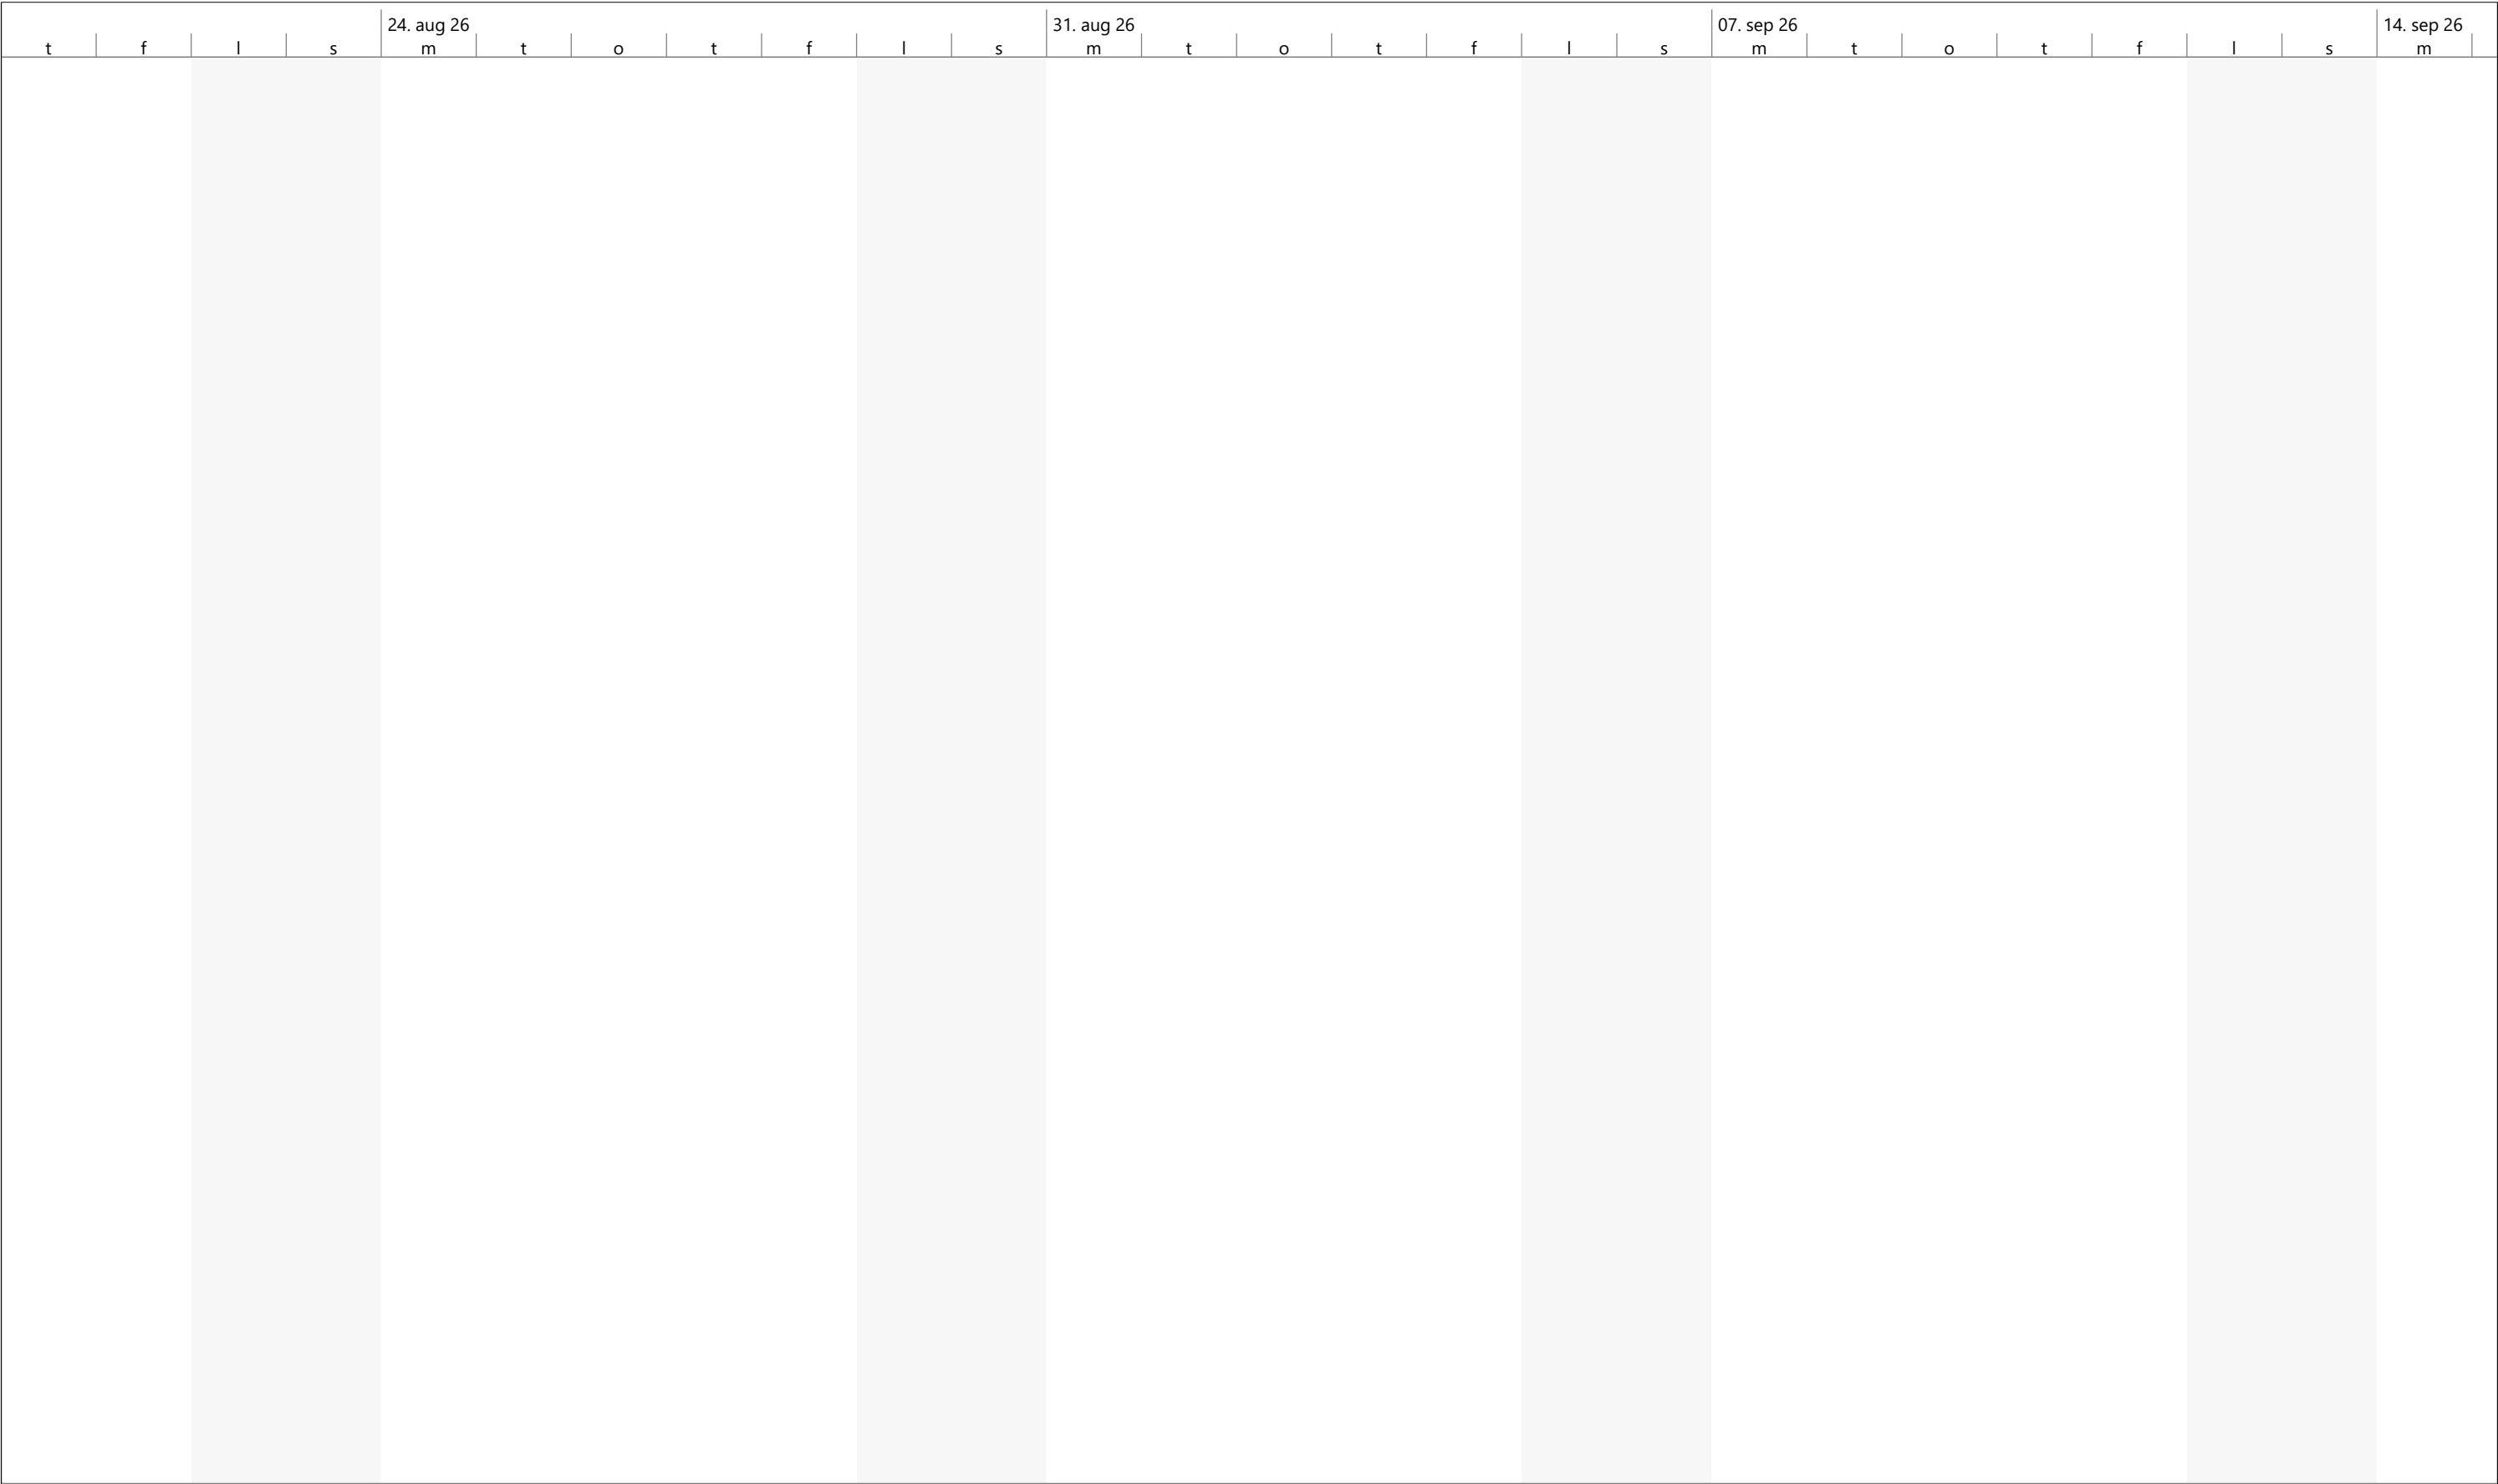















Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Dato: ti 26-05-26

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Dato: ti 26-05-26	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

t

o

t

f

l

s

21. sep 26

m

t

o

t

f

l

s

28. sep 26

m

t

o

t

f

l

s

05. okt 26

m

t

o

t

f

l

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

◆

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

◇

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

◆

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 125



s

12. okt 26

m

t

o

t

f

l

s

19. okt 26

m

t

o

t

f

l

s

26. okt 26

m

t

o

t

f

l

s

02. nov 26

m

t

o

t

Dato: ti 26-05-26

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 127

